

 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	 aecid	 cooperación española	 FCAS Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
CÓDIGO: CHL-001-B	CHILE		
PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT DE COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MARCO DE LAS METAS DE LOS ODM			

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es reducir el déficit de cobertura de agua potable y saneamiento con soluciones coste-eficientes y sostenibles.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos son:

- Asesorar técnicamente a los municipios en la generación de una cartera de proyectos de saneamiento sanitario (agua potable y alcantarillado de aguas residuales).
- Materializar obras de agua potable, alcantarillado de aguas residuales y reparación, rehabilitación o reemplazo de plantas de tratamiento de aguas residuales existentes.
- Sensibilizar y generar participación ciudadana en los proyectos a ejecutar y las obras a construir, así como informar sobre el beneficio que implicarán estos proyectos y la importancia de mantener y operar adecuadamente los sistemas.

1.3. PLAZOS

Fecha de aprobación C.M.:	30 de octubre de 2009
Fecha de firma del convenio:	13 de mayo de 2010
Fecha de inicio de ejecución:	30 de abril de 2014
Plazo de ejecución¹:	74 meses (Inicialmente 24 meses)
Fecha de finalización de ejecución:	30 de junio de 2020

1.4. SOCIOS LOCALES

Entidad beneficiaria:	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior.
Entidad ejecutora:	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior.


1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente de financiación	Importe (€)	Porcentaje (%)
Aportación FCAS	6.765.900,00 €	30%
Aportación local	16.223.495,86 €	70%
TOTAL	22.989.394,86 €	100%

¹ El 23/12/2019 se aprueba la tercera ampliación hasta 30/06/2020.

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO

Zona de actuación: Chile.

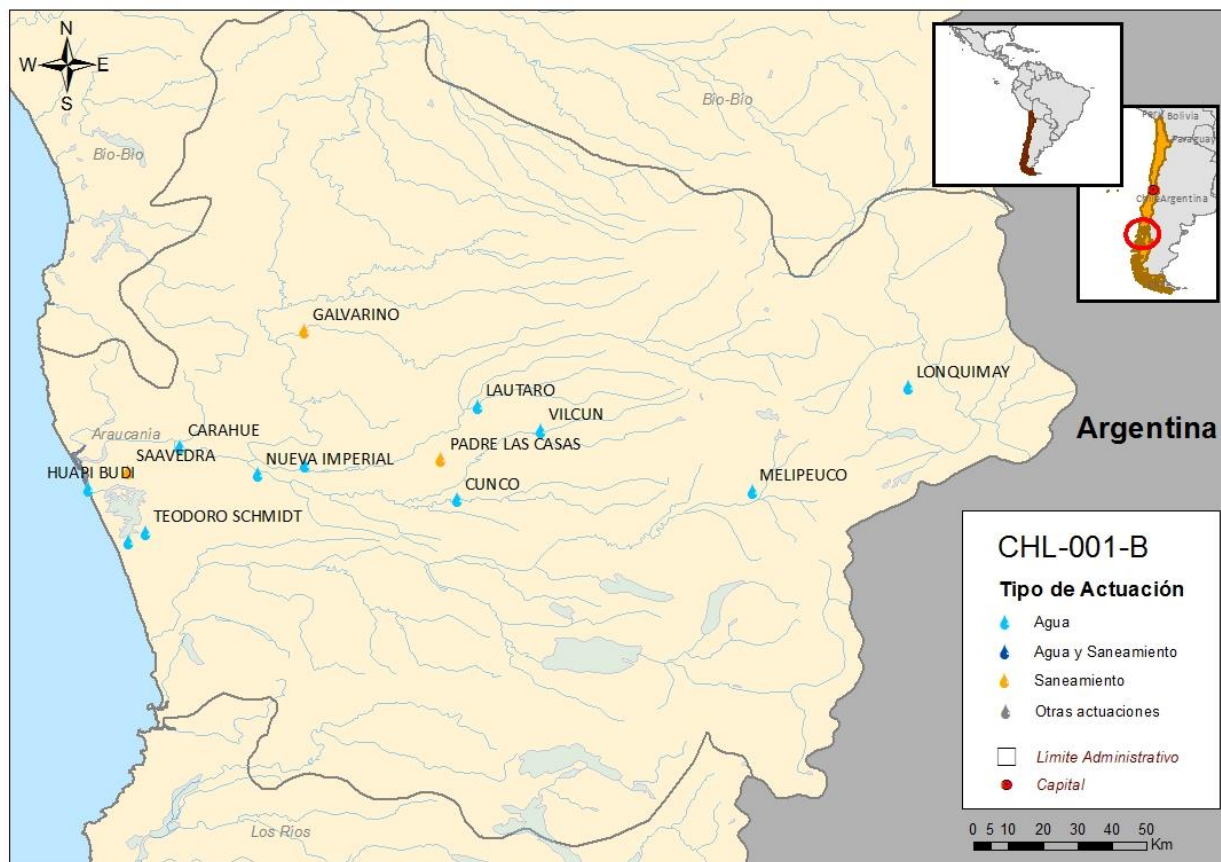

Tipo de intervención: Infraestructura de agua potable y saneamiento básico
Formación y generación de capacidades

Zona de ejecución: Periurbano y rural

No. Beneficiarios: 26.809 habitantes

2. LÍNEAS DE TRABAJO

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA

Componente I: Asesoría técnica a los municipios para la generación de la cartera de proyectos y su implementación.

Componente II: Diseño y construcción de proyectos de agua potable, saneamiento y renovación de plantas de tratamiento de aguas servidas.

Componente III: Apoyo y capacitación de comunidades.

2.2. AVANCES EN HITOS

- En abril de 2019 se aprueba una segunda ampliación de plazo de 8 meses hasta el 31 de diciembre de 2019, fundamentado en el retraso de 2 obras (incremento de beneficiarios – Agua Potable Rural Blanco Lepin y error en las coordenadas de la fuente de agua en zona fronteriza – APR El Escorial).
- En diciembre de 2019 se aprueba una tercera ampliación de plazo de 6 meses hasta el 30 de junio de 2020, fundamentado en la situación de orden público sobrevinida en octubre de 2019 y en el retraso de la obra de agua potable rural de El Escorial.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN

Componente 1 :

Se asesora técnicamente en forma permanente a los profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación de las comunas a las que corresponden los proyectos del Convenio.

Componente 2:

Los avances a 31 de diciembre son:

Casetas Sanitarias

- Saavedra: 100%,
- Galvarino: 100%.
- Padre Las Casas: 100%.
- Tomé: 100%
- Collipulli: 100%

Agua Potable Rural

- Huichahue Alto (Faja 10000), Cunco: 100%
- Blanco Lepin, Lautaro; 98%
- Quilmahue, Lonquimay: 100%
- El Escorial, Melipeuco: 92%
- Misión Boroa, Nueva Imperial: 100%
- Huapi Budi, Saavedra: 100%
- Lumahue, Allipen, Llaguepulli, Teodoro Schmidt: 100%
- Loncoche Chico, Vilcún: 100%
- Sector Alto y Bajo Loncoyamo, Carahue: 80%
- Pillumallin, Nueva Imperial: 100%
- Malalhue, Teodoro Schmidt: 100%

En cuanto a los proyectos de saneamiento, todos han finalizado su ejecución y en funcionamiento, tan sólo faltan 32 resoluciones sanitarias de un total de 479 casetas sanitarias.

El estado de avance de las resoluciones sanitarias es la siguiente:

1. Comuna Galvarino, 41 casetas: Finalizado, se cuenta con 40/41 resoluciones sanitarias sistemas alcantarillado individual.
2. Comuna Padre de las Casas, 330 casetas: Finalizado, se cuenta con 306/330 resoluciones sanitarias sistemas alcantarillado individual.
3. Comuna Saavedra, 108 casetas: Finalizado, se cuenta con 99/108 resoluciones sanitarias sistemas alcantarillado individual.

La cartera de proyectos de obras de Agua Potable Rural (APR) consta de 8 proyectos con apoyo financiero del FCAS, localizados en la Región de La Araucanía. Actualmente 6 de los 8 proyectos están prestando servicio y han obtenido las autorizaciones sanitarias del Ministerio de Salud correspondientes, los 2 restantes se encuentran en más de un 90% de ejecución. Igualmente las casetas sanitarias y alcantarillado particular en el Región de La Araucanía, en las comunas de Galvarino, Saavedra y Padre Las Casas, han obtenido la mayoría de las autorizaciones correspondientes.

Los 8 proyectos de Agua Potable Rural (APR) son:

- El Escorial, Comuna Melipeuco: 92% avance, en revaluación por traslado de la captación y nuevos beneficiarios.
- Blanco Lepin, Comuna Lautaro; 98% avance, a la espera de empalme empresa eléctrica.
- Huichahue Alto (Faja 10000), Comuna Cunco: Con Resolución de autorización de operación de

Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud.

- Quilmahue, Comuna Lonquimay: Con Resolución de autorización de operación de SEREMI.
- Misión Boroa, Comuna Nueva Imperial: Con Resolución de autorización de operación de SEREMI.
- Huapi Budi, Comuna Saavedra: Con Resolución de autorización de operación de SEREMI.
- Lumahue, Allipen, Llaguepulli, Comuna Teodoro Schmidt: Con Resolución de autorización de operación de SEREMI.
- Loncoche Chico, Comuna Vilcún: Con Resolución de autorización de operación de SEREMI.

Componente 3:

En lo que corresponde al "Plan de Educación Sanitaria y Ambiental", durante el año 2019 y de acuerdo a lo planificado se realizó un curso destinado a los operadores de los sistemas de agua potable rural, el que fue ejecutado por el Centro de Gestión del Agua de la Universidad de la Frontera y los convocados fueron los operadores previamente seleccionados por cada comité. Asistieron operadores de los 11 comités considerados en el programa con tres días de capacitación.

Bajo la misma modalidad se realizó un curso destinado a los dirigentes de los Comités para reforzar conocimientos propios de la dirigencia según los roles que cada uno desempeña en el directorio y también se les entregó contenidos técnicos respecto de la operación de los sistemas de agua potable, con el fin de que tengan los conocimientos para supervisar el desempeño de los operadores. En total en el grupo se capacitaron 34 personas, cuya participación y cumplimiento con las exigencias fue debidamente certificada por el ejecutor.

En relación al objetivo propuesto de educar a los habitantes en lo concerniente al manejo adecuado del agua. Se realizaron diferentes actividades:

- Se realizó el "Programa de capacitación de manejo y uso sustentable del agua potable rural" en las escuelas de los once sectores en donde se capacitó directamente a profesores y a estudiantes. En total se capacitaron 126 profesores y 526 estudiantes de escuelas que se encuentran en el territorio en donde funcionan los Comités de APR el que fue ejecutado por el Centro de Gestión y Tecnologías del Agua de la Universidad de la Frontera. Aquí, además, se generaron productos destinados a reforzar los conocimientos en el tema del uso sustentable del agua como son un Manual Educativo y un Software que se entregó en los colegios.
- Actividades de capacitación en higiene personal y del entorno en los territorios de dos Comités de APR, Pillumallin y Misión Boroa que pertenecen a la comuna de Nueva Imperial. En estas actividades participaron 8 escuelas rurales con 170 estudiantes, estas actividades fueron realizadas en el marco de un acuerdo de colaboración con estudiantes del área de la salud de la Universidad de la Frontera.
- Charlas respecto de los cuidados del agua en los comités. Aquí se realizó una charla en asambleas realizadas en 7 comités de APR, esto con el objetivo que los usuarios tomen conciencia de escasez de agua y puedan implementar algunas sugerencias para reducir el consumo domiciliario.
- Visitas educativas a las familias beneficiarias de casetas sanitarias, en donde se realiza reforzamiento de las capacitaciones destinadas a los cuidados y mantención del sistema de alcantarillado y a la higiene de las casetas, en las comunidades de Padre Las Casas.
- Un curso para mujeres líderes de los sectores beneficiados con proyectos de agua potable rural, en donde se entregaron contenidos de género, fortalecimiento del rol de las dirigentas y relaciones de apoyo entre mujeres líderes. Se desarrolló bajo dos modalidades una centralizada en Temuco y Saavedra y otra en comunidades, utilizando en esta última una metodología distinta centrada en un fortalecimiento de identidad étnica, con participación también de dirigentes y líderes de los territorios.

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A fecha del 31 de diciembre del 2019 el Programa tiene los avances presupuestarios siguientes:

- Fondos comprometidos del FCAS: 99,27%
- Fondos pagados del FCAS: 98,38%

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS

El programa entra en su último semestre de ejecución con el desafío de terminar las últimas dos obras del programa en el plazo fijado en la prórroga antes del fin de junio 2020. Además de terminar estas dos obras, durante este último POA SUBDERE debe:

- Organizar toda la documentación del programa para preparar la cuenta justificativa.
- Contratar la evaluación externa final y contratar la auditoría externa final.

3. ENLACES DE INTERÉS

- SUDERE: www.subdere.gov.cl
- FCAS: <http://www.aecid.es/ES/FCAS>
