

  		
CÓDIGO: COL-022-B	COLOMBIA	
MULTIVEREDAL INTEGRAL DEL PACIFICO (CENTROS POBLADOS Y CABECERAS CORREGIMENTALES DE: GUAYACANA, LLORENTE, ESPRIELLA Y TANGAREAL)		

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una solución de abastecimiento de agua y saneamiento para el centro poblado de Espriella y diseñar el sistema de acueducto para los centros poblados de la Guayacana, Llorente y Tangareal mediante captación del río Nambí que incluya la conexión a la planta de tratamiento de Agua Potable de Tumaco.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se han establecido los siguientes objetivos específicos:

- OE1: Extender el acceso sostenible al agua potable en Espriella.
- OE2: Extender el acceso sostenible a servicios de saneamiento en Espriella.
- OE3: Contribuir a reforzar el sistema institucional de la Guayacana, Llorente, Espriella y Tangareal para una adecuada gestión del sector agua que favorezca la gestión pública transparente y participativa del recurso.

1.3. PLAZOS

Fecha de aprobación C.M.	30 de octubre de 2009
Fecha de firma del convenio:	2 de diciembre de 2009
Fecha de inicio de ejecución:	1 de julio de 2018
Plazo de ejecución:	32 meses (inicialmente 18 meses)
Fecha de finalización de ejecución:	28 de febrero de 2021

1.4. SOCIOS LOCALES


Entidad beneficiaria:	La Gobernación de Nariño de la República de Colombia
Entidad ejecutora:	EMPOPASTO E.S.P.

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente de financiación	Importe (€)	Porcentaje (%)
Aportación FCAS	1.505.413,00	50%
Aportación local	1.505.413,00	50%
TOTAL	3.010.826,00	100%

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO

Zona de actuación: Centros Poblados del municipio de Tumaco, Llorente, La Guayacana, Espriella y Tangareal

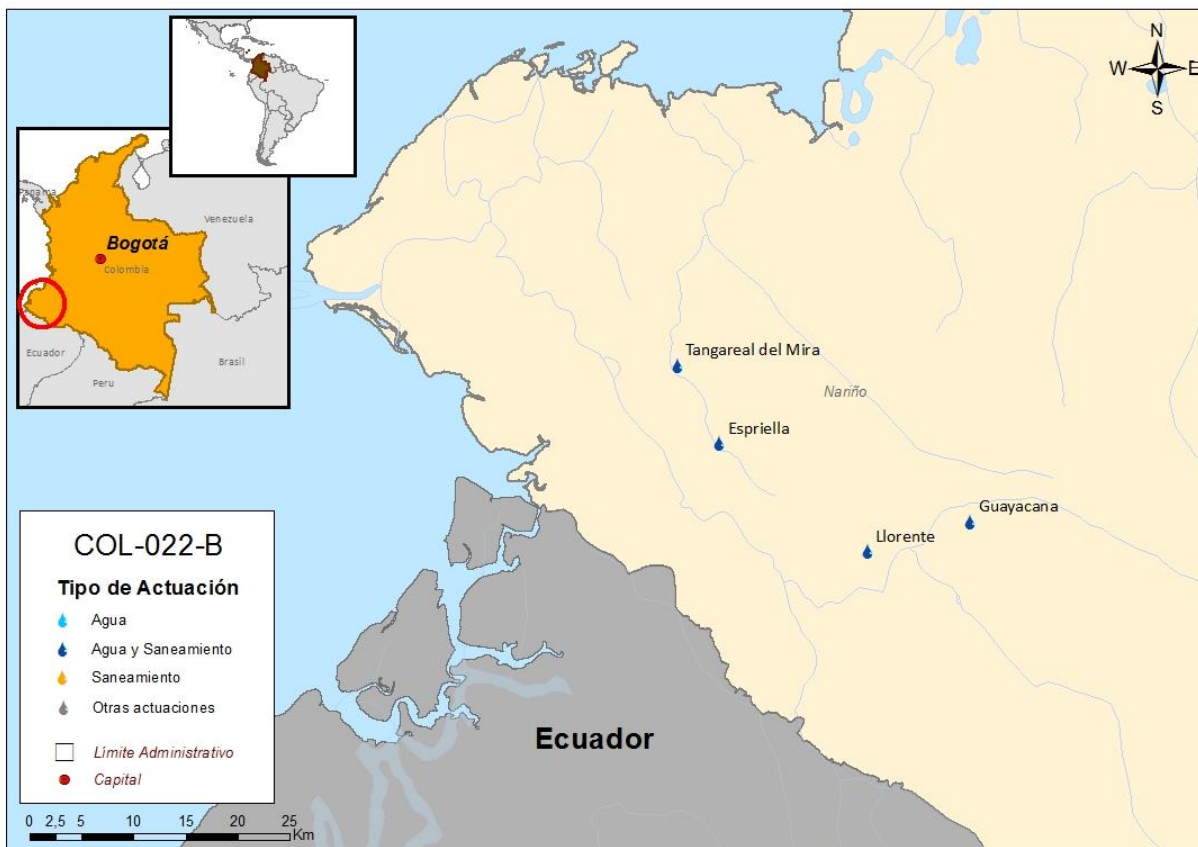

Tipo de intervención: Infraestructura de acueducto y saneamiento

Zona de ejecución: Rural

No. Beneficiarios:

De forma directa 1.644 personas para Espriella como usuarios del sistema de agua potable y saneamiento que va a diseñarse y construirse. La implementación del componente de Diseño del Acueducto Multiveredal del Pacífico elaborará el diseño del acueducto que beneficiaría aproximadamente a 134.386 habitantes de los centros poblados de: La Guayacana, Llorente, Tangareal y la cabecera municipal Tumaco, que será financiado posteriormente con recursos Nación.

2. LÍNEAS DE TRABAJO

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA

Este proyecto está conformado por dos componentes importantes: el primero relacionado con el sistema de abastecimiento de agua potable y, el segundo, con el Fortalecimiento Institucional que garantice la sostenibilidad del sistema.

Componente I: Componente de Abastecimiento de Agua potable

Se busca diseñar e implementar la alternativa viable, desde el punto de vista técnico, económico, financiero, ambiental y jurídico, para suministrar el servicio de agua potable con estándares de calidad, cantidad y continuidad al centro poblado de Espriella. Se incluye en este punto, el diseño del sistema de acueducto de los centros poblados de La Guayacana, Llorente y Tangareal que emplee como fuente de suministro el río Nambi y que conecte con la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Tumaco.

Componente II: Componente de Saneamiento

Se busca diseñar e implementar la alternativa viable, desde el punto de vista técnico, económico, financiero, ambiental y jurídico, para suministrar el servicio de saneamiento a Espriella.

Componente III: Componente de fortalecimiento institucional

Se busca garantizar la sostenibilidad, funcionalidad y prestación del servicio con calidad, continuidad y oportunidad a toda la comunidad beneficiaria. Incluye por lo tanto la participación comunitaria desde la formulación del proyecto, la identificación de la mejor solución, el acompañamiento en la construcción y el compromiso en la operatividad y sostenibilidad del sistema construido. Logrando de esta manera el empoderamiento de la comunidad, la formación de liderazgo y la adquisición de conocimiento técnico, económico, financiero y social.

2.2. AVANCES EN HITOS

- El programa ha tenido una prórroga por 14 meses a los 18 meses otorgados inicialmente, y su fecha de finalización es el 28 de febrero de 2021.
- Actualmente nos encontramos ejecutando el POA 2019, que precisará ampliaciones hasta obtener los permisos ambientales.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN

- La Componente Social y de Fortalecimiento Institucional iniciaron actividades a finales de 2018.
- Durante el año 2019 se realizaron los contratos de: diseños de acueducto y saneamiento en Espriella, diseño del acueducto multiveredal, interventoría a la consultoría de diseños de Espriella y al diseño multiveredal, Auditoria anual y comunicaciones y visibilidad.
- Se cuenta con los diseños de acueducto y saneamiento de Espriella. La contratación de la obra de construcción en Espriella precisa de unos permisos ambientales y sanitarios que se encuentran en trámite en Corponariño y el Instituto Departamental de Salud.

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A fecha del 31 de diciembre de 2019 el Programa tiene los avances presupuestarios siguientes:

- Fondos comprometidos en licitaciones por 597.415 € que suponen un 19,84% del total
- Fondos pagados totales ascienden a 307.998,14 € que suponen un 10,23 % del total de fondos disponible.

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS

En el primer semestre de 2020 se prevé:

- Comenzar el proceso de licitación de las obras.
- Cerrar las fases de caracterización de la población para comenzar con el de fortalecimiento institucional.

3.FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD



Fotografía 1: Tubería de petróleo bajo las casas



Fotografía 2: Contaminación de fuentes superficiales



Fotografía 3: Reuniones informativa



Fotografía 4: Conformación del Comité Veedor

4. ENLACES DE INTERÉS

- Gobierno de Nariño: <http://www.narino.gov.co/>
- Alcaldía de Tumaco: <http://www.tumaco-narino.gov.co/>
- FCAS: <http://www.aecid.es/ES/FCAS>
