Memoria 2025

FCAS Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento



aecid cooperación española



©AECID, 2026

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Av. Reyes Católicos, 4
28040 Madrid, España
Teléfono: +34 915 838 100

Catálogo general de publicaciones oficiales: https://cpage.mpr.gob.es/

NIPO en línea: 109-26-035-8

www.aecid.es

Dirección y coordinación: Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. AECID.
dfcas@aecid.es

Diseño y maquetación: Tragsatec.

Índice

1. El Fondo del Agua en 2025 5
   De un vistazo 6

2. Situación FCAS 10
   Datos Globales 11
   Tipos de programas 13
   Resultados de los programas 15
   Impacto en políticas públicas 16
   Ejecución financiera en 2025 20
   Situación actual de los programas 22

3. El Gran Fondo 23
   Un modelo de cooperación que multiplica resultados 24
   Instrumentos y modalidades de cooperación 26

4. Alianzas: Cooperación horizontal y multiactor 30
   Un modelo basado en alianzas 31

5. Operaciones 39
   Bolivia 41
   Colombia 47
   Cuba 53
   Ecuador 56
   El Salvador 60
   Guatemala 65
   Haití 69
   Honduras 72
   México 78
   Nicaragua 80
   Panamá 82
   Paraguay 86
   República Dominicana 89
   Regional 92
   Cooperaciones técnicas 94

6. Cómo trabajamos 100
Enfoque de derechos humanos al agua y al saneamiento 101
Enfoque feminista y de género 103
Enfoque de diversidad cultural 104
Gobernanza y fortalecimiento institucional 107
Gestión integrada de los recursos hídricos, medio ambiente y cambio climático 111
Gestión del conocimiento 114
Comunicación 115
Órganos de gestión 117



1.
El Fondo del Agua en 2025





De un vistazo

Durante el año 2025, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) continuó avanzando en su compromiso con la realización progresiva de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, promoviendo una gestión del agua equitativa, sostenible y respetuosa con el medioambiente y con las personas.

Fue un año de intensa actividad con la **aprobación de nueve programas nuevos por valor de 16 M€** orientados a mejorar el acceso a los servicios de agua y saneamiento de las poblaciones más vulnerables, fortalecer el marco institucional y avanzar en el desarrollo de políticas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Estas iniciativas se realizarán en El Salvador, Guatemala, Republica Dominicana, Colombia, Honduras y Paraguay.

También **comenzaron a ejecutarse tres programas aprobados a finales del año 2024**:

- La ampliación del *Programa de agua potable y saneamiento para comunidades rurales dispersas del cantón de Portoviejo, en la provincia de Manabí*, motivada por los buenos resultados obtenidos con el programa inicial. Donación del FCAS: 1 M€.

- El *Programa de fortalecimiento de la gestión de servicios de agua y saneamiento en los municipios del lago Peten Itzá*, que forma parte de una gran operación del Team Europe para el Fomento de la transición ecológica en la región de Petén. Donación del FCAS: 1,6 M€.

- La fase II del *Programa RUK'U'X YA'*, que supone la consolidación del modelo de gobernanza y sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en la cuenca del Lago de Atitlán, centrado en la reducción de enfermedades diarreicas y la mejora de servicios de agua y saneamiento en los centros de salud de la zona de Sololá. Donación del FCAS: 2,03 M€.

Por otro lado, a principios de año se presentó la Plataforma española de cooperación en agua, saneamiento e higiene (Pecash), una red abierta y participativa, cuyo objetivo es conectar a los diferentes actores del sector y fomentar el intercambio y el aprendizaje de experiencias.

El año 2025 estuvo marcado además por importantes cambios organizativos en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Si bien la aprobación del nuevo Estatuto de la AECID mediante el Real Decreto 1246/2024, de 10 de diciembre tuvo lugar a finales de 2024, su aplicación efectiva y los cambios operativos derivados del mismo comenzaron a materializarse durante 2025.

En este contexto, el FCAS pasó a depender de la Dirección de Cooperación Sectorial, Europea y Multilateral, a través de la Subdirección de Transición Ecológica, Agua y Lucha contra el Hambre y de la Oficina del FCAS, unidad a la que corresponde la gestión, ejecución y administración del Fondo.

Esta nueva estructura refuerza el carácter estratégico del agua y el saneamiento dentro de las políticas de cooperación para el desarrollo sostenible de la AECID, fortaleciendo la integración de los enfoques sectoriales, la generación de conocimiento técnico y el impulso de programas orientados a la consecución de resultados y al cumplimiento de la Agenda 2030.


Asimismo, este cambio organizativo supone también una apertura territorial del ámbito de actuación del Fondo. Tradicionalmente centrado en América Latina y el Caribe, el nuevo marco institucional propone ampliar progresivamente el alcance geográfico de la cooperación en agua y saneamiento hacia otras regiones prioritarias para la Cooperación Española, especialmente África y Asia, reforzando así la capacidad de respuesta de la AECID ante los desafíos globales relacionados con el acceso al agua, el saneamiento y la resiliencia climática.

A lo largo del año, el FCAS continuó consolidando su cartera de operaciones y acompañando la ejecución de los programas en marcha, orientados a mejorar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, especialmente en comunidades rurales y poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se continuó impulsando el diseño y preparación de nuevas intervenciones, así como procesos de formulación y cooperaciones técnicas en los países socios. En paralelo, el Fondo mantuvo su trabajo en torno a sus principales líneas estratégicas: la igualdad de género y la equidad cultural, el fortalecimiento institucional y de la gobernanza del agua, la gestión integrada de los recursos hídricos y la sostenibilidad de los servicios.

Todo ello se desarrolló en un contexto marcado por los crecientes desafíos derivados del cambio climático, que afectan de manera especial a las poblaciones más vulnerables y refuerzan la necesidad de avanzar hacia modelos de gestión del agua más resilientes, inclusivos y sostenibles. De este modo, el FCAS reafirma su compromiso con el ODS 6 y con una cooperación basada en los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia climática.



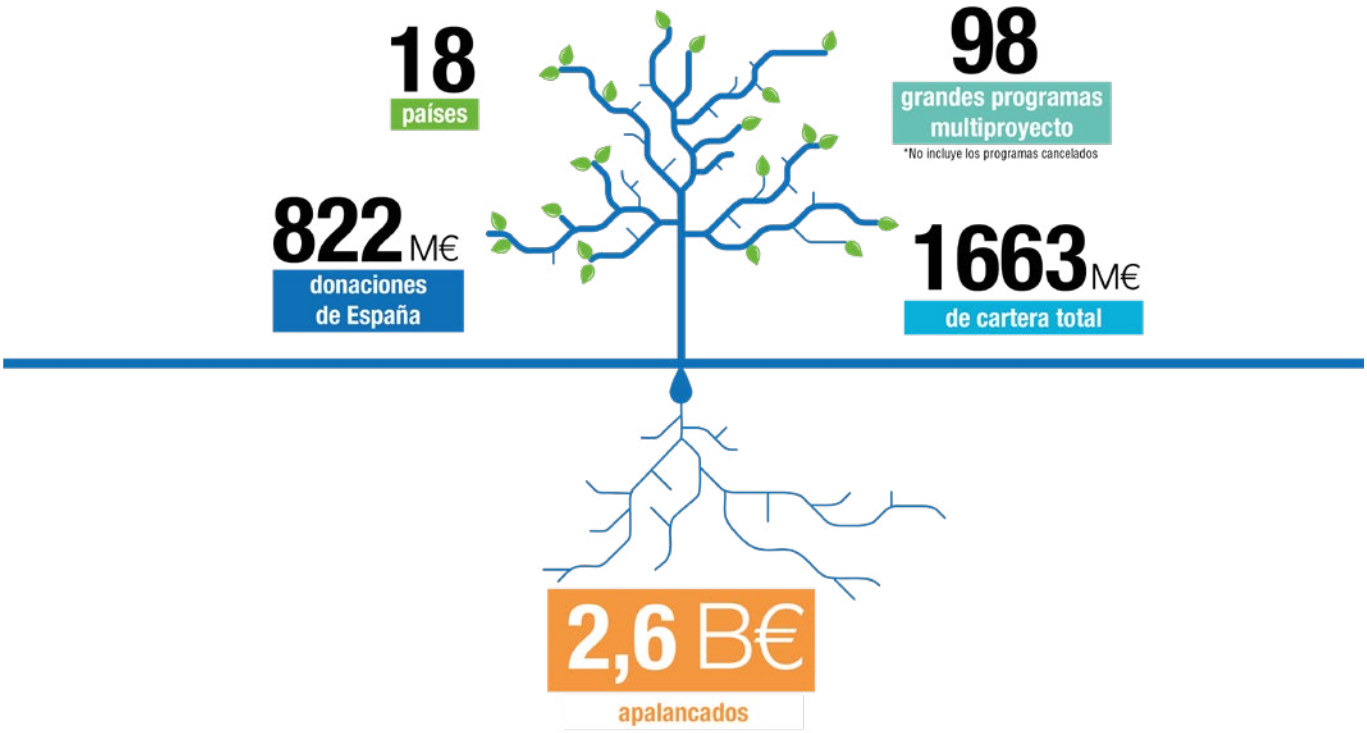

Desde la creación del Fondo del Agua en 2008, las donaciones aportadas hasta 2025 por el FCAS ascienden a los 822,40 M€. Estas aportaciones han servido para movilizar 411,61 M€ de aportación local y 429,47 M€ de otras aportaciones, logrando una inversión total de 1.663,48 M€.

El Fondo del Agua en **2025**

enero



Nuevos programas para impulsar el agua y el saneamiento en zonas rurales de Guatemala y Ecuador.

febrero



Exteriores presenta la *Plataforma española de Cooperación en Agua, Saneamiento e Higiene*.

marzo



Día Mundial del Agua. Entrevista con el Relator especial de la NU, Pedro Arrojo

abril



Programa *Conexión Agua* para un futuro hídrico sostenible en Colombia

mayo



Bombeo solar y nuevo depósito de agua para 3000 personas en Jacmel, Haiti.

junio



Diálogos sobre *hermanamientos* entre operadores de agua.

julio

Intercambio de buenas prácticas entre programas en Ecuador



agosto

Memoria anual: el trabajo de FCAS alcanza ya a 4,6 millones de personas.



septiembre

República Dominicana presenta su Plan Hidrológico Nacional elaborado con el apoyo de la AECID.



octubre

La CODIA acoge la presentación de la Guía Técnica de Planificación Hidrológica.



noviembre

La cooperación española destaca en la COP 30 el vínculo entre agua y cambio climático.



diciembre

Pecash avanza en la puesta en marcha de cuatro grupos de trabajos temáticos.



2.
Situación FCAS



Datos globales

Desde su creación en el año 2008 hasta diciembre de 2025, el FCAS ha consolidado una cartera de cooperación orientada a garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento, especialmente en las poblaciones y territorios con mayores niveles de vulnerabilidad. A lo largo de este periodo, el FCAS ha movilizado más de 822,40M € en donaciones, logrando además atraer importantes aportaciones locales y recursos complementarios que han permitido multiplicar el alcance y sostenibilidad de las intervenciones.

La cartera global del Fondo continúa centrándose prioritariamente en zonas rurales y periurbanas, con especial atención a comunidades en situación de pobreza, exclusión o alta fragilidad climática y social. Junto a las inversiones en infraestructura y acceso a servicios, el FCAS mantiene su apuesta por el fortalecimiento institucional, el apoyo a políticas públicas y el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión, contribuyendo así a la sostenibilidad de los programas y al fortalecimiento del sector del agua y el saneamiento en los países socios.

En términos acumulados, Haití continúa siendo el país con mayor volumen de donaciones recibidas, seguido de Bolivia. Guatemala se consolida entre los principales países socios del Fondo, reflejo del impulso dado en los últimos años a las intervenciones orientadas a mejorar el acceso a agua y saneamiento en áreas rurales y comunidades indígenas. Les siguen El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Perú, Honduras y Colombia, concentrando una parte significativa de la cartera del FCAS.

A estas contribuciones se suman los fondos movilizados a través de la cooperación delegada de la Unión Europea. Los programas impulsados por el FCAS han permitido canalizar más de 165 M€ de financiación europea y promover operaciones combinadas (integrando donaciones, préstamos y cooperaciones técnicas) por un volumen superior a 1.000 M€. En este marco, el Fondo continúa desempeñando un papel articulador entre instituciones financieras internacionales, administraciones públicas, entidades prestadoras de servicios y organismos de cooperación, favoreciendo la movilización de recursos y el alineamiento de actores en torno a la Agenda del Agua.

En línea con los cambios institucionales y estratégicos descritos en el apartado anterior, durante 2025 el FCAS continuó reforzando su posicionamiento como instrumento clave de la Cooperación Española en materia de agua y saneamiento, avanzando hacia un enfoque cada vez más integrado, multisectorial y con proyección internacional.



1.663,48 M€

Total

Presupuesto total por países. Donaciones FCAS + contraparte local y otras aportaciones

PAÍS	Importe definitivo (MILLONES de EUROS)			
	Donación FCAS (1)	Contribución local (2)	Otros aportes (3)	**Total**
Argentina	1,62	1,62	–	**3,25**
Bolivia	99,29	39,04	9,10	**147,43**
Brasil	20,47	20,47	–	**40,93**
Centroamérica	3,31	0,67	–	**3,98**
Chile	6,77	14,70	–	**21,47**
Colombia	54,81	31,13	–	**85,93**
Costa Rica	13,91	51,99	255,14	**321,04**
Cuba	11,74	22,51	–	**34,25**
Ecuador	27,68	23,63	15,11	**66,42**
El Salvador	73,24	28,93	–	**102,17**
Guatemala	74,62	49,87	–	**124,49**
Haití	119,65	35,26	–	**154,90**
Honduras	57,20	3,16	1,58	**61,94**
México	20,83	27,53	–	**48,35**
Nicaragua	62,68	3,34	9,68	**75,69**
Panamá	10,48	5,30	4,14	**19,92**
Paraguay	71,93	23,02	16,59	**111,53**
Perú	58,89	3,82	112,41	**175,11**
República Dominicana	27,78	25,64	–	**53,41**
Uruguay	5,52	0,00	5,73	**11,24**
Total (4)	**822,40**	**411,61**	**429,47**	**1.663,48**

1 y 2) Los aportes del FCAS y las contrapartes no incluyen la ejecución de intereses.
3) Otros aportes se refiere a fondos de otras entidades movilizados a partir del programa. Solo se han contabilizado en los programas multilaterales.
(4) El presupuesto total no incluye las intervenciones realizadas por el BID, con fondos FCAS, en la modalidad de cooperaciones técnicas.

Tipos de programas

La cartera del FCAS continuó consolidándose durante 2025, manteniendo una amplia diversidad de instrumentos y modalidades de intervención adaptadas a las necesidades y prioridades de los países socios. Desde su inicio, el FCAS ha impulsado un total de 98 programas propios, que incluyen programas os bilaterales (ejecutados directamente por el FCAS) y multilaterales [ejecutados a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)].

Por otro lado, en el año 2025 se ha renovado la alianza de la Cooperación Española con el BID, a través de una aportación de 6 M€ al Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECALSAC) que se destinarán prioritariamente a la colaboración en el ámbito de la Amazonía, donde el BID está empezando a trabajar junto al Fondo para el Medio Ambiente Mundial; al refuerzo de la vinculación de agua, transición ecológica justa y adaptación al cambio climático, y a reforzar la sostenibilidad de las actuaciones realizadas hasta la fecha.

A todo ello se han sumado en los últimos años nuevas iniciativas vinculadas a cooperación delegada de la Unión Europea, fondos reembolsables y otras actuaciones financiadas por la AECID y organismos multilaterales. Este conjunto de instrumentos ha contribuido a posicionar al Fondo del Agua como uno de los principales referentes de la Cooperación Española en el sector del agua y el saneamiento, fortaleciendo el diálogo político y técnico con los países socios y promoviendo intervenciones alineadas con sus estrategias nacionales de desarrollo y con los marcos de asociación establecidos con la Cooperación Española.

Las actuaciones impulsadas por el FCAS responden siempre a las demandas y prioridades definidas por los propios países socios y combinan inversiones en infraestructura con fortalecimiento institucional, asistencia técnica, generación de conocimiento y apoyo a políticas públicas. Estas actuaciones pueden agruparse en las siguientes modalidades:

Programas propios del FCAS

Los programas propios son aquellos financiados directamente por el FCAS, con cargo a los fondos de la Cooperación Española y con aportaciones de contrapartida por parte de los países socios, en función de sus capacidades y contexto económico.

Programas bilaterales

Las donaciones son gestionadas directamente entre el FCAS y las instituciones de los países socios responsables de la ejecución de las intervenciones. A cierre de 2025, los programas bilaterales continúan representando la mayor parte de las operaciones activas del Fondo ascendiendo a un total 78 y constituyen una de las principales herramientas de cooperación en agua y saneamiento de la AECID.

Estas intervenciones se orientan principalmente a ampliar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y periurbanas, fortalecer a las entidades prestadoras de servicios y mejorar la sostenibilidad de los sistemas mediante el fortalecimiento institucional, la participación comunitaria y la incorporación de enfoques transversales como género, sostenibilidad ambiental, derechos humanos y diversidad cultural.

Programas Bi-multilaterales

Los programas bi-multilaterales son financiados por el FCAS y ejecutados en colaboración con el BID a través de FECASALC. Esta modalidad ha permitido combinar la experiencia técnica y financiera de ambas instituciones, promoviendo operaciones de gran alcance y fortaleciendo la sostenibilidad de las intervenciones.

Aunque en 2025 los programas de esta modalidad iniciados habían concluido su ejecución, la colaboración con el BID continuó desarrollándose a través de cooperaciones técnicas especializadas orientadas a fortalecer aspectos estratégicos del sector. Estas iniciativas permiten avanzar en áreas como el abastecimiento rural, la gestión integrada de los recursos hídricos, la igualdad de género, el trabajo con pueblos indígenas, la evaluación de programas y la gestión del conocimiento.

Otros programas asociados al Fondo

Además de los programas financiados directamente por el FCAS, existen otras iniciativas vinculadas al Fondo mediante diferentes mecanismos de colaboración y financiación, ampliando así el alcance y el impacto de la cooperación española en el sector del agua y el saneamiento.

Programas financiados mediante cooperación delegada de la Unión Europea

El FCAS participa en diversos programas financiados por la Unión Europea en el marco de la cooperación delegada. En estas operaciones, la Unión Europea confía la gestión de fondos a los Estados miembros y a sus agencias de cooperación, permitiendo articular intervenciones conjuntas de mayor escala e impacto.

En este contexto, el Fondo aporta valor añadido mediante asistencia técnica, fortalecimiento institucional y apoyo a componentes específicos relacionados con derechos humanos, sostenibilidad, resiliencia climática o atención a poblaciones vulnerables y dispersas.

Programas financiados con fondos ordinarios de la AECID

La Oficina del FCAS gestiona también otras iniciativas relacionadas con agua y saneamiento financiadas con cargo al presupuesto ordinario de la AECID, contribuyendo a reforzar la coherencia y complementariedad de las intervenciones de la Cooperación Española en el sector.

Programas financiados mediante FEDES

El Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) constituye uno de los principales instrumentos financieros de la Cooperación Española para promover inversiones orientadas al desarrollo sostenible. En el ámbito del agua y el saneamiento, el FCAS colabora en determinadas operaciones mediante aportaciones no reembolsables y asistencia técnica, con el objetivo de garantizar que las intervenciones alcancen también a las poblaciones más vulnerables y con mayores dificultades de acceso a los servicios básicos.

Estas modalidades de cooperación ofrecen nuevas oportunidades para ampliar progresivamente el alcance geográfico y temático de las actuaciones del Fondo en línea con la evolución institucional y estratégica de la AECID durante 2025, reforzando la capacidad de respuesta ante los desafíos globales relacionados con el agua, el saneamiento y la adaptación al cambio climático.



Resultados de los programas

El trabajo desarrollado por el FCAS ha permitido seguir ampliando el acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento para millones de personas, contribuyendo de manera directa a la mejora de las condiciones de vida, la salud pública y la resiliencia de las comunidades más vulnerables.

Hasta diciembre de 2025, las intervenciones impulsadas por el FCAS han beneficiado de forma directa a 4.826.057 millones de personas. De ellas, más de 4,2 millones han obtenido acceso a servicios de agua potable y más de 1,5 millones cuentan ya con soluciones de saneamiento adecuadas y sostenibles.

Asimismo, el Fondo ha contribuido a mejorar las condiciones de acceso a agua y saneamiento en centros educativos, fortaleciendo entornos más seguros y saludables para la infancia y la adolescencia. Desde el inicio del Fondo, 2.289 escuelas han sido dotadas de acceso a agua potable y 1.002 cuentan también con servicios de saneamiento.

El impacto del FCAS trasciende la construcción y mejora de infraestructuras ya que mantiene una visión integral del sector, impulsando políticas públicas, fortalecimiento institucional y modelos de gestión sostenibles que contribuyan a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

En este sentido, el FCAS continúa apoyando procesos relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), la gobernanza del agua, la adaptación y mitigación al cambio climático y el fortalecimiento de capacidades de las instituciones responsables de los servicios.

Las acciones de sensibilización y educación desarrolladas en el marco de los programas han permitido que más de 1,7 millones de personas participen en actividades relacionadas con higiene, uso responsable del agua y promoción de la salud. Asimismo, más de 69.000 personas han sido sensibilizadas en materias vinculadas a la gestión integrada de los recursos hídricos.

En materia de fortalecimiento de capacidades, desde 2008 el Fondo ha facilitado formación técnica y capacitación en gestión de servicios de agua y saneamiento a más de 68.800 personas, incluyendo operadores, personal técnico, instituciones públicas, organizaciones comunitarias y entidades prestadoras de servicios. De igual forma, más de 28.100 personas han participado en procesos formativos relacionados con la GIRH y la sostenibilidad ambiental.

Estos resultados reflejan el enfoque integral del FCAS, que combina inversiones en infraestructura con acompañamiento técnico, fortalecimiento institucional y generación de capacidades, contribuyendo así a construir servicios más sostenibles, inclusivos y resilientes frente a los desafíos sociales, económicos y climáticos actuales.



Impacto en las políticas públicas

El FCAS va mucho más allá de la construcción de infraestructuras y de la mejora del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. Uno de sus principales valores añadidos reside en su contribución al fortalecimiento de las políticas públicas del sector, ya que son estas las que permiten garantizar la sostenibilidad de las inversiones, ampliar su alcance y multiplicar su impacto sobre el conjunto de la población.

A través del fortalecimiento institucional, la asistencia técnica, el desarrollo de marcos normativos, la planificación sectorial y el impulso de la GIRH, el FCAS acompaña a los países socios en la consolidación de sistemas de agua y saneamiento más sólidos, resilientes y capaces de responder a los retos presentes y futuros. Este trabajo se complementa con el fortalecimiento de las capacidades de las entidades prestadoras y el empoderamiento de las comunidades, favoreciendo una gestión más participativa, inclusiva y sostenible de los servicios. En concreto, se ha trabajado en la realización de marcos normativos, estrategias sectoriales y planificaciones nacionales junto a 13 de los países socios.

Se destacan las siguientes actuaciones realizadas durante el año 2025:

Guía Técnica de Planificación Hidrológica en el marco de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, dirigida al ámbito Iberoamericano (ODS 6.5)



Uno de los principales hitos del FCAS en materia de fortalecimiento de las políticas públicas durante 2025 fue la presentación de la Guía técnica de planificación hidrológica en el marco de la gestión integrada de recursos hídricos, dirigida al ámbito iberoamericano (ODS 6.5). La Guía fue presentada en el marco de la XXV Confederación de Direcciones y Autoridades Iberoamericanas del Agua (CODIA), celebrada en Chile en octubre de 2025, culminando un intenso proceso de trabajo iniciado en 2018 e impulsado por el FCAS y la Secretaría Técnica Permanente de la CODIA, con la participación activa de los países miembros y de numerosas instituciones especializadas del sector.

La Guía constituye una herramienta de referencia para apoyar a los países iberoamericanos en la elaboración y actualización de sus planes hidrológicos, promoviendo una gestión más sostenible, participativa y resiliente de los recursos hídricos, en línea con la Meta 6.5 de los ODS. Su contenido integra de forma transversal los principios de la GIRH y el enfoque de derechos humanos al agua y al saneamiento, incorporando aspectos clave como la participación públi-

ca, la gobernanza, la adaptación al cambio climático, la gestión de sequías e inundaciones, la financiación de las actuaciones y la coordinación con otras políticas sectoriales.

Concebida como una herramienta práctica, flexible y adaptable a las diferentes realidades de la región, la Guía reúne metodologías, casos prácticos y recursos técnicos que facilitan su aplicación por parte de las administraciones responsables de la planificación hidrológica.

Ver noticia: Gran participación en el taller sobre la Guía de Planificación Hidrológica con Enfoque de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) - aecid.es

Ver noticia: La XXVI edición de la CODIA acoge la presentación de la Guía Técnica de Planificación Hidrológica, elaborada con la participación de toda la región - aecid.es

Planificación hidrológica nacional en República Dominicana

El programa *Apoyo a la elaboración del Plan Nacional de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos en la República Dominicana*. Fase 1, finalizado en diciembre de 2025, ha permitido culminar el apoyo al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) para la elaboración del Plan Hidrológico Nacional 2025-2045, un instrumento estratégico que orientará la planificación, gestión y gobernanza de los recursos hídricos del país durante las próximas dos décadas. Además del desarrollo del Plan, el programa ha permitido fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones del sector mediante acciones de formación especializada, entre ellas el Diplomado en Planificación Hidrológica, impartido por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Con ello, el FCAS contribuye a consolidar un marco de planificación que permitirá una gestión más sostenible, resiliente e integrada del agua en República Dominicana.

Ver noticia: República Dominica presenta su Plan Hidrológico Nacional, elaborado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) - aecid.es

Planificación hídrica y gestión de sequías en Bolivia

Durante 2025 el FCAS continuó apoyando al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua (MDPRyS) y a las entidades competentes en el fortalecimiento de la planificación y la gestión de los recursos hídricos como instrumentos clave para mejorar la gobernanza del sector.



En este marco, se culminó el *Plan Maestro de Agua Potable, Saneamiento y Drenaje Pluvial de la ciudad de Trinidad*, cuyo documento final fue supervisado por el CEDEX, centro colaborador del FCAS. Asimismo, se registraron avances significativos en la actualización del *Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable, Saneamiento y Drenaje Pluvial del área metropolitana de La Paz*, ampliando su alcance para incorporar un nuevo componente orientado al diseño de un sistema de gestión y gobernanza del agua para el área metropolitana.

Por otra parte, finalizó la elaboración de los *Planes Maestros de Gestión de Sequías para los operadores de agua de Tarija, Cochabamba, Sucre y Yacuiba*, quedando pendiente únicamente la transferencia de los productos finales a las entidades responsables de su implementación. Estos instrumentos contribuirán a reforzar la capacidad de planificación y respuesta frente a episodios de escasez hídrica y al fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas de abastecimiento.

Gestión integrada de los recursos hídricos en Cuba

Durante 2025 culminaron las actuaciones de cooperación técnica desarrolladas en el marco del programa de apoyo al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), consolidando un proceso de fortalecimiento institucional orientado a mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos en Cuba desde los ámbitos nacional, provincial y municipal.

Las acciones desarrolladas han contribuido a reforzar la planificación y la gobernanza del sector mediante el apoyo a la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional, el desarrollo del Plan Director de Saneamiento de La Habana y el fortalecimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en los municipios de Güines (Mayabeque) y San Antonio de los Baños (Artemisa).

Entre las actuaciones más relevantes del año destacan los talleres sobre normativa para la reutilización de aguas residuales, impartidos con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia (EMUASA) y CEDEX, que han contribuido al fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales en este ámbito.

Asimismo, con el apoyo de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (EMASESA) se continuó reforzando las capacidades técnicas de Aguas de La Habana en materia de monitorización de redes de saneamiento y elaboración de planes directores. Paralelamente, la asistencia técnica desarrollada por la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública (AMAP) permitió fortalecer la operación y el mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en los municipios de Güines y San Antonio de los Baños, incorporando mejoras en la sectorización de redes y en la planificación de su sostenibilidad económica y operativa.

Gobernanza del agua y fortalecimiento institucional en El Salvador

Durante 2025, el FCAS continuó acompañando a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) en el fortalecimiento del marco regulatorio del sector mediante asistencia técnica para la elaboración del *Reglamento del Dominio Público Hidráulico*. Aunque esta actuación forma parte del apoyo institucional que la Cooperación Española viene prestando en los últimos años para consolidar la gobernanza del agua y fortalecer las capacidades de la autoridad rectora del sector.

En el ámbito de la planificación hídrica, la ASA, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), impulsó actuaciones orientadas a mejorar el conocimiento y la gestión de los recursos hídricos, entre ellas el levantamiento del inventario de vertidos y la elaboración de un plan de acción para la microcuenca del río Matalapa y un tramo del río Acelhuate. Asimismo, durante 2025 se inició la elaboración del *Plan Hídrico de Suchitoto*, promovido por la Alcaldía Municipal de Cuscatlán Norte y desarrollado por la empresa española Vielca en coordinación con la ASA y el MARN.

Ver noticia: Cuscatlán Norte contará con un Plan Hídrico para mejorar el acceso y cuidado del agua


Por otra parte, la ASA continuó fortaleciendo la gestión comunitaria del agua mediante un programa de *apoyo a las Juntas de Agua rurales*, que benefició a más de 400 juntas, con un impacto sobre 285.548 personas (152.197 mujeres y 133.351 hombres). La iniciativa ha permitido reforzar sus capacidades técnicas, legales y administrativas, desarrollar un sistema de medición del desempeño y recopilar información de más de un centenar de juntas, contribuyendo a consolidar un modelo de gobernanza comunitaria alineado con la Ley General de Recursos Hídricos.

Ver noticia: La AECID, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la ASA presentan avances en la formalización y fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua.




Ejecución financiera en 2025

A fecha de diciembre 2025, el FCAS ha adjudicado un total de 778,46 M€, lo que representa un 94,66 % respecto al total de sus presupuesto. En cuanto a los fondos pagados, el porcentaje es del 92,32 %, lo que supone un total de 759,24 M€ respecto al total de presupuesto hasta 2025, (822,40 M€).

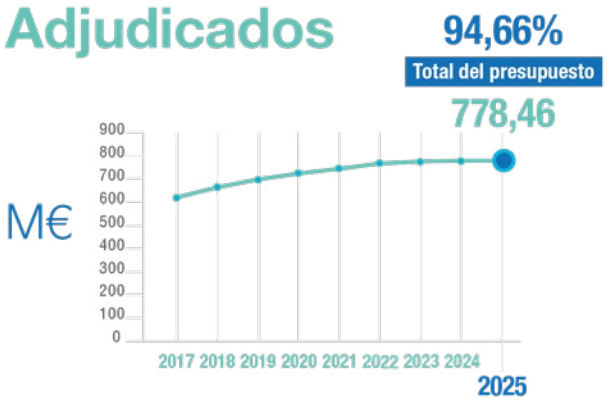

Fondos adjudicados por año, respecto al presupuesto FCAS (Millones de euros). Diciembre 2025


AÑO		BILATERAL	MULTILATERAL	TOTAL FCAS
2017	Presupuesto	382,85	396,97	**779,82**
	Diciembre	284,55	333,08	**617,62**
	%	74,32%	83,90%	**79,20%**
2018	Presupuesto	403,60	396,97	**800,57**
	Diciembre	304,06	358,17	**662,24**
	%	75,34%	90,23%	**82,72%**
2019	Presupuesto	403,65	397,68	**801,33**
	Diciembre	316,43	379,75	**696,18**
	%	78,39%	95,49%	**86,88%**
2020	Presupuesto	403,65	395,73	**799,38**
	Diciembre	332,88	390,97	**723,85**
	%	82,47%	98,80%	**90,55%**
2021	Presupuesto	403,71	395,73	**799,44**
	Diciembre	349,35	395,04	**744,39**
	%	86,53%	99,83%	**93,11%**
2022	Presupuesto	405,46	395,73	**801,19**
	Diciembre	372,75	393,62	**766**
	%	91,93%	99,47%	**95,65%**
2023	Presupuesto	415,63	395,73	**811,36**
	Diciembre	378,64	395,09	**773,73**
	%	91,10%	99,84%	**95,36%**
2024	Presupuesto	420,18	395,73	**815,91**
	Diciembre	382,36	395,18	**777,54**
	%	91,00%	99,86%	**95,30%**
2025	Presupuesto	**426,67**	**395,73**	**822,40**
	Diciembre	**383,28**	**395,18**	**778,46**
	%	**89,83%**	**99,86%**	**94,66%**

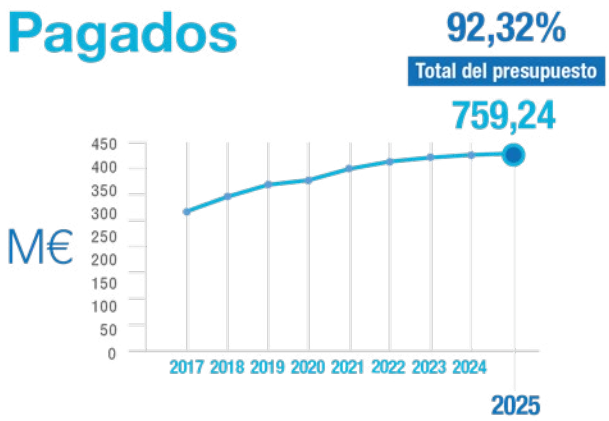

Fondos pagados por año, respecto a las donaciones FCAS (Millones de euros). Diciembre 2025				
AÑO		BILATERAL	MULTILATERAL	TOTAL FCAS
2017	Presupuesto	382,85	396,97	**779,82**
	Diciembre	234,89	299,10	**533,99**
	%	61,35%	75,35%	**68,48%**
2018	Presupuesto	403,60	396,97	**800,57**
	Diciembre	272,38	319,48	**591,86**
	%	67,49%	80,48%	**73,93%**
2019	Presupuesto	403,65	397,68	**801,33**
	Diciembre	292,15	346,01	**638,15**
	%	72,38%	87,01%	**79,64%**
2020	Presupuesto	403,65	395,73	**799,38**
	Diciembre	298,71	356,06	**654,76**
	%	74,00%	89,97%	**81,91%**
2021	Presupuesto	395,73	395,73	**791,46**
	Diciembre	323,15	376,66	**699,81**
	%	81,66%	95,18%	**88,42%**
2022	Presupuesto	405,47	395,73	**801,20**
	Diciembre	338,89	387,32	**726,21**
	%	83,58%	97,87%	**90,72%**
2023	Presupuesto	415,63	395,73	**811,36**
	Diciembre	350,69	392,48	**743,17**
	%	84,38%	99,18%	**91,60%**
2024	Presupuesto	420,182	395,73	**815,912**
	Diciembre	354,40	397,40	**751,80**
	%	84,35%	100,42%	**92,14%**
2025	Presupuesto	**426,67**	**395,73**	822,4
	Diciembre	**361,84**	**397,40**	759,24
	%	**84,81%**	**100,42%**	**92,32%**

Situación actual de los programas


Desde sus inicios y hasta diciembre de 2025, el FCAS ha puesto en marcha 98 programas. De ellos, 68 han finalizado completamente su fase de ejecución, 19 se encuentran en ejecución y 11 están en fase de diseño.

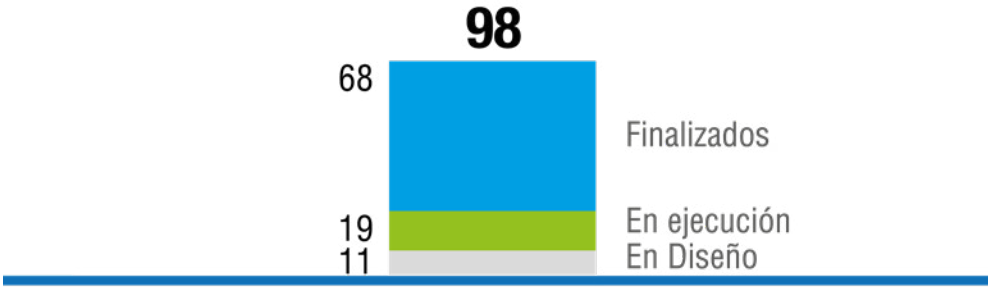

*El número total de programas no incluye las intervenciones realizadas por el BID, con fondos FCAS, en la modalidad de cooperaciones técnicas.

Horizonte temporal de los programas

Actualmente existen 30 programas en activo, y la previsión es que las iniciativas puestas en marcha los últimos años no finalicen hasta el año 2030.

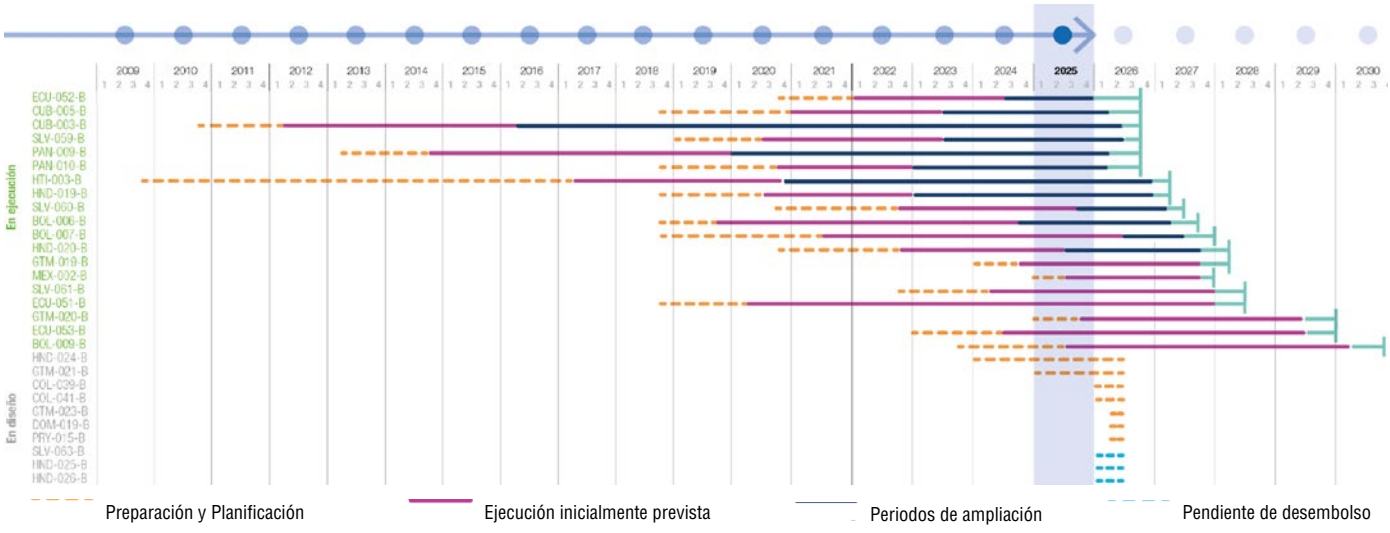

Horizonte temporal de programas FCAS

3.
El Gran Fondo





Un modelo de cooperación que multiplica resultados

Desde su creación en 2008, el FCAS ha evolucionado hasta consolidarse como un instrumento estratégico de la Cooperación Española en el sector del agua y el saneamiento, capaz de articular actores, movilizar recursos y generar alianzas en torno a la Agenda del Agua. Gracias a este enfoque, el impacto del FCAS trasciende ampliamente el volumen de sus propias donaciones, actuando como catalizador de iniciativas de mayor escala, alcance y sostenibilidad.

A lo largo de estos años, el Fondo ha impulsado un modelo de cooperación cada vez más integrado, basado en la combinación de distintos instrumentos financieros, cooperación técnica y alianzas institucionales. Entre ellos, destacan los fondos de cooperación delegada de la Unión Europea, la cooperación reembolsable del Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) y la colaboración con instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Multidonante AquaFund o el Banco Europeo de Inversiones (BEI), además de otras líneas bilaterales impulsadas por la AECID.

Este conjunto de actuaciones conforma lo que llamamos el “Gran Fondo”: un modelo de cooperación que permite ampliar el alcance de las intervenciones, movilizar recursos adicionales y promover operaciones más integrales y transformadoras en los países socios. El valor añadido de este modelo reside en su capacidad para generar sinergias y construir respuestas más eficaces y sostenibles frente a los desafíos del sector, especialmente en un contexto marcado por el cambio climático, las desigualdades territoriales y la creciente presión sobre los recursos hídricos.

El modelo del Gran Fondo se articula en torno a tres grandes ejes estratégicos:

Articulación de alianzas y actores

En línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 orientado a fortalecer las alianzas para el desarrollo sostenible, el FCAS ha consolidado su papel como espacio de coordinación y diálogo entre gobiernos, instituciones financieras internacionales, organismos multilaterales, cooperación europea, entidades públicas y actores técnicos especializados.

El Fondo actúa, así como un mecanismo facilitador capaz de conectar instrumentos, conocimientos y capacidades, favoreciendo intervenciones más coordinadas, eficientes y alineadas con las prioridades nacionales de los países socios.

Apoyo a políticas públicas y fortalecimiento institucional


El FCAS impulsa el desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar la implementación efectiva de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, así como el fortalecimiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

Las intervenciones incorporan un importante componente institucional y de gobernanza, apoyando a las administraciones responsables del sector en ámbitos como planificación, regulación, sostenibilidad financiera, fortalecimiento de operadores, gestión comunitaria y adaptación al cambio climático. Todo ello contribuye a consolidar servicios más resilientes, sostenibles e inclusivos.

Gestión del conocimiento y desarrollo de capacidades

La generación, intercambio y transferencia de conocimiento continúa siendo uno de los pilares fundamentales del FCAS. En un contexto global cada vez más complejo, el enfoque del Gran Fondo refuerza la capacidad del FCAS para adaptarse a nuevos desafíos y ampliar progresivamente sus ámbitos de actuación, consolidando su papel como instrumento de referencia de la cooperación española en materia de agua, saneamiento y desarrollo sostenible.

Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento
- Intercoonecta
- Desarrollo de redes y centros de formación de la CE
- Creación de herramientas
- Capacitación específica en programas
- Productos de conocimiento
- Propuestas de guías regionales

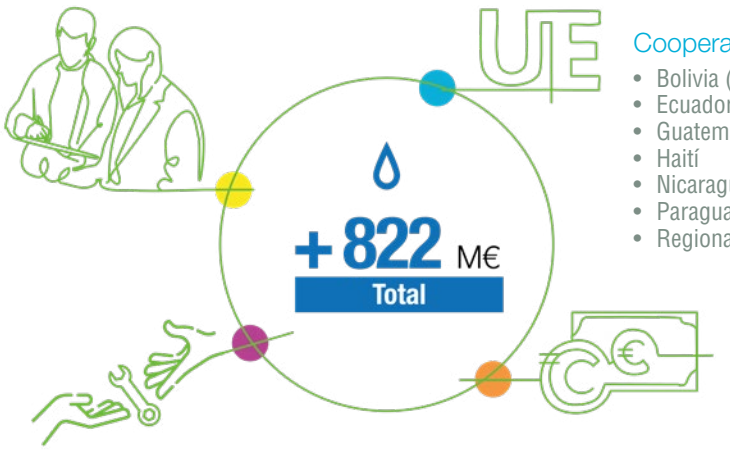

Cooperación delegada de la UE
- Bolivia (3 programas)
- Ecuador
- Guatemala
- Haití
- Nicaragua (3 programas)
- Paraguay
- Regional

Cooperación técnica
- Documentos estratégicos y normativos
- Ejecución de programas
- Participación en fondos multidonante
- Acompañamiento de políticas
- Instituciones públicas españolas

FEDES y cooperación reembolsable
- Bolivia
- Ecuador
- Panamá
- Paraguay

El gran Fondo

Instrumentos y modalidades de cooperación

En línea con el modelo de cooperación de la AECID y con los principios recogidos en la Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, el FCAS combina instrumentos de cooperación delegada, cooperación reembolsable y cooperaciones técnicas, promoviendo actuaciones complementarias orientadas a reforzar la sostenibilidad, eficacia y alcance de las intervenciones.

Cooperación delegada y cooperación reembolsable

La cooperación delegada y la cooperación reembolsable se han consolidado en los últimos años como instrumentos complementarios para ampliar el alcance, la escala y el impacto de las intervenciones impulsadas por el FCAS. Ambos mecanismos permiten movilizar recursos adicionales, articular alianzas con distintos actores nacionales e internacionales y promover operaciones de mayor dimensión en sectores estratégicos como el agua potable, el saneamiento, la gestión sostenible de los recursos hídricos y la resiliencia climática.

La cooperación delegada ha permitido reforzar el papel de la AECID, y en particular del FCAS, como entidad de referencia en la gestión de fondos de cooperación de la Unión Europea vinculados al sector del agua y el saneamiento. A través de este mecanismo, la Unión Europea confía la gestión de determinados recursos a los Estados miembros y a sus agencias de desarrollo, facilitando la puesta en marcha de programas de mayor alcance territorial, institucional y financiero.

Aunque este tipo de programas forma parte de la Cooperación Española desde hace más de una década, en los últimos años su relevancia ha aumentado significativamente tanto en volumen de recursos movilizados como en número de iniciativas y países participantes. En muchos casos, los programas previamente impulsados por el FCAS han servido como base para el desarrollo de nuevas operaciones financiadas por la Unión Europea, permitiendo escalar intervenciones ya existentes y ampliar su alcance territorial y sectorial.

Desde la creación del FCAS hasta diciembre de 2025, el FCAS ha participado en diversas operaciones de cooperación delegada en América Latina y el Caribe, tanto asociadas a programas específicos del Fondo como vinculadas a iniciativas sectoriales más amplias gestionadas desde la Oficina del FCAS. Estas actuaciones han incluido programas en Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Haití y Paraguay, así como iniciativas regionales orientadas al fortalecimiento del sector del agua y el saneamiento.

En 2025 destaca la aprobación de una nueva operación de 8,9 M€ que tendrá lugar en Nicaragua para apoyar el *Mejoramiento del acceso al agua y saneamiento rural y semi rural en la cuenca alta del río Coco*.

Cabe señalar que varias de estas actuaciones han sido seleccionadas como proyectos insignia de la Unión Europea (*flagship*). Esta denominación se refiere a proyectos que destacan por su impacto estratégico, su elevado presupuesto, su alineación con las grandes prioridades de la UE (como el Pacto Verde, la digitalización o los derechos humanos) y el enfoque de Equipo Europa (Team Europe). Entre ellas, están el *Programa de Agua Potable y Saneamiento en el área metropolitana de Asunción* (Paraguay); el *Programa de agua y saneamiento para comunidades rurales, ciudades menores e intermedias* (Bolivia) y el de *Agua y Saneamiento en comunidades rurales dispersas del cantón de Portoviejo* (provincia de Manabí, Ecuador).

En conjunto, las operaciones de cooperación delegada vinculadas al Fondo han permitido movilizar más de 156 M€ de euros de financiación de la Unión Europea y generar inversiones conjuntas que superan los 1.070 M€, gracias a la participación complementaria de gobiernos nacionales, instituciones financieras internacionales y otros mecanismos de cooperación.

Por su parte, la cooperación reembolsable constituye una herramienta clave para movilizar financiación orientada al desarrollo sostenible, permitiendo impulsar inversiones de gran escala en sectores estratégicos como el agua y el saneamiento. En el ámbito de la Cooperación Española, este tipo de actuaciones se canaliza a través del FEDES.

La articulación entre FEDES y el FCAS ha permitido complementar las donaciones del Fondo mediante créditos en condiciones favorables, favoreciendo operaciones de mayor dimensión e impacto. En muchos casos, estas actuaciones se combinan con otros instrumentos de financiación, configurando intervenciones integrales que permiten extender los beneficios de los proyectos a las poblaciones más vulnerables, reforzar la sostenibilidad de las inversiones y fortalecer las capacidades institucionales y técnicas del sector.

A lo largo de los últimos años, la cooperación reembolsable vinculada al FCAS ha apoyado programas en países como Bolivia, Ecuador, Panamá y Paraguay, contribuyendo al desarrollo de infraestructuras de agua potable y saneamiento, así como al fortalecimiento institucional y técnico del sector.

En línea con la evolución estratégica de la AECID y con la creciente importancia de las alianzas internacionales para afrontar los desafíos globales relacionados con el agua, el saneamiento y el cambio climático, la cooperación delegada y la cooperación reembolsable continúan representando instrumentos estratégicos para ampliar el impacto y la proyección internacional del FCAS, contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030 y de los compromisos globales en materia de desarrollo sostenible.

A continuación, se presentan los programas de cooperación delegada vinculados al FCAS, indicando, en su caso, aquellos que se articulan con instrumentos de financiación reembolsable de la Cooperación Española.

La información de los programas se puede encontrar haciendo click en el enlace que figura al lado de cada una de ellas, en la tabla que se encuentra en página 28.





PAÍS/ REGIÓN	Programa	MILLONES de EUROS			
		Donaciones		Otras aportaciones	Presupuesto total
		UE (incluyendo overhead)	FCAS y/o AECID (en programas asociados)		
Bolivia	*Apoyo al programa de agua y alcantarillado en áreas urbanas y periurbanas (APAAP)*	15,50	5,00	105,54	**126,04**
	Gestión integral del agua en áreas urbanas (GIAAU)	15,00	3,00	111,11	**129,11**
	Apoyo al programa de agua y saneamiento para comunidades rurales, ciudades intermedias y menores (PASCIM)	10,00	3,57	71,82	**85,39**
Ecuador	*Agua potable y saneamiento sostenibles para la población rural del cantón de Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador*	10,40	3,31	101,19	**114,90**
Guatemala	*Preservación y desarrollo sostenible de la cuenca del lago Petén Itzá y su zona de influencia*	16,00	1,75	27,15	**44,90**
Haití	*Agua y saneamiento (URBAYITI)*	3,00	1,00	48,50	**52,50**
Nicaragua	*Integral sectorial de agua y saneamiento (PISASH)**	50,75	63,55	199,70	**314,00**
	Mejora del servicio de agua potable en el sector de Altamira-Managua, con enfoques de sostenibilidad y equidad	10,00	_	8,76	**18,76**
	Mejoramiento del acceso al agua y saneamiento rural y semi rural en la cuenca alta del río Coco	8,90	_	_	**8,90**
Paraguay	*Agua y saneamiento para el área metropolitana de Asunción, cuenca de Lambaré*	10,51	1,14	149,69	**161,34**
Ámbito regional	*Promover la adaptación al cambio climático y la gestión integrada de los recursos hídricos en el sector de agua y saneamiento en América Latina**	15,30	_	_	**15,30**
TOTAL		**165,36**			**1071,14**

* programas ya finalizados a diciembre de 2025

Programas financiados con fondos de la Unión Europea (desde 2008 hasta diciembre del 2025)

Cooperaciones técnicas

Las cooperaciones técnicas constituyen una herramienta fundamental para fortalecer las capacidades institucionales, técnicas y de gestión de las entidades responsables del sector del agua y el saneamiento. A través de este tipo de actuaciones, el FCAS impulsa procesos de generación de conocimiento, asistencia especializada e intercambio de experiencias orientados a mejorar la sostenibilidad, eficacia y resiliencia de las intervenciones.

Estas, permiten apoyar ámbitos estratégicos como la elaboración de diagnósticos sectoriales, el diseño de políticas públicas, el fortalecimiento institucional, la sistematización de experiencias, el desarrollo de estudios de preinversión y prefactibilidad o la puesta en marcha de proyectos piloto que posteriormente puedan ampliarse a mayor escala.

En los últimos años, estas actuaciones se han desarrollado principalmente a través de dos grandes mecanismos complementarios: las cooperaciones técnicas impulsadas en el marco del programa LAIF Regional y las iniciativas financiadas mediante AquaFund, fondo multidonante gestionado por el BID.

En el marco de esta colaboración, la AECID continuó apoyando nuevas líneas de cooperación técnica durante 2025. Entre ellas destacan las actuaciones dirigidas al fortalecimiento institucional, técnico y social de pequeños operadores de agua y saneamiento en zonas rurales, así como iniciativas relacionadas con nuevas formas de generación de energía y su relación con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

Estas nuevas líneas de trabajo incorporan además enfoques innovadores vinculados a sostenibilidad ambiental, transición ecológica y resiliencia climática, en consonancia con las prioridades estratégicas de la AECID y de la Unión Europea en el marco de la iniciativa Global Gateway.

Cooperaciones técnicas realizadas en el marco de AquaFund

El FCAS continúa participando en AquaFund, un fondo multidonante impulsado por el BID orientado a financiar iniciativas innovadoras y cooperaciones técnicas en el sector del agua y el saneamiento.

AquaFund proporciona financiación no reembolsable para impulsar proyectos piloto, estudios técnicos, herramientas de conocimiento y procesos de fortalecimiento institucional que posteriormente puedan replicarse o ampliarse a mayor escala. Entre sus principales áreas de trabajo destacan el acceso al agua y saneamiento en zonas rurales y dispersas, la seguridad hídrica y adaptación al cambio climático, el fortalecimiento de operadores de servicios y la gestión del drenaje urbano y control de inundaciones.

Gracias a las contribuciones realizadas por los distintos socios, AquaFund ha permitido poner en marcha centenares de cooperaciones técnicas en la región, promoviendo soluciones innovadoras y fortaleciendo las capacidades de gobiernos, operadores, instituciones académicas, organizaciones sociales y otros actores vinculados al sector.

4.
Alianzas: Cooperación horizontal y multiactor





Un modelo basado en alianzas

La política de alianzas del FCAS se basa en un modelo de cooperación horizontal, multiactor y orientado a resultados, que busca fortalecer la coordinación entre instituciones y maximizar el impacto de las intervenciones en agua y saneamiento.

Este enfoque parte del convencimiento de que los desafíos relacionados con el acceso al agua, el saneamiento, la resiliencia climática y la sostenibilidad ambiental, requieren respuestas compartidas y una acción coordinada entre administraciones públicas, organismos multilaterales, instituciones financieras, entidades técnicas, sociedad civil, universidades y sector privado.

En línea con la Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, la AECID impulsa la generación de alianzas entre los distintos actores de la cooperación, promoviendo marcos de colaboración que permitan aprovechar capacidades, conocimiento y recursos de manera complementaria. En este contexto, el FCAS actúa como plataforma de articulación y diálogo entre actores nacionales e internacionales vinculados al sector del agua y el saneamiento.

A través de estas alianzas estratégicas, el Fondo contribuye al avance de la Agenda 2030 y, especialmente, al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas. Asimismo, incorpora de manera transversal principios relacionados con los derechos humanos, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, la equidad territorial y la resiliencia frente al cambio climático.

El modelo de cooperación impulsado por el FCAS prioriza además el fortalecimiento de capacidades locales y el acompañamiento a las instituciones públicas responsables de los servicios de agua y saneamiento, favoreciendo la apropiación de las intervenciones y la sostenibilidad de los resultados a largo plazo.

Para avanzar en estos objetivos, el Fondo cuenta con la colaboración de instituciones españolas y socios internacionales de referencia en el sector del agua, así como con el apoyo de organismos multilaterales, centros de investigación, universidades, entidades prestadoras de servicios y organizaciones sociales especializadas.

En el contexto de la evolución estratégica de la AECID y de la progresiva ampliación geográfica y temática del FCAS, las alianzas continúan desempeñando un papel clave para reforzar la capacidad de respuesta de la cooperación española ante los desafíos globales relacionados con el agua, el saneamiento y el desarrollo sostenible.

FCAS

Sociedad civil

Colaboraciones con ONGD y otros actores para impulsar el enfoque de Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento

Instituciones países socios

Las instituciones de los países socios (locales, departamentales o nacionales) son clave a la hora de ejecutar los programas

Banco Interamericano de Desarrollo

BID

Socio estratégico a través del cual se gestiona la cartera multilateral de los programas del Fondo

Unión Europea

Socio clave para la puesta en marcha de iniciativas integrales, a través de la cooperación delegada

Instituciones internacionales

- Banco Mundial I (BM)
- Stockholm International Water Institute (SIWI)
- Organización de las Naciones Unidas (ONU)
- Sanitation and Water for All (SWA)

Redes Iberoamericanas

- Conferencia de Direcciones y Autoridades Iberoamericanas del Agua (CODIA)
- Conferencia de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales Iberoamericanos (CIMHET)
- Red Iberoamericana de Oficinas del Cambio Climático (RIOCC)
- Red para América Latina de Centros de Excelencia en gestión del Agua (RALCEA)

Pecash

Pecash

Espacio que conecta administraciones públicas ONGD, sector privado y Academia

Universidades y Organismos de Investigación

- Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
- Intituto Geológico y Minero de España (IGME)
- Instituciones educativas(Universidad de Alcalá, Universidade da Coruña, …)

Sector público

El FCAS moviliza la cooperación técnica ofrecida por las instituciones españolas para dar apoyo técnico a los programas e impulsar el fortalecimiento de los operadores de agua

Sector privado

La implicación del sector privado es imprescindible para eliminar la brecha de financiación en el sector del agua

Alianzas FCAS

Sociedad Civil

El FCAS continúa fortaleciendo su trabajo conjunto con la sociedad civil, reconociendo el papel clave de las organizaciones no gubernamentales y redes de cooperación en la promoción del derecho humano al agua y al saneamiento, el fortalecimiento comunitario y la incidencia en políticas públicas del sector. En este marco, el Fondo mantiene una estrecha colaboración con entidades como ONGAWA y Acción contra el Hambre, ambas integrantes del Consejo Asesor del FCAS.

Durante el año 2025 se continuó trabajando con ONGAWA en la difusión y promoción de la herramienta para la incorporación de los derechos humanos al agua y al saneamiento en la gestión municipal, elaborada junto a Tragsatec. Esta herramienta tiene como objetivo facilitar a las municipalidades el conocimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos al agua y al saneamiento, así como orientar procesos de autodiagnóstico que permitan identificar avances y desafíos en su cumplimiento.

Asimismo, el FCAS siguió impulsando espacios de articulación y diálogo con organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Plataforma española de cooperación en agua, saneamiento e higiene. En este contexto, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (CONGDE) participó activamente en diversos grupos de trabajo de la plataforma, contribuyendo al fortalecimiento de alianzas, al intercambio de experiencias y a la incorporación de enfoques vinculados a los derechos humanos, la sostenibilidad, la equidad y la participación social en las intervenciones del sector.

Estas colaboraciones refuerzan el enfoque multiactor del FCAS y contribuyen a consolidar espacios de cooperación, aprendizaje conjunto y generación de conocimiento compartido entre administraciones públicas, operadores, universidades y sociedad civil organizada.

Banco Interamericano de Desarrollo

Desde los inicios del FCAS, se mantiene una alianza estratégica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad multilateral líder en inversiones en agua y saneamiento en América Latina y el Caribe, para la gestión de la cartera multilateral del Fondo. Bajo este modelo de cooperación interinstitucional surge el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC), instrumento conjunto entre el Gobierno de España y el BID orientado a impulsar el acceso universal y sostenible al agua potable y al saneamiento, con especial atención a las poblaciones más vulnerables y a los territorios con menores niveles de cobertura.

La colaboración entre el FCAS y el BID continúa consolidándose como una alianza estratégica basada en la complementariedad de capacidades técnicas y financieras, el fortalecimiento de políticas públicas sectoriales y la promoción de enfoques integrales para avanzar en la seguridad hídrica y la sostenibilidad de los servicios en la región. Asimismo, esta cooperación favorece el intercambio de conocimiento, el desarrollo de herramientas y metodologías innovadoras y la coordinación de intervenciones con impacto regional.

La colaboración con el BID continuó durante el 2025 con el seguimiento de las operaciones de cooperaciones técnicas, avanzando especialmente en iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional, la sostenibilidad de los servicios, la gestión integrada de los recursos hídricos, la igualdad de género, el apoyo a pequeños operadores y la innovación en el sector del agua y el saneamiento.

En el año 2025 se realizó una aportación de 6 M€ al FECALSAC que se destinarán prioritariamente a la colaboración en el ámbito de la Amazonía, al refuerzo de la vinculación de agua, transición ecológica justa y adaptación al cambio climático y a reforzar la sostenibilidad de las actuaciones realizadas hasta la fecha.

En conjunto, la alianza AECID-BID continúa posicionándose como uno de los principales instrumentos de cooperación regional en agua y saneamiento en América Latina y el Caribe, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades, la generación de conocimiento y el avance hacia el cumplimiento del ODS 6 relativo al acceso universal al agua y al saneamiento.

Ver noticia: Aecid y BID refuerzan su vínculo en favor de la acción climática en América Latina y Caribe - aecid.es

Instituciones Iberoamericanas del Agua

El FCAS mantiene una estrecha colaboración con las principales instituciones y redes iberoamericanas vinculadas a la gestión del agua, el cambio climático y los servicios hidrometeorológicos, contribuyendo al fortalecimiento de la cooperación regional, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de capacidades técnicas en el sector.

Entre estas alianzas destacan especialmente la Conferencia de Direcciones y Autoridades Iberoamericanas del Agua (CODIA), la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) y la Conferencia de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET), espacios de cooperación regional fundamentales para avanzar en la gestión sostenible y resiliente de los recursos hídricos en Iberoamérica.

En el marco de la CIMHET, el FCAS continúa apoyando iniciativas de fortalecimiento regional como la Red Centroamericana de Detección de Rayos, desarrollada con el acompañamiento técnico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), contribuyendo así a mejorar las capacidades de monitoreo y prevención frente a fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático.

La colaboración con la CODIA continúa siendo uno de los principales ejes de cooperación regional del Fondo del Agua. A través de reuniones periódicas, espacios de coordinación técnica, formación e intercambio de experiencias, el FCAS contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países iberoamericanos en ámbitos como la planificación hidrológica, la gobernanza del agua y el saneamiento.

Durante el 2025 se consolidó el trabajo desarrollado conjuntamente entre el FCAS y la CODIA en materia de planificación hidrológica con enfoque de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Fruto de este proceso colaborativo, en octubre de 2025, en el marco de la XXVI edición de la CODIA, se presentó oficialmente la Guía técnica de planificación hidrológica con en el marco de la gestión integrada de recursos hídricos, dirigida al ámbito iberoamericano (ODS 6.5), elaborada con la participación de numerosos países e instituciones de la región.

Durante el año continuaron desarrollándose además espacios de intercambio técnico, grupos de trabajo temáticos y foros de cooperación regional que permitieron compartir experiencias, fortalecer capacidades institucionales y avanzar en la construcción colectiva de soluciones frente a los desafíos hídricos y climáticos que enfrenta la región. Estos espacios han favorecido especialmente el intercambio de conocimiento en ámbitos prioritarios para la planificación hidrológica, como cambio climático, financiación, fortalecimiento institucional y participación social, reforzando así la cooperación técnica entre los países iberoamericanos.

Pecash

La Plataforma Española de Cooperación en Agua, Saneamiento e Higiene (Pecash) inició su andadura en 2025 como un espacio de referencia para la articulación, coordinación e intercambio entre los distintos actores españoles vinculados a la cooperación internacional en el sector del agua, el saneamiento y la higiene. Impulsada en el marco del trabajo en alianzas del FCAS, la plataforma inició su proceso de institucionalización y definición estratégica, promoviendo el diálogo multisectorial y ofreciendo un espacio para el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre los distintos actores del sector.

El año comenzó con la celebración, el 25 de febrero de 2025, del acto de presentación oficial de la Pecash en la sede de la AECID, un encuentro que reunió a representantes de administraciones públicas, operadores, universidades, organizaciones de la sociedad civil y otros actores del sector, con el objetivo de avanzar en la consolidación de este espacio de diálogo, coordinación y generación de sinergias.

Ver noticia: Gran acogida a la Plataforma española de cooperación en agua y saneamiento, que aglutina a los diversos actores del sector - aecid.es

Tras este acto de presentación, a lo largo del año se impulsaron diversas reuniones y espacios de trabajo orientados a fortalecer la gobernanza y el funcionamiento de la plataforma, destacando especialmente la puesta en marcha de cuatro grupos de trabajo temáticos centrados en financiación, la gestión y mejora de los servicios de agua y saneamiento, ODS6 y procesos internacionales y mapeo de actores en agua y saneamiento y alianzas.

Estos espacios, integrados por representantes de distintos ámbitos, permitieron profundizar en cuestiones prioritarias para el sector, favoreciendo el intercambio técnico, la generación de conocimiento compartido y la identificación de oportunidades de colaboración conjunta entre actores.

Con ello, la Pecash se consolida como un espacio estratégico para fortalecer las alianzas, promover la generación y difusión de conocimiento, y potenciar la acción coordinada de la cooperación española en el sector del agua, el saneamiento y la higiene.

Asimismo, durante 2025 se aprobaron los lineamientos de funcionamiento de la Pecash, definiéndose sus objetivos, principios de actuación y mecanismos de participación, lo que supuso un paso relevante para dotar a la plataforma de una estructura estable y orientada a resultados.

Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas

Desde el año 2012, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) mantiene una estrecha colaboración con el FCAS, aportando asistencia técnica especializada en ámbitos clave para el fortalecimiento del sector del agua y el saneamiento en América Latina y el Caribe. Esta colaboración abarca, entre otros aspectos, el desarrollo de actividades formativas, la elaboración de guías y recomendaciones técnicas, la planificación hidrológica y sectorial, así como el apoyo al diseño y supervisión de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

Durante el año 2025, el CEDEX continuó apoyando distintas iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional y técnico de los países socios del FCAS. Entre las actuaciones desarrolladas destacan los trabajos de asistencia técnica en Panamá para la elaboración de herramientas y recomendaciones vinculadas al tratamiento de aguas, así como el apoyo prestado en República Dominicana para la definición y mejora de redes de control y seguimiento de la calidad del agua.

Asimismo, se continuó avanzando en la elaboración y difusión de documentación técnica especializada, incluyendo guías y recomendaciones orientadas a mejorar la planificación sectorial del saneamiento y el tratamiento de aguas residuales, así como herramientas de diseño de tecnologías de tratamiento para su libre utilización y difusión entre instituciones y operadores del sector.

En el ámbito de la gestión del conocimiento y el fortalecimiento de capacidades, el CEDEX continuó impulsando el apoyo al desarrollo normativo en materia de aguas en América Latina y Caribe, contribuyendo a la modernización institucional del sector y al intercambio de experiencias entre los países de la región. Esta línea de trabajo comprende el acompañamiento a procesos de revisión y elaboración de normativa, guías técnicas y recomendaciones orientadas a mejorar la gobernanza del agua, la planificación hidrológica y la gestión sostenible de los recursos hídricos, favoreciendo la consolidación de marcos institucionales.

Del mismo modo, el CEDEX participó activamente en actividades formativas impulsadas por el FCAS, colaborando en cursos y talleres especializados sobre planificación sectorial del saneamiento, tratamiento y reutilización de aguas, mediante la impartición de sesiones técnicas y el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

El CEDEX continuó colaborando en espacios de diálogo técnico e intercambio regional vinculados a la normativa y regulación sectorial, apoyando grupos de trabajo especializados y contribuyendo al análisis y discusión de instrumentos relacionados con la sostenibilidad y la gestión de los servicios de agua y saneamiento.

Ver noticia: CEDEX - AECID: proyectos de agua y saneamiento en el marco del FCAS | CEDEX

Más información: Apoyo al desarrollo normativo en materia de aguas en América Latina | Cedex

Universidade da Coruña

Desde el año 2021, el FCAS mantiene una colaboración con la Universidade da Coruña (UDC) en el marco del "Convenio para la gestión, apoyo técnico y capacitación en el ámbito de la planificación del saneamiento y drenaje sostenible" en Bolivia, financiado con fondos europeos del programa LAIF *Apoyo al programa de agua y alcantarillado en áreas urbanas y periurbanas (APAAP)*.

A través de este acuerdo, la universidad continúa proporcionando asistencia y supervisión técnica especializada para el desarrollo de herramientas y procesos de planificación vinculados al saneamiento y al drenaje urbano sostenible en distintas ciudades bolivianas, entre ellas Cobija, Trinidad, Oruro y Sucre. Asimismo, se ha seguido avanzando en la elaboración de instrumentos técnicos como la "Guía para la elaboración de planes maestros de drenaje urbano" y el "Manual de técnicas de gestión de aguas pluviales", orientados a fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de las entidades responsables del sector.

La colaboración incluye además actividades de formación y fortalecimiento de capacidades mediante cursos, talleres y espacios de intercambio técnico sobre drenaje urbano sostenible y planificación sectorial, contribuyendo a la incorporación de enfoques innovadores y resilientes en la gestión del agua en entornos urbanos.

Paralelamente, la Universidade da Coruña continúa prestando asistencia técnica al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el agua y el drenaje urbano sostenible, apoyando la incorporación de soluciones basadas en sostenibilidad y resiliencia climática en ciudades como Sucre, Oruro y Trinidad.

Asimismo, durante el año 2025 la Universidade da Coruña participó activamente en los espacios de trabajo impulsados por la Pecash, en el grupo de trabajo de mapeo de actores e intervenciones y fortalecimiento de alianzas, contribuyendo con su experiencia académica y técnica al análisis y articulación de capacidades de la cooperación española en el sector del agua y el saneamiento.

Tragsatec

El FCAS mantiene una colaboración continua con Tragsatec, empresa pública de ingeniería y asistencia técnica perteneciente al Grupo Tragsa, especializada en el desarrollo de soluciones técnicas y de apoyo a las administraciones públicas en distintos ámbitos, entre ellos el agua, el medio ambiente y las infraestructuras. Su asistencia técnica constituye un apoyo estratégico para la gestión, seguimiento y coordinación de los programas del Fondo, dada la elevada cualificación técnica de sus equipos y su experiencia en proyectos complejos vinculados al sector del agua y el saneamiento.

La colaboración de Tragsatec abarca ámbitos clave para la ejecución y fortalecimiento de las intervenciones del FCAS, incluyendo el seguimiento técnico de programas, la mejora de procesos y procedimientos de gestión, el asesoramiento en infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y tratamiento de aguas, así como el acompañamiento técnico en el desarrollo e implementación de políticas públicas y marcos normativos sectoriales.

Durante el año 2025 Tragsatec ha prestado apoyo en el fortalecimiento de los sistemas de planificación, monitoreo y evaluación del Fondo, mediante el desarrollo y seguimiento de indicadores orientados a medir el avance de los programas y su impacto en la población beneficiaria. Este trabajo resulta fundamental para reforzar la capacidad de análisis, la toma de decisiones y la rendición de cuentas del FCAS.

De igual manera, la asistencia técnica de Tragsatec ha contribuido al desarrollo de ámbitos transversales como la gestión del conocimiento, el fortalecimiento institucional, la sistematización de experiencias y el apoyo a las tareas de comunicación y difusión de resultados del Fondo, favoreciendo una mayor visibilidad e intercambio de aprendizajes en el sector del agua y el saneamiento.

Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.

La Empresa de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. (EMASESA), empresa pública responsable de la gestión del ciclo integral del agua en el área metropolitana de Sevilla, mantiene una colaboración activa con la AECID y el FCAS en el marco de su estrategia de cooperación internacional al desarrollo, basada en el intercambio de conocimiento, capacidades técnicas y buenas prácticas entre operadores públicos.

Esta colaboración se articula a través del Protocolo General de Actuación suscrito entre ambas instituciones en noviembre de 2020, posteriormente prorrogado, y que proporciona un marco estable para el desarrollo de iniciativas conjuntas orientadas al fortalecimiento del sector del agua y el saneamiento en América Latina y el Caribe, contribuyendo al avance hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 relativo al acceso universal al agua y al saneamiento. Ver noticia: Emasesa firma con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo un protocolo de colaboración para los próximos 4 años - Emasesa

En el marco de esta alianza, durante el año 2025 continuaron desarrollándose acciones de capacitación, intercambio técnico y cooperación entre operadores, dirigidas a entidades e instituciones beneficiarias de programas de la AECID y del FCAS. Estas actuaciones han permitido fortalecer capacidades técnicas y de gestión, promover modelos de operación más sostenibles y favorecer el intercambio de experiencias entre operadores públicos de distintos países.

Asimismo, EMASESA participa activamente en los espacios de trabajo impulsados en el marco de la Pecash, en concreto en el grupo de trabajo orientado a la mejora y fortalecimiento de los servicios de agua y saneamiento, aportando su experiencia como operador público de referencia y contribuyendo al intercambio de buenas prácticas y conocimiento técnico sectorial.

La colaboración con el FCAS representa además para EMASESA una oportunidad de seguir consolidando su política de cooperación internacional desde una perspectiva técnica y de aprendizaje mutuo, aprovechando tanto la experiencia acumulada de la empresa como la amplia trayectoria, presencia territorial y red de alianzas del Fondo en la región.

Ver noticia: Sevilla acoge los Diálogos sobre hermanamientos entre Operadores de Agua y la Jornada española para la promoción de la cooperación técnica y alianzas en el sector - aecid.es

Instituto de Crédito Oficial

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), en su calidad de agente financiero del FCAS, desempeña un papel clave en la gestión financiera y administrativa de las operaciones del FCAS.

Entre sus funciones principales se encuentra la formalización, en nombre y representación del Gobierno de España, de los convenios de financiación suscritos con las entidades beneficiarias del Fondo. Asimismo, el ICO presta los servicios financieros asociados a las operaciones autorizadas con cargo al FCAS, garantizando el adecuado seguimiento y gestión de los recursos financieros vinculados a los programas.

En el ejercicio de estas funciones, el ICO contribuye a asegurar la correcta ejecución financiera de las operaciones, apoyando la eficacia, transparencia y seguridad jurídica de los procedimientos vinculados al Fondo.

De manera anual, el ICO elabora además un informe de actividades que recoge la situación y evolución de las operaciones financieras gestionadas en el marco del FCAS.

5.
Operaciones



Bolivia 41



Colombia 47



Cuba 53



Ecuador 56



El Salvador 60



Guatemala 65



Haití 69




Honduras 72



México 78




Nicaragua 80



Panamá 82




Paraguay 86



República Dominicana 89



Regional 92



Cooperaciones técnicas 94



Bolivia

Programas FCAS en ejecución
• **BOL-006-B** *Apoyo al programa de agua y alcantarillado urbano y periurbano (APAAP).* • **BOL-007-B** *Programa de gestión integral del agua en áreas urbanas (GIAAU).* • **BOL-009-B** *Programa de agua y saneamiento para comunidades rurales, ciudades menores e intermedias.*
Otros programas en ejecución
• **LAIF Bolivia-LA/2017/390-223** *Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado en Áreas Urbanas y Peri-Urbanas.* • **DCI/LA/2019/410-047** *Programa de Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas.* • **700002477** *Programa de agua y saneamiento para comunidades rurales, ciudades menores e intermedias.*

FCAS en Bolivia

Al finalizar 2025 el Fondo continuaba la ejecución de tres programas en Bolivia que forman parte de tres intervenciones más amplias en las que participan la Unión Europea, con fondos no reembolsables, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con préstamo al Estado de Bolivia. También cuentan con aporte local de gobiernos municipales y empresas locales prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento. De esta manera, se ha logrado poner en marcha iniciativas de mayor impacto y largo alcance, que permiten el fortalecimiento general del sector y de las entidades beneficiarias.

Durante toda la trayectoria del FCAS en Bolivia el único socio y entidad beneficiaria del gobierno boliviano ha sido el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua (MDPRyS), a través del Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico, que realiza la dirección, ejecución y seguimiento de las acciones financiadas por la cooperación internacional en el sector de Agua Potable y Saneamiento.

Programas FCAS en ejecución

BOL-006-B
Apoyo al programa de agua y alcantarillado en áreas urbanas y periurbanas (APAAP)

Este programa forma parte del programa global *Apoyo al programa de agua y alcantarillado en áreas urbanas y periurbanas (APAAP)* y cuenta con 5 M€ de financiación. El mismo, tiene como objetivo lograr servicios sostenibles de agua y saneamiento impulsando el cumplimiento progresivo de los derechos humanos al agua mediante la conciliación de la sostenibilidad ambiental, el crecimiento económico y el impacto del cambio climático.

El proyecto *Construcción Extensión de la Red de Agua Potable para las Comunidades Chicani y Chinchaya Fase II y Sistema de Alcantarillado Sanitario* finalizó con éxito y se realizó su puesta en marcha en julio de 2025. El 1 de agosto se realizó el acto protocolar de inauguración y entrega del proyecto al gobierno municipal.

Por su parte, se avanzó significativamente en la elaboración de planes maestros de agua potable, saneamiento y drenaje pluvial y de sequías, concretamente:

- Fue finalizado el Plan Maestro de Agua Potable, Saneamiento y Drenaje Pluvial en la ciudad de Trinidad, cuya elaboración fue supervidada por el CEDEX.

- Fue finalizado el Plan Maestro de Sequías para operadores de servicios en Tarija, Cochabamba, Sucre y Yacuiba, quedando únicamente pendiente la transferencia de los productos a los operadores.

Se avanzó significativamente con el estudio de Actualización del *Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable, Saneamiento y Drenaje Pluvial del área metropolitana de La Paz*, cuyo plazo fue ampliado y su alcance aumentado con un nuevo producto para elaborar el sistema de gestión y gobernanza el agua en el área metropolitana. A finales de 2025, el programa tenía un 97% de los fondos previstos en el Plan de Adquisiciones y una ejecución acumulada del 82% de la subvención.

BOL-007-B
Programa Gestión integral del agua en áreas urbanas (GIAAU)

Este programa forma parte del Programa *Global Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas (GIAAU)*, cuenta con 3 M€ de financiación , y tiene como objetivos específicos:

- Mejorar el manejo de los recursos hídricos en zonas urbanas.
- Promover la creación y fortalecimiento de los operadores de agua y saneamiento en las ciudades beneficiadas.
- Mejorar la información sobre el recurso hídrico y proveer de herramientas que permitan diseñar e implementar acciones estratégicas para la seguridad hídrica de los sistemas de agua potable y saneamiento de dichas ciudades.

Se trata de una iniciativa que quiere dar respuesta a las restricciones de suministro y déficits de cobertura de diversas ciudades. Para ello, se establecerán acciones estratégicas y lineamientos siguiendo las directrices de los Planes Maestros Metropolitanos financiados en el Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano Fase I (PAAP I) –con apoyo de AECID-BID-, así como los realizados en el PAAP II con financiación BID.

En el año 2025 se ha continuado con la ejecución de los proyectos de Gestión de Recursos Hídricos *Fortalecimiento del sistema de monitoreo de embalses* y *Apoyo a la Estrategia Nacional de Sequía* mediante la generación y sistematización de información relativa a balances Oferta/Demanda de agua e incorporación de la data en procesos de evaluación de riesgo respecto a zonas vulnerables en el contexto del *Monitor Nacional de Sequía* para las regiones de Tarija, Sucre y Chiquitanía. Para estas consultorías se contó con la asistencia técnica de un experto internacional en el área.

No obstante, aunque las consultorías vienen desarrollándose correctamente, la finalización de estos proyectos va a extenderse del plazo previsto, debido al cambio de gobierno en el país y en el retraso en la firma de convenios con los diferentes operadores para la adquisición de equipamientos dirigidos al fortalecimiento institucional. El cierre de estos proyectos está condicionado a disponer de estos equipamientos para que las consultoras realicen su instalación, formaciones en su manejo y reciban los datos para probar los visores online asociados y la visualización de los datos.

Finalmente, respecto al proyecto de *Fortalecimiento de la red de monitoreo de aguas subterráneas (SIASBO)*, la consultoría se ha desarrollado con normalidad, pero debido al retraso inicial en su contratación se prevé que finalizará en 2026. A finales de 2025, la subvención BOL-007-B tenía un 31% de fondos pagados y un 41% de fondos adjudicados.



BOL-009-B
Apoyo al programa de agua y saneamiento para comunidades rurales, ciudades intermedias y menores (PASCIM)

Esta iniciativa de 3,57 M€ está enmarcada en una intervención de *blending e* intervendrá en comunidades rurales de menos de 2.000 habitantes y ciudades menores de 20.000 habitantes y sus objetivos incluyen, por un lado, ofrecer acceso a servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento e higiene que sean sostenibles y resistentes al cambio climático y, por el otro, fortalecer a los operadores de agua y saneamiento (Comités de Agua y Empresas Proveedoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento –EPSAS-) en las comunidades y poblaciones beneficiarias, así como las capacidades de los actores sectoriales a nivel central, departamental y municipal. La contribución específica de los fondos FCAS se concentra en el Componente I de Infraestructura.

El 24 de abril de 2025 el programa inició oficialmente con la aprobación del *Plan Operativo General del programa* y el 22 de septiembre de 2025 se realizó un evento de lanzamiento con asistencia de los embajadores de España y de la UE en Bolivia, así como del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y representantes de las entidades locales con quienes el Ministerio firmó simbólicamente los convenios para la realización de los proyectos incluidos en el POA 2025.

Durante 2025 se avanzó con la revisión técnica de 5 proyectos de infraestructura incluidos en la planificación. También se realizaron las primeras reuniones de trabajo con las nuevas autoridades y personal técnico, tanto del nuevo Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego y Agua como de la unidad ejecutora del programa, la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Programas (UCEP-MDPRYA).

Otros programas en ejecución

Además de los programas financiados directamente por el FCAS se destacan otras tres actuaciones.

LAIF Bolivia-LA/2017/390-223
Apoyo al programa de agua y alcantarillado en áreas urbanas y periurbanas (APAAP)

Este programa es una iniciativa de modalidad *blending* que cuenta con una financiación de 126,04 M€ para invertir en varias ciudades y áreas periurbanas de Bolivia y ha sido posible gracias a la articulación de diversos actores y mecanismos de financiación. Por un lado, el Fondo del Agua aporta 5 M€ provenientes del programa BOL-006-B, a los que se suman 15,5 M€ aportados por la Unión Europea, a través de los Fondos LAIF delegados a España. Por otro lado, cuenta con la aportación local de Bolivia (22,22 M€ aprox.), un crédito del BID de 55,55 M€ y fondos complementarios del programa de canje de deuda España-Bolivia de 27,77 M€.

El objetivo del programa es expandir y optimizar el acceso a servicios de agua y saneamiento para la población beneficiaria de más de 200.000 personas y mejorar la administración pública del sector en Bolivia. Asimismo, se pretende afianzar la política nacional para la gestión integral de recursos hídricos, reduciendo el impacto del cambio climático sobre los segmentos menos favorecidos de la sociedad boliviana.

En el año 2025 se avanzó significativamente en la ejecución del programa con la firma de 28 contratos y con un aporte de fondos europeos a la AECID de 1.323.579,81 €.

La AECID aprobó una nueva extensión de la vigencia del programa hasta el 31 de marzo de 2027 por el contexto del programa y debido a retrasos acumulados en su ejecución.

En 2025 se avanzó significativamente con la construcción del *Centro Internacional de Investigación y Desarrollo en Aguas Residuales* (CIIDAR) en el municipio de Oruro, avanzando también en las relaciones institucionales para el futuro funcionamiento y gobernanza del centro, con la participación de la Universidad Técnica de Oruro, el MDPRyA y el Gobierno Municipal de Oruro.

También en 2025 finalizó la obra *Construcción ampliación sistema de agua potable barrios periurbanos Sucre* beneficiando, según datos del MDPRyA, a 54.248 personas con una mejora en el acceso al agua.

Se avanzó en los productos de la consultoría para la elaboración del *Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Sucre* y fue iniciada la consultoría para la elaboración del *Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Oruro*. Ambos estudios cuentan con la colaboración de expertos de la Universidade da Coruña.

En el primer semestre de 2025 se realizó un curso impartido por la Universidade da Coruña sobre Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible en el que participaron los técnicos de los municipios de Sucre, Oruro y Trinidad, así como técnicos del Ministerio. Posteriormente, los técnicos municipales realizaron los estudios de preinversión de las plantas piloto de Drenaje Urbano Sostenible a ubicar en los distintos pisos ecológicos de Bolivia (Sucre, Oruro y Trinidad), estando pendiente la licitación de las obras.

Por otro lado, iniciaron los contratos de consultoría para todas las acciones de fortalecimiento institucional para beneficiar a 27 empresas de servicios de agua potable y saneamiento en diferentes regiones del país con acciones de gestión de oferta y demanda de agua, planes quinquenales, elaboración de catastros comerciales y de redes y equipamiento.



DCI/LA/2019/410-047
Programa de Gestión integral del agua en áreas urbanas (GIAAU)

Este programa cuenta con una donación de 3 M€ del Fondo del Agua (*BOL-007-B*) y otros 15M€ de fondos delegados por la Unión Europea, a los que se suman la aportación de fondos reembolsables del FEDES con 25,6 M€ y del BID con 85,5 M€, y .El objetivo del programa es contribuir a que la población en áreas periurbanas tenga acceso nuevo o mejorado a servicios básicos de saneamiento y promover la GIRH en áreas urbanas y reducir el impacto del cambio climático en la población. El programa financiará intervenciones para la ampliación y mejora de los servicios de agua potable y saneamiento, enfocadas en aquellas medidas que permitan mitigar las crisis de abastecimiento de agua provocadas por las sequías, pero también contribuirá a mejorar la gestión de la oferta y la demanda de los recursos hídricos de manera integral.

En el año 2025 se continuó la ejecución de las obras *Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco Viejo Oruro*, llegando a un 92% de avance.

El 25 de abril de 2025 fue iniciada la obra *Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR San Pedro*, en el departamento de Santa Cruz.

En el año 2025 fue autorizada la inclusión de dos nuevos proyectos en el programa: la obra de *Construcción del sistema de alcantarillado sanitario barrio San Miguel II, Lomas de Obrajes Y San Francisco de Asís* y el estudio de preinversión *Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario – Zona San Mateo*, ambos proyectos en el municipio de Tarija.

Se continuó con el desarrollo de los estudios de preinversión *Construcción sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR Satélite Norte Distrito 3 – Warnes y Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tiquipaya* y con la ejecución de la obra *Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR San Pedro* en el departamento de Santa Cruz, que consiguió un avance del 33%.

700002477
Apoyo al programa de agua y saneamiento para comunidades rurales, ciudades intermedias y menores (PASCIM)

Este programa cuenta con una donación de 3,57 M€ del Fondo del Agua y otros 10 M€ delegados por la Unión Europea a los que se suma un crédito de 71,82 M€ del BID.

Este programa tiene como objetivo aumentar y/o mejorar los servicios de agua y saneamiento en Bolivia, mejorando las condiciones de vida de la población que habita en ciudades pequeñas e intermedias de Bolivia (menos de 20.000 habitantes) al aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, fortalecer los hábitos de higiene y potenciar a los operadores de agua y saneamiento para así aumentar la resiliencia del sistema. El programa sigue un enfoque de derechos humanos y género, incluyendo consultas y participación de los titulares de derechos y de la comunidad, y mejoras en la infraestructura actual que limitará las emisiones de carbono.

En el año 2025 se avanzó con la elaboración y aprobación del Plan Operativo General y Plan Operativo Anual, documento compartido con el programa BOL-009-B.



Colombia

Programas FCAS en ejecución
• **COL-018-B** *Programa Todos por el Pacífico* • **COL-022-B** *Programa Multiveredal integral del Pacífico* • **COL-035-B** *Programa de abastecimiento de agua y saneamiento para el sector rural 2*
Programas FCAS aprobados en 2025
• **COL-039-B** *Mejora del servicio de agua potable del servicio casco urbano del municipio de El Tarra, Norte de Santander.* • **COL-041-B** *Programa FISYO Acueductos Comunitarios de Bogotá para el Fortalecimiento Institucional, Social y Operacional de los Acueductos Comunitarios de Bogotá.*
Otros programas en ejecución
• **COL-038-ALC** *Elaboración del nuevo marco tarifario de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores y rurales.* • **CO-T1779 BID** *Programa CONEXIÓN AGUA para fortalecimiento institucional, de gobernanza y de operadores.*

FCAS en Colombia

Durante el año 2025, el FCAS ha consolidado su posicionamiento en Colombia como un actor estratégico en la transformación estructural del sector de agua y saneamiento, avanzando más allá de la financiación de infraestructuras hacia el fortalecimiento de políticas públicas, la gobernanza sectorial y la sostenibilidad de los servicios.

En coherencia con el Marco de Asociación España - Colombia, la intervención del FCAS ha priorizado territorios con mayores brechas, especialmente en zonas rurales, periurbanas y comunidades étnicas, contribuyendo de manera directa a la realización progresiva de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

El año 2025 ha estado marcado por la aprobación de nuevos programas estratégicos y el avance en iniciativas orientadas a la reforma normativa, el fortalecimiento de prestadores y la consolidación de modelos de gestión adaptados al contexto territorial colombiano. Se ha intensificado la articulación con actores clave del sector, como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, asociaciones gremiales sectoriales y entidades territoriales, así como con organismos multilaterales y socios de cooperación, reforzando el papel del FCAS como plataforma de coordinación y generación de conocimiento. Este enfoque integral permite avanzar hacia servicios más eficientes, inclusivos y resilientes, en línea con los desafíos del cambio climático y la equidad territorial.

Programas FCAS en ejecución

COL-018-B
Programa Todos por el Pacífico

Durante 2025 se ha terminado de completar el proceso de justificación de este programa, una intervención orientada a garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento básico en zonas históricamente excluidas y con altos índices de pobreza multidimensional, como son diversos municipios del litoral Pacífico colombiano.

El programa, que tenía como objetivo principal el fortalecimiento institucional y la ejecución de infraestructuras de acueducto y alcantarillado en 14 municipios de los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño y Antioquia, logró su implementación efectiva en 11 de ellos. Esta intervención contribuyó al cierre de brechas en acceso a servicios esenciales, alineándose con el ODS 6 y con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, particularmente en lo relacionado con la justicia ambiental y territorial.

COL-022-B
Programa Multiveredal integral del Pacífico

En 2025 se ha terminado de completar el proceso de justificación de este programa, orientado a mejorar el acceso a agua potable y saneamiento básico en los centros poblados de La Guayacana, Llorente, Espriella y Tangareal, en el municipio de Tumaco (Nariño). El departamento de Nariño y el municipio Tumaco son zonas prioritarias para la cooperación española, dada su alta vulnerabilidad social, económica y ambiental. En este contexto, el programa representó una oportunidad de articulación con actores locales y regionales y contribuyó al fortalecimiento de las capacidades institucionales y de planificación del territorio.

COL-035-B
Programa de abastecimiento de agua y saneamiento para el sector rural

Durante 2025 se ha terminado de completar el proceso de justificación de este programa, formulado para mejorar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales de los municipios de Fonseca y San Onofre. La Cooperación Española ha manifestado su compromiso de seguir apoyando nuevas iniciativas en el país, alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo y los enfoques territoriales priorizados por el MAP Colombia – España, reforzando así la estrategia del FCAS de trabajar en los derechos humanos al agua y al saneamiento, de manera sostenible y equitativa, especialmente en áreas rurales con alta vulnerabilidad estructural.



Programas FCAS aprobados en 2025

COL-039-B
Mejora del servicio de agua potable del servicio casco urbano del municipio de El Tarra, Norte de Santander

El programa, orientado a la mejora del servicio de agua potable en el casco urbano del municipio de El Tarra, con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) como entidad beneficiaria, se desarrolla en una de las regiones más vulnerables del país, marcada por importantes desafíos en materia de acceso a servicios básicos, gobernanza territorial y condiciones de seguridad.

La intervención tiene como objetivo garantizar un servicio de agua potable continuo, seguro y de calidad para la población urbana del municipio, contribuyendo al cierre de brechas estructurales en el acceso y mejorando las condiciones de salud pública y bienestar de la comunidad. Para ello, el programa contempla actuaciones integrales que combinan la mejora de la infraestructura existente con el fortalecimiento institucional del prestador del servicio, incorporando criterios de sostenibilidad técnica, operativa y financiera.

Adicionalmente, incorpora un enfoque social y comunitario, promoviendo la participación de la población beneficiaria, el fortalecimiento del tejido social y la apropiación del servicio por parte de la comunidad. Esta intervención se alinea con las estrategias de estabilización territorial del Gobierno de Colombia y con los objetivos del FCAS de trabajar en contextos frágiles, contribuyendo a la construcción de paz a través del acceso equitativo a servicios esenciales.

COL-041-B
Programa FISYO Acueductos Comunitarios de Bogotá para el Fortalecimiento Institucional, Social y Operacional de los Acueductos Comunitarios de Bogotá

FISYO es un programa orientado al fortalecimiento institucional, social y operacional de los acueductos comunitarios de Bogotá con la Secretaría Distrital del Hábitat de la Alcaldía de Bogotá como entidad beneficiaria.

Constituye una intervención estratégica en el ámbito rural y periurbano de la capital, donde los acueductos comunitarios desempeñan un papel fundamental en la prestación del servicio, pero enfrentan importantes desafíos en términos de sostenibilidad, calidad del agua, capacidad técnica y gestión organizativa. En este contexto, el programa busca consolidar modelos de prestación más robustos, eficientes y resilientes, garantizando el acceso al agua bajo un enfoque de derechos humanos.

La intervención se estructura en tres componentes principales: i) fortalecimiento institucional de los prestadores comunitarios, mejorando su gobernanza y capacidades de gestión; ii) fortalecimiento técnico-operativo, orientado a mejorar la calidad del agua, la continuidad del servicio y la eficiencia de los sistemas; y iii) fortalecimiento social, centrado en la educación ambiental, la cultura del agua y la participación comunitaria.

El programa FISYO representa una apuesta innovadora por el reconocimiento y fortalecimiento de los sistemas comunitarios como actores clave del desarrollo territorial, contribuyendo a su integración en el sistema institucional del sector y alineándose con las políticas distritales y nacionales de inclusión y sostenibilidad.

Otros programas en ejecución

Además de los programas financiados directamente por el FCAS, en Colombia hay otras dos actuaciones de AECID gestionadas por el FCAS que actualmente se están desarrollando con especial énfasis en el desarrollo de políticas públicas sectoriales y el fortalecimiento institucional, tanto de entidades prestadoras, como de instituciones gubernamentales.

COL-038-ALC
Elaboración del nuevo marco tarifario de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores y rurales

Este programa ha avanzado de manera significativa en su objetivo de diseñar un nuevo marco tarifario para pequeños prestadores y gestores comunitarios de los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia, consolidándose como una intervención estratégica de alto impacto en la política pública sectorial. La Comisión Reguladora del Agua, dependiente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ha sido el socio estratégico para la elaboración de la propuesta normativa.

Tras el desarrollo de los estudios técnicos durante 2024, en 2025 se ha llevado a cabo el proceso de consulta pública del nuevo marco regulatorio, incluyendo la realización de talleres territoriales y espacios de participación con actores del sector, prestadores, comunidades y entidades gubernamentales. Este proceso ha permitido enriquecer la propuesta normativa, asegurando su adecuación a las realidades operativas, económicas y sociales del ámbito rural.

El nuevo marco tarifario incorpora principios de progresividad, asequibilidad, simplicidad y enfoque territorial, adaptando los esquemas regulatorios a las capacidades de los pequeños prestadores y promoviendo la sostenibilidad financiera de los servicios sin comprometer el acceso de la población más vulnerable.

Durante 2025 se ha iniciado además la formulación de la segunda fase del programa, orientada a consolidar la implementación efectiva del nuevo marco tarifario en los territorios. Esta fase estará centrada en los procesos de socialización, capacitación y acompañamiento a prestadores, autoridades locales y gestores comunitarios, con el objetivo de facilitar su comprensión y aplicación progresiva en condiciones reales de operación. De este modo, el programa avanzará desde el desarrollo normativo hacia su apropiación territorial, completando el ciclo de la gobernanza sectorial y fortaleciendo directamente las capacidades de los operadores. Esta transición resulta clave para asegurar la sostenibilidad financiera de los servicios, mejorar su calidad y garantizar el acceso equitativo en contextos rurales, consolidando el papel del FCAS como actor estratégico en la articulación entre regulación, política pública y prestación efectiva de los servicios.

CO-T1779 BID
Programa CONEXIÓN AGUA para fortalecimiento institucional, de gobernanza y de operadores

En 2025 ha comenzado la implementación del programa *Conexión Agua*, una iniciativa multiactor liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo de la Cooperación Española (FCAS), la Cooperación Suiza (SECO) y otros fondos como AquaFund. Está orientada al fortalecimiento sistémico del sector de agua y saneamiento en Colombia. Noticia relacionada: Una iniciativa transformadora para fortalecer el servicio de agua potable en Colombia - aecid.es

El programa se desarrolla a nivel nacional con especial énfasis en territorios vulnerables priorizados y su objetivo es garantizar servicios eficientes, sostenibles e inclusivos mediante el fortalecimiento institucional, técnico-operativo y social de los prestadores de servicios, avanzado en la promoción de herramientas innovadoras como AquaRating o Fisagua, el desarrollo de guías de acceso a financiamiento y el fortalecimiento de capacidades en gestión y gobernanza, contribuyendo a la modernización del sector y al cierre de brechas en la prestación del servicio.



El programa incorpora una componente nacional de cultura del agua, con especial énfasis en entornos rurales, desarrollada en articulación con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Esta línea de actuación tiene como objetivo promover cambios sostenibles en los hábitos de uso, gestión y valoración del recurso hídrico, fortaleciendo la relación entre las comunidades y los servicios de agua y saneamiento. A través de estrategias pedagógicas, procesos participativos y herramientas de educación ambiental adaptadas al contexto territorial, se busca reforzar la apropiación social del servicio, mejorar la sostenibilidad de las infraestructuras y contribuir a la consolidación de modelos de prestación más resilientes e inclusivos. Esta componente resulta clave para garantizar que las inversiones y el fortalecimiento institucional se traduzcan en impactos duraderos, alineados con el enfoque de derechos humanos al agua y al saneamiento y con los objetivos del ODS 6.

Durante 2025 se han puesto en marcha las primeras acciones del programa, incluyendo la estructuración de la gobernanza del mismo, la activación de mesas técnicas sectoriales y el inicio de iniciativas de fortalecimiento empresarial. Entre ellas destacan la implementación de esquemas de hermanamiento entre operadores (WOP), liderados por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL), y el impulso de la Acción Sectorial del Agua con la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), consolidando espacios de coordinación y aprendizaje entre actores del sector.

Por otro lado, ha reforzado su papel como actor estratégico en la articulación del sector de agua y saneamiento en Colombia, mediante su participación activa en espacios de diálogo, coordinación institucional y generación de conocimiento.

Destaca su presencia en el Encuentro Sectorial de Acueducto y Alcantarillado organizado por ANDESCO en Barranquilla, donde se abordaron los principales desafíos del sector en materia de sostenibilidad, regulación y fortalecimiento empresarial, y la participación en la Asamblea General de la Acción Sectorial del Agua como plataforma de coordinación entre prestadores.

Asimismo, el FCAS participó en el Encuentro Nacional de Gestores Comunitarios del Agua celebrado en Bogotá, presidido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, contribuyendo a visibilizar el papel de los sistemas comunitarios como actores clave para garantizar el acceso equitativo y sostenible al agua en territorios rurales.

De forma complementaria, el FCAS ha reforzado su participación en espacios técnicos sectoriales, contribuyendo a la consolidación de las mesas de trabajo como mecanismos clave de articulación entre la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, las asociaciones gremiales nacionales y la banca multilateral. Estos espacios favorecen la construcción de consensos, el intercambio de conocimiento y la alineación de enfoques en torno a los principales retos del sector, especialmente en materia de regulación, sostenibilidad de los servicios y fortalecimiento de los prestadores. A través de este posicionamiento, el FCAS contribuye a fortalecer la gobernanza sectorial y a impulsar marcos de actuación más coherentes, inclusivos y adaptados a la realidad territorial, en línea con el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento y del ODS 6.



Cuba

Programas FCAS en ejecución
• **CUB-003-B** *Programa de mejora de la gestión integral del agua en las cuencas tributarias de las bahías de La Habana y de Santiago de Cuba.* • **CUB-005-B** *Mejora y gestión sostenible del servicio de agua en los municipios de Cueto y La Palma.*
Otros programas en ejecución
• *Soluciones técnicas al tratamiento de aguas residuales industriales en la Bahía de La Habana.* • *Apoyo a la gestión sostenible de los recursos hídricos en Cuba.*

FCAS en Cuba

El año 2025 ha sido un año especialmente complejo para la economía cubana, en el que se ha visto la debilidad de su sistema electroenergético, altamente dependiente de un combustible fósil, con caídas del sistema completo en todo el país y acrecentada por la situación geográfica, origen de un terremoto que afectó a las provincias orientales de la isla y al paso de un huracán que afectó especialmente a Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín.

Pese a las dificultades, los programas financiados por el FCAS se han seguido desarrollando, y en este año se entregó la Memoria de justificación de un programa de mejora y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento en pequeñas ciudades cubanas y de un programa orientado a facilitar soluciones técnicas al tratamiento de aguas residuales industriales en la Bahía de La Habana.

También durante este año 2025 tuvo lugar la inauguración de la planta potabilizadora de agua de Jatibonico (Sancti Spiritus, Cuba), en la que participó Emma Orejudo Prieto de los Mozos, Subdirectora de Transición Ecológica, Agua y Lucha contra el Hambre y Oficina del FCAS de la AECID, durante la misión realizada al país en el mes de julio para hacer seguimiento de los programas.

Ver noticia: Inauguración de la planta de agua potable de Jatibonico.

Programas FCAS en ejecución

CUB-003-B
Programa de mejora de la gestión integral del agua en las cuencas tributarias de las bahías de La Habana y de Santiago de Cuba

Este programa, de alto impacto en la calidad del agua de la Bahía de La Habana, está modernizando el bombeo de agua residual de los municipios más afectados por las intrusiones del mar en la capital.

Se han instalado nuevas bombas en la estación de rebombeo de Casablanca lo que permitirá mantener el funcionamiento del sistema de recogida y descarga de las aguas residuales procedentes de la zona centro de La Habana en la Playa del Chivo, a través del sifón del alcantarillado de La Habana, considerado una de las maravillas de la ingeniería cubana y en funcionamiento desde hace más de 100 años.

En el marco de este programa se han hecho, también, las modificaciones necesarias en la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de San Matías y se han hecho operaciones de mantenimiento en la PTAR de Mantilla.

CUB-005-B
Mejora y gestión sostenible del servicio de agua en los municipios de Cueto y La Palma

Este ambicioso programa, diseñado para suplir las últimas carencias de agua potable en los municipios de Cueto (y a sus pedanías Marcané y Alto Cedro) en la provincia de Holguín y al municipio de la Palma, en la provincia de Pinar del Río, se ha enfocado, a lo largo del 2025 en terminar la estación de captación y bombeo del agua necesaria para las poblaciones mencionadas de Holguín y construir la conductora hasta la PTAP Ramón II que ha sido completamente renovada, tanto estructuralmente como en la tecnología instalada, lo que permitirá automatizar el tratamiento del agua lo que a su vez facilitará su operación y mantenimiento por la UEB Aguas de Cueto.

Se han realizado visitas de sensibilización a la población de las dos localidades, mientras se sigue abasteciendo ambas con agua en pipas (cisternas) y góndolas ferroviarias.

Otros programas en ejecución

Soluciones técnicas al tratamiento de aguas residuales industriales en la Bahía de La Habana

Este programa, gestionado por el Grupo de Trabajo Estatal Bahía de La Habana (GTE-BH) ha finalizado su ejecución y justificación en 2025.

El programa concluyó todas sus actividades, algunas apoyadas por medio de una subvención en especie y destinadas a la capacitación de técnicos en diseño de sistemas de tratamiento de aquellas aguas residuales industriales presentes en las cuencas tributarias a la Bahía de La Habana, y otras apoyadas en subvención dineraria, que ha permitido el fortalecimiento de la institución y el equipamiento de laboratorios en la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE).

Durante el año 2025 pudieron desarrollarse las actividades de formación, en modo de pasantías en España, más concretamente en Valencia, que debieron suspenderse en 2024 debido a la DANA que azotó esa ciudad en octubre.

Apoyo a la gestión sostenible de los recursos hídricos en Cuba

El Programa de impacto en el Sector del Agua cubano tiene como objetivo fortalecer a través de sus tres componente, la gestión del Recurso Hídrico a nivel nacional, el Plan Director de Saneamiento de La Habana a nivel Provincial y de los sistemas de agua potable y saneamiento de dos municipios en las provincias de Artemisa y Mayabeque .

Todas las actividades relacionadas con la ayuda en especie (cooperación técnica), han finalizado en el año 2025.

Se han efectuado talleres de normativa de reúso del agua residual, en los que se ha contado con la experiencia de técnicos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Entidad de Saneamiento de la Región de Murcia (ESAMUR) y el CEDEX.

Apoyados por la EMASESA, se ha continuado fortaleciendo al equipo técnico de Aguas de La Habana en monitorización de redes de saneamiento y elaboración de planes directores que le permitirá programar sus necesidades para los próximos años.

Con la consultoría de la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública (AMAP) se han visitado y potenciado los sistemas de agua potable y saneamiento de Güines y San Antonio de los Baños, tanto en operación como en manuales de mantenimiento. Los intercambios técnicos han incidido también en la sectorización de redes y en los principios básicos de sostenibilidad de redes y sus costes asociados.



Ecuador

Programas FCAS en ejecución
• **ECU-051-B** *Programa de agua potable y saneamiento en comunidades rurales dispersas en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí.* • **ECU-052-B** *Agua potable y saneamiento en comunidades rurales del cantón San Lorenzo frente a la crisis sanitaria del COVID-19.* • **ECU-053-B** *Programa de Cooperación para el fomento de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en comunidades rurales.*
Otros programas en ejecución
Operación combinada cooperación delegada y cooperación reembolsable: • **LAIF Ecuador. LA/2020/417-023** *Agua potable y saneamiento sostenibles para la población rural del cantón de Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador.*

FCAS en Ecuador

El FCAS, a través de la Oficina de la Cooperación Española en Ecuador, se encuentra ejecutando tres programas bilaterales y un programa de cooperación delegada LACIF de la UE. La cartera vigente de fondos no reembolsables asciende a 13,98 M€ de fondos FCAS y 10,4 M€ (incluidos los gastos de gestión del programa) de fondos LACIF-UE. Los Programas en ejecución se centran en las siguientes líneas de actuación para Latinoamérica: concretamente:

- Acceso sostenible a servicios de agua potable.
- Acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento.
- Fortalecimiento de la gestión integral del recurso hídrico.
- Establecimiento de sistemas sostenibles de suministro de servicios públicos de agua y saneamiento.

Programas FCAS en ejecución

ECU-051-B
Programa de agua potable y saneamiento en comunidades rurales dispersas en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí

Este programa se enfoca en aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y de saneamiento a comunidades rurales dispersas del cantón Portoviejo que, por su ubicación geográfica (distancia y/o cota), no pueden ser abastecidas a través del gran sistema de agua potable que se está construyendo con la financiación de una operación de *blending* coparticipada por FEDES-AECID, BID y LACIF-UE, y que prevé abastecer a las cabeceras parroquiales.

Durante el año 2025, los esfuerzos se centraron especialmente en labores de gestión y administración, enfocadas a la operatividad de la ampliación de alcances del programa (monto, plazo y beneficiarios/as) y a la recepción definitiva de los diversos contratos vinculados a la infraestructura de agua potable y soluciones de saneamiento.

Se han desarrollado varios procesos de fortalecimiento institucional y social en el territorio, tales como la construcción de espacios físicos para el habitual funcionamiento de los prestadores comunitarios en cada sistema de agua potable, equipando a estos espacios y organizaciones con las herramientas informáticas necesarias para una gestión eficaz y eficiente de los servicios, con el fin de favorecer su sostenibilidad a largo plazo. Paralelamente, se ha acompañado a los prestadores comunitarios en su gestión, fortaleciendo sus capacidades y logrando altos índices de sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios, uno de los riesgos detectados con anterioridad por el beneficiario y por la AECID.

Además, se iniciaron los estudios y diseños para ampliar los sistemas de agua potable existentes, los cuales esperamos que deriven en la ejecución de nuevas obras de infraestructura que permitan ampliar la cobertura actual de los servicios de agua potable y soluciones de saneamiento.



ECU-052-B
Agua potable y saneamiento en comunidades rurales del cantón San Lorenzo frente a la crisis sanitaria del COVID-19

Este proyecto se dirige a fortalecer la provisión de servicios de agua y saneamiento en comunidades rurales de alta vulnerabilidad en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Su objetivo es mejorar las condiciones de salud y la capacidad de prevención de enfermedades de la población a través de la mejora del servicio de agua potable y saneamiento en las comunidades beneficiarias, e introduciendo además la variable de respuesta a situaciones de emergencia relacionadas con la pandemia.

A lo largo del año 2025 han continuado las obras correspondientes a la rehabilitación del sistema de agua potable para la comunidad.

ECU-053-B
Programa de Cooperación para el fomento de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en comunidades rurales

El objetivo de este programa es garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento, con un enfoque de transición ecológica justa, para favorecer modelos de uso y aprovechamiento sostenible del agua en las áreas rurales de Esmeraldas y Manabí.

El programa es ejecutado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE B.P.) con el apoyo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y la participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) de Muisne, Jama y Pedernales.

Durante el año 2025, se ha firmado la financiación de los Estudios y Diseños de Jama y de Pedernales, se ha iniciado la licitación de la obra del sistema de agua potable de la parroquia de Chamanga con el gobierno de Muisne. Se ha avanzado en el arranque del Convenio de Cooperación Interinstitucional (CCI) entre el BDE B.P. y el MAATE, para la ejecución de las actividades de gestión social y fortalecimiento institucional de los proyectos. En este contexto, el CCI debió ser actualizado como consecuencia de la reestructuración institucional derivada de la fusión por absorción del MAATE por parte del Ministerio de Energía y Minas, creándose el nuevo Ministerio de Ambiente y Energía.

Ver noticia: Arranca el Programa de Cooperación para el fomento de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en Comunidades Rurales en Ecuador - AECID -FCAS - aecid.es

Otros programas en ejecución

LA/2020/417-023
Agua potable y saneamiento sostenibles para la población rural del cantón de Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador

En el cantón de Portoviejo, la Municipalidad ejecuta un gran programa (denominado *Plan Triple AAA*) para mejorar el acceso al agua y al saneamiento de la población rural de todo el cantón; cuyo objetivo es la construcción de un gran sistema de agua potable de 47 km y varios sistemas de alcantarillado (proyecto base) para atender a las cabeceras parroquiales rurales y las zonas en tránsito, así como pequeños sistemas de agua potable para las zonas rurales dispersas que no pueden conectarse al sistema principal.

La operación total conjuga diversas financiaciones y donaciones, donde la Cooperación Española tiene una importante participación a través de tres mecanismos: fondos delegados de LACIF-UE, financiación reembolsable de FEDES y una donación del FCAS. La distribución de aportes es la siguiente: 3 operaciones reembolsables con fondos del BEI (54,44 M€), BID (25 M€) y FEDES-AECID (15,45 M€), para la ejecución el proyecto base; 2 donaciones no reembolsables de fondos LACIF-AECID (10,4 M€, incluidos los gastos de gestión del programa)



y FCAS-AECID (3,3 M€) para la ejecución del proyecto en zonas rurales dispersas y apoyos puntuales al proyecto base; y una contraparte local del GADMP (6,3 M€).

El programa conlleva importantes actuaciones sociales y ambientales, con un fuerte componente de desarrollo comunitario que permita asegurar la participación de la población beneficiaria final en todas las fases del programa, de cara a lograr la sostenibilidad de los sistemas.

Durante el año 2025, el *Plan Triple AAA* ha ejecutado los estudios y diseños definitivos de las obras de infraestructura previstas e iniciado la etapa precontractual de los estudios y diseños de la siguiente etapa.

Asimismo, a través de la ONG ecuatoriana Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), se ha culminado la ejecución de los *Expedientes Técnicos Familiares* de la fase piloto, acumulando, hasta finales de 2025, un total de 58 conexiones domiciliarias a la red de alcantarillado o a soluciones de saneamiento ejecutadas, instalar 51 aparatos sanitarios en baños, e instalar 57 puntos de agua y 56 lavaplatos en cocinas. Adicionalmente, en materia de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, se culminaron las acciones planificadas e iniciadas en anualidades anteriores, logrando acumular, hasta finales de año, un total de 8,40 hectáreas forestadas y/o reforestadas, y 1,22 hectáreas con obras de protección a la infraestructura hidráulica existente.

Conviene destacar el esfuerzo realizado de formulación y planificación de la escalada del trabajo ejecutado como piloto con el FEPP, el cual permitirá llegar a más familias, más viviendas y más hectáreas intervenidas a partir de 2026, una vez se suscriba senda Resolución de Concesión de Subvención para tal fin.



El Salvador

Programas FCAS en ejecución
• **SLV-059-B** *Construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del subsector de agua potable y saneamiento en el área rural*, fase I.
• **SLV-060-B** *Construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del subsector de agua potable y saneamiento en el área rural*, fase II.
• **SLV-061-B** *Fortalecimiento de la gestión hídrica municipal y comunitaria.*
Programas FCAS aprobados en 2025
• **SLV-063-B** *Fortalecimiento del Marco Institucional del recurso hídrico en El Salvador incorporando los enfoques de cuenca, de género y de adaptación y mitigación frente al cambio climático.*
Otros programas en ejecución
• **SLV-062-ALC** *Fortalecimiento de las capacidades de las juntas de agua de El Salvador para el cumplimiento del marco legal y normativo del recurso hídrico garantizando su protección y preservación.*

FCAS en El Salvador

El trabajo en El Salvador se centra en extender el acceso y la gestión sostenible de los servicios de agua y saneamiento con énfasis en las zonas rurales, a través de tres programas financiados por el FCAS. La donación del FCAS para los tres programas asciende a 9,07 M€, mientras que la aportación local de las instituciones salvadoreñas es de 2,1 M€. Dos de los programas son de ámbito nacional, y están siendo implementados por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) como ejecutor principal, y por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como ejecutor delegado. Mientras que el tercero tiene un alcance municipal y es ejecutado por la Alcaldía Municipal de Cuscatlán Norte. Por su parte, el proyecto financiado por AECID con 300.000 € también es de alcance nacional, y lo implementó la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) que aporta una contrapartida de 85.000 €.

Programas FCAS en ejecución

SLV-059-B
Construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del subsector de agua potable y saneamiento en el área rural, fase I

A lo largo del año 2025 las inversiones financiadas por el FCAS en la fase I del programa ascendieron hasta los 1,02 M€, de los cuales 0,97 M€ se destinaron a la mejora de la infraestructura, las capacidades de gestión y administración, así como la implementación de acciones de protección y conservación del recurso hídrico en doce Juntas de Agua (JA) que administran sus correspondientes sistemas de abastecimiento, y los restantes 50.000 € se destinaron a gestión y administración.

Las inversiones destinadas a la mejora de los 12 sistemas de abastecimiento se articulan a través de dos modalidades de ejecución.

Por una parte, se han desarrollado 6 intervenciones directas adjudicadas mediante licitación pública. De ellas, 3 proyectos finalizaron en 2025: el de la *Asociación Comunal de Agua Colonias Unidas Valle Nuevo*, en el distrito de Juayúa, municipio de Sonsonate Norte, departamento de Sonsonate (ACACUVAN); el de la *Asociación de Desarrollo Comunal Cantón San Antonio Abajo*, en el distrito de Santiago Nonualco, municipio de La Paz Centro, departamento de La Paz (ADESCOSAAB); y el de la *Asociación Comunal de Agua y Saneamiento Monseñor Óscar Arnulfo Romero*, en el distrito de Suchitoto, municipio de Cuscatlán Norte, departamento de Cuscatlán (ACASMA).

Asimismo, está prevista para enero de 2026 la finalización del proyecto del *Comité de Administración del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Santa Lucía*, situado en el distrito de Sensuntepeque, municipio de Cabañas Este, departamento de Cabañas (CADSAPS). A estas actuaciones se suman otros 2 proyectos iniciados en noviembre de 2025, cuya finalización está prevista en 2026: el de la *Asociación de Desarrollo Comunal Magdalena*, en el distrito de Chilanga, municipio de Morazán Sur, departamento de Morazán (ADESCOMAG); y el de la *Asociación Comunal Administradora de Agua Potable Cantón San Antonio Arriba–El Centro*, en el distrito de Santiago Nonualco, municipio de La Paz Centro, departamento de La Paz (ASCAPAC).

Por otra parte, se financian 6 intervenciones mediante los fondos concursables de la región oriental del país. Estas actuaciones iniciaron su ejecución entre julio y diciembre de 2025 y está previsto que finalicen entre junio y julio de 2026. Corresponden a la Asociación Comunal Pinares de Corinto, en el distrito de Corinto, municipio de Morazán Norte, departamento de Morazán (ACOMPINCO); la Asociación Comunal Administradora del Sistema de Agua Viva, en el distrito de Ozatlán, municipio de Usulután Este, departamento de Usulután (ACASAVA); la Asociación Comunal Administradora del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Salud, Medio Ambiente y Saneamiento Básico Fuente de Bendición, en el distrito de Ciudad Barrios,



municipio de San Miguel Norte, departamento de San Miguel (ACASAPFUBEN); el Sistema de Agua Potable Cantón El Borbollón, en el distrito de El Tránsito, municipio de San Miguel Oeste, departamento de San Miguel (SAPCANBO); la Asociación de Desarrollo Comunal Solidaridad, en el distrito de Jiquilisco, municipio de Usulután Oeste, departamento de Usulután (ADCOSL); y la Asociación Administradora del Servicio de Agua Potable del Cantón Planes de San Sebastián, en el distrito de Nueva Guadalupe, municipio de San Miguel Oeste, departamento de San Miguel (ASADAGUAPS).

Las inversiones en los tres proyectos finalizados durante el año 2025 (ACACUVAN, ADESCOSAAB y ACASMA) totalizaron 357.000 €, de los cuales 299.000 € fueron aportados por el FCAS y 58.000€ como contrapartida de las JA, beneficiando a 2,027 hogares en los que habitan más de 7.003 personas, 2 centros de salud y 4 centros escolares.

En el distrito de Juayúa (Sonsonate) la inversión en el sistema de abastecimiento de la ACACUVAN alcanzó los 107.000 € (84.000 € financiados por el FCAS) beneficiando a 2.996 personas de 10 comunidades, y se centró en el suministro e instalación de 778 cajas para acometidas domiciliares con su respectivo micromedidor de agua (680 financiadas por el FCAS), además se instalaron un macromedidor y un dispositivo de cloración en la caja de entrada del tanque de distribución de agua del sistema. La intervención ha permitido a la JA transitar desde una tarifa fija hacia una facturación en función del consumo de agua de cada usuario, para lo que también se le brindó una asistencia técnica de cara a la elaboración del nuevo pliego y para la instalación y manejo de un nuevo sistema contable de facturación, con licencia gratuita, elaborado en el marco de la ejecución de este programa y con el que se han beneficiado hasta la fecha 21 JA. Ver noticia.

En la ADESCOSAAB del distrito de Santiago Nonualco (La Paz) la inversión del proyecto alcanzó los 112.000 € (100.000 € financiados por el FCAS) ofreciendo un nuevo servicio de abastecimiento para 120 hogares donde habitan 447 personas, y que se incorporan a las 174 hogares y 762 personas a las que hasta entonces brindaba servicio la JA. La intervención consistió en (i) el acondicionamiento y suministro e instalación del equipo electromecánico para la estación de bombeo donde se ubica el pozo profundo con el que contaba la JA, incluyendo el tren de descarga, el equipo de bombeo motor-bomba de 5 CV, un transformador de 25 kVA para la y la acometida de la subestación eléctrica y la extensión de la red de distribución eléctrica; (ii) la rehabilitación e impermeabilización del tanque de distribución de 56 m^3 ; (iii) la instalación de 120 cajas para acometidas domiciliares con su respectivo micromedidor de agua; (iv) el mantenimiento, limpieza y pruebas de presión en los 1.500 m de la tubería de impelencia. Ver noticia.

En el distrito de Suchitoto se invirtieron 138.000 € para la mejora sistema de abastecimiento de agua de la ACASMA, de los cuales 115.000 € mil fueron aportados por el FCAS, que beneficiaron a 2.798 personas de 955 hogares. El proyecto se enfocó en (i) el suministro, instalación, limpieza y pruebas de presión para 2,445 metros de tubería galvanizada (1.388 m de impelencia de Ø4 pulgadas y 1.057 de distribución de Ø2 y Ø4 pulgadas); (ii) la construcción y adecuación de un vivero con 1.150 plantas.

SLV-060-B
Construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del subsector de agua potable y saneamiento en el área rural. Fase II

En la fase II del programa los fondos ejecutados totalizaron 350.000 €, de los cuales 157.00 € se destinaron a infraestructura, 104.000 € al fortalecimiento institucional, 49.000€ al componente ambiental y 40.000 € a gestión y administración.

Esto ha permitido la rehabilitación de dos 2 sistemas de abastecimiento de agua a lo largo del 2025: el gestionado por la Asociación Administradora del Servicio de Agua Potable del Cantón Planes de San Sebastián, en el distrito de Nueva Guadalupe, municipio de San Miguel Oeste, departamento de San Miguel (ARAS) y el gestionado por la Asociación de Desarrollo Comunal Mil Cumbres, en el distrito de Panchimalco, municipio de San Salvador Sur, departamento de San Salvador (ADESCOMC). En conjunto, ambos sistemas abastecen a 533 hogares, en los que residen 1.566 personas.

Asimismo, se han llevado a cabo actuaciones de protección y conservación de los recursos hídricos del sistema de abastecimiento compartido por 5 juntas de agua del distrito de Candelaria de la Frontera, municipio de Santa Ana Oeste, departamento de Santa Ana. Estas juntas de agua son la Asociación Comunal Administradora del Sistema de Agua Potable, Salud y Saneamiento Bendición de Dios (ACASAPOSAB); la Asociación Comunal Administradora del Sistema de Agua Potable San Vicente, Caserío Paraje Galán (ACASAVPAG); la Asociación de Desarrollo Comunal Monte Verde (ADESCOMVER); la Asociación Comunal Administradora del Sistema de Agua de la Comunidad Lotificación Bolaños (ACASALOB) y la Asociación de Desarrollo Comunal Colonia Buenos Aires II (ADESCOBA II).Este sistema compartido abastece a un total de 4.987 personas.

SLV-061-B
Fortalecimiento de la gestión hídrica municipal y comunitaria

Durante el año 2025, la Alcaldía Municipal de Cuscatlán Norte realizó la contratación de la empresa española Vielca para iniciar con el Plan hídrico de Suchitoto en coordinación con la Autoridad Salvadoreña del Agua y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Con este proceso se reinicia en El Salvador las acciones de planificación hidrológica y que el MARN realizó en 2014. Ver noticia.

En materia de abastecimiento de agua potable se destaca el inicio de tres obras: la Asociación Rural de Agua y Saneamiento Comunidad El Barío (ARASCOBA) beneficiando a 890 personas y con una inversión de alrededor de 100.000 $. Ver noticia. la Asociación Rural de Agua y Saneamiento Apolinario Serrano (ARAS) beneficiando a 1.000 personas y con una inversión de alrededor de 100,000 $. Ver noticia. La Asociación Comunal Aguas del Tecomasuchi, cuyas obras beneficiaron a más de 6.900 personas, con una inversión de 85.000 $. También se firmó un convenio entre la Alcaldía Municipal de Cuscatlán Norte y la Asociación Rural de Agua y Saneamiento Haciendita (ARAH), para ejecutar en el 2026 otro proyecto de agua potable que beneficiará directamente a más de 2.200 personas. Ver noticia.

Por último, se trabajó en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil presentes en el territorio, se destaca la *Mesa Ciudadana Municipal de Agua y Fuego y de la red de juntas de agua (*AGUASUCHI).

Programas FCAS aprobados en 2025

SLV-063-B
Fortalecimiento del marco institucional del recurso hídrico en El Salvador incorporando los enfoques de cuenca, de género y de adaptación y mitigación frente al cambio climático

En abril de 2025, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el programa y cuenta con un presupuesto total de 4.375.000 €, de los cuales 3,5 M€ corresponden a una donación del FCAS y 875.000 € a la contrapartida del Gobierno de El Salvador.

El programa tiene como objetivo fortalecer la gobernanza del agua y avanzar hacia una gestión integrada, pública, transparente y participativa de los recursos hídricos en El Salvador, incorporando de manera transversal los enfoques de cuenca y de género, así como medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

Otros programas en ejecución

SLV-062-ALC
Fortalecimiento de las capacidades de las juntas de agua de El Salvador para el cumplimiento del marco legal y normativo del recurso hídrico garantizando su protección y preservación

Durante 2025 ha tenido lugar la finalización de la ejecución de este programa, con el que se reforzó el marco institucional de la gestión comunitaria del agua. Con la ASA se ha beneficiado a más de 400 Juntas de Agua rurales, impactando a 285.548 personas (152.197 mujeres y 133.351 hombres). El proyecto permitió fortalecer sus capacidades técnicas, legales y administrativas, contribuyendo a un modelo de gobernanza comunitaria alineado con la Ley General de Recursos Hídricos. Se desarrolló un sistema de medición del desempeño, y se recolectó información de más de 100 JA.

Ver noticia: La AECID, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la ASA presentan avances en la formalización y fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua



Guatemala

Programas FCAS en ejecución
• **GTM-019-B** *Fortalecimiento de la Gobernanza y Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Guatemala.* • **GTM-020-B** *Acceso a servicios públicos de agua, saneamiento y residuos sólidos urbanos sostenibles en el Lago Petén Itzá / TEI Petén Más Sostenible Componente II.*
Programas FCAS aprobados en el 2025
• **GTM-021-B. FASE II** Programa *RUK'U'X YA': Modelo De Gobernanza Y Sostenibilidad De Los Servicios De Agua Y Saneamiento Con Enfoque De Gestión Integral Y Territorial En La Cuenca Del Lago De Atitlán.*
Otro programas en ejecución
• **NDICI LA/2024/449-552** *Preservación y desarrollo sostenible de la cuenca del lago Petén Itzá y su zona de influencia*

FCAS en Guatemala

La cartera del FCAS en Guatemala es una de las más relevantes, tanto en número como en presupuesto global del Fondo, lo que supone una clara apuesta de la Cooperación Española por el país. Presenta un total de dieciséis programas, quince de ellos ejecutados de forma bilateral y uno ejecutado en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Todos ellos están enmarcados en la línea de Agua y Saneamiento del Marco de Asociación País correspondiente a la reducción de la desnutrición infantil.

Durante el año 2025 se ha trabajado con cinco programas bilaterales en ejecución o en fase de planificación con un presupuesto de 7,08M € y 1,93M € de contrapartida. Dentro de este presupuesto se encuentran dos programas enmarcados en la Operación Team Europe Initiative (Petén más Sostenible).

Adicionalmente está en proceso una cooperación técnica con el BID para reforzar la sostenibilidad de las actuaciones realizadas a través de programas previos.

El *Programa multilateral* aborda la mejora del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, urbanas y periurbanas en el país.

Los proyectos incorporan de manera integral las prioridades transversales de la cooperación española. En materia de género, promueve el empoderamiento de mujeres y niñas a través de su participación activa en la gestión del agua y la salud menstrual. Respecto a la diversidad cultural, integra conocimientos y prácticas ancestrales mediante la pertinencia cultural y las redes de mujeres. En derechos humanos, fortalece el acceso al agua y saneamiento como derecho fundamental.

Programas FCAS en ejecución

GTM-019-B
Fortalecimiento de la Gobernanza y Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Guatemala

Durante el año 2025, el programa ha registrado avances significativos en el ámbito técnico y de fortalecimiento institucional para la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH). Entre los principales logros destacan la conformación de las Mesas Técnicas de Cuenca para la cuenca del río San Pedro y la cuenca del río La Pasión, así como la elaboración de caracterizaciones y diagnósticos de ambas cuencas prioritarias. Asimismo, se desarrollaron estudios técnicos sobre descargas de aguas residuales, generando insumos estratégicos que constituyen una base sólida para la planificación de medidas de protección, conservación y saneamiento, así como para la futura elaboración de los Planes de Protección y Conservación de Cuencas.

Adicionalmente, se registraron progresos importantes en el fortalecimiento de instrumentos normativos para la GIRH, mediante la elaboración de documentos preliminares para la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico y la revisión y actualización del Normativo para el funcionamiento de las Mesas Técnicas. Estos productos estratégicos han requerido amplios procesos de elaboración técnica, revisión institucional, validación, talleres de socialización y generación de materiales divulgativos, contribuyendo al fortalecimiento institucional y de las capacidades estratégicas del sector hídrico en Guatemala. Los productos finales de estos instrumentos serán concluidos durante el año 2026.

GTM-020-B
Acceso a servicios públicos de agua, saneamiento y residuos sólidos urbanos sostenibles en el Lago Petén Itzá / TEI Petén Más Sostenible Componente II

La ejecución avanzó alineada con el objetivo general de garantizar el acceso de la población de la cuenca del lago Petén Itzá a servicios públicos sostenibles de agua, saneamiento y gestión de residuos, contribuyendo a la reducción de contaminantes y a la protección del ecosistema. En este marco, la implementación de Acción contra el Hambre, como parte de la Acción de España dentro de la TEI Petén más sostenible, a través de AECID y el FCAS, desempeñaron un papel clave en el desarrollo del Componente II.

En relación con el objetivo específico 1, se consolidaron avances técnicos mediante el acompañamiento a EMAPET, empresa municipal de agua y saneamiento de los municipios de Flores y San Benito, en la elaboración de diagnósticos y estudios para sistemas de agua y alcantarillado. Estos insumos sirven de base para las futuras inversiones en infraestructura sanitaria, incluyendo la ampliación de la red de alcantarillado y la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales y las estaciones de bombeo, con el fin de reducir las descargas de aguas residuales no tratadas al lago.

Respecto al objetivo específico 2, se fortaleció la coordinación interinstitucional y el enfoque mancomunado para la gestión de residuos sólidos, promoviendo la articulación entre municipalidades. Este trabajo es fundamental para desarrollar las capacidades necesarias para que la planta de tratamiento de residuos sólidos y disposición final que se va a construir en el proyecto sea sostenible. Asimismo, se identificaron oportunidades para fomentar iniciativas de economía circular y reducir la contaminación en la cuenca.

En cuanto al objetivo específico 3, se impulsó el fortalecimiento institucional de los prestadores de servicios, incluyendo diagnósticos para mejorar el desempeño de EMAPET y el análisis de capacidades de las Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento. También se promovió la integración de enfoques transversales como género, pertinencia cultural y salvaguardas, junto con el fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas, como mecanismo de transparencia.



Programas FCAS aprobados en el 2025

GTM-021-B. FASE II
Programa RUK'U'X YA': Modelo De Gobernanza y Sostenibilidad De Los Servicios De Agua Y Saneamiento Con Enfoque De Gestión Integral Y Territorial En La Cuenca Del Lago De Atitlán

El proyecto tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de la población y del ambiente en la cuenca del lago de Atitlán, mediante un enfoque de desarrollo sostenible, gestión integrada del recurso hídrico e intervención por microcuencas. La iniciativa surge como respuesta a los desafíos que enfrenta el departamento de Sololá en materia de agua y saneamiento, relacionados con la contaminación de fuentes hídricas, el funcionamiento limitado de plantas de tratamiento de aguas residuales, la débil gobernanza territorial y las limitadas capacidades técnicas y financieras de las municipalidades y comunidades para garantizar servicios sostenibles. En un territorio ambientalmente estratégico y vulnerable como la cuenca del Lago de Atitlán, el proyecto busca fortalecer la articulación interinstitucional, la planificación territorial y la protección de los recursos naturales, incorporando de manera transversal los enfoques de género, pertinencia cultural y sostenibilidad ambiental.

Durante el año 2025 se llevaron a cabo los procesos de planificación, coordinación y preparación técnica del proyecto, cuya fase de ejecución dará inicio en el año 2026.

Otro programas en ejecución

NDICI LA/2024/449-552
Preservación y desarrollo sostenible de la cuenca del lago Petén Itzá y su zona de influencia

La Cooperación Española participa en *Petén más sostenible*, una iniciativa de la agenda de inversiones Global Gateway del Equipo Europa (integrado por la Unión Europea, Alemania, España, Irlanda y Suecia), así como de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Su objetivo es vincular el desarrollo socioeconómico del departamento de Petén con la protección ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales.

La acción de España se articula a través del Convenio de Contribución NDICI LA/2024/449-552, centrado en la preservación y desarrollo sostenible de la cuenca del lago Petén Itzá y su zona de influencia. La intervención busca reforzar la planificación territorial y la gestión sostenible de la cuenca, apoyando a las instituciones locales en la actualización de instrumentos de ordenamiento territorial, planificación urbana y normativa para el uso del lago.

El proyecto incorpora un enfoque participativo e inclusivo, con especial atención a la igualdad de género, la participación de jóvenes, la pertinencia cultural y la implicación de actores locales. En 2025 se ha avanzado en la puesta en marcha de trabajos preparatorios, como la caracterización poblacional inclusiva y la línea base social, que permitirán orientar mejor las acciones del proyecto y facilitar su seguimiento.



Haití

Programas FCAS en ejecución
• **HTI-003-B** *Programa de Reforma e Inversiones en el sector de Agua Potable y Saneamiento*
Otros programas en ejecución
• **FED/2018/398-762** *Agua y Saneamiento (URBAYITI)*

FCAS en Haití

El trabajo del FCAS en Haití continúa orientado a la ampliación sostenible del acceso al agua potable y al saneamiento, así como al fortalecimiento institucional de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA). Durante 2025, la implementación del programa se ha visto fuertemente condicionada por la persistente situación de inseguridad del país, la movilidad restringida y las debilidades de las empresas ejecutoras.

En este contexto, en el que numerosos socios técnicos y financieros de la DINEPA han reducido o cesado su apoyo a Haití, conviene destacar el compromiso sostenido de la Cooperación Española, que continúa siendo uno de los principales aliados para la consolidación del sector. Aunque los avances son necesariamente graduales debido a la complejidad del contexto, el programa sigue contribuyendo al fortalecimiento institucional de la DINEPA, con un enfoque centrado en las poblaciones más vulnerables y en la consideración del agua y el saneamiento como una condición habilitante para el desarrollo del país.

Teniendo en cuenta el complejo contexto del país, en 2024 se decidió priorizar una serie de actuaciones para asegurar su adecuada finalización, dejando en suspenso el inicio de parte de las actividades planificadas hasta que se produzca una mejora de la situación del país. En el último trimestre de 2025 se ha redefinido la estrategia de cierre del programa, pasando a analizar posibles escenarios de continuidad en coordinación con la DINEPA, que deberán concretarse a lo largo de 2026.

Programas FCAS en ejecución

HTI-003-B
Programa de reforma e inversiones en el sector de agua potable y saneamiento

Entre enero y diciembre de 2025 el programa ha avanzado principalmente en la consolidación y el cierre técnico-administrativo de actuaciones ya iniciadas.

En relación con las infraestructuras, el avance general de las obras ha sido desigual, con retrasos recurrentes derivados tanto de la situación de inseguridad como de las limitaciones técnicas y de capacidad de las empresas contratistas.

En Jérémie, las obras avanzan aproximado del 70%, con previsión de finalización en 2026. En Cabo Haitiano, el Lote 2 alcanza un 95% de ejecución, quedando pendiente su recepción provisional y cierre. En Miragoâne, las obras han finalizado, encontrándose pendientes únicamente de la recepción definitiva tras la verificación del correcto funcionamiento de la instalación.

En Hinche, la obra continúa su ejecución con avances limitados y problemas técnicos recurrentes, que han ido siendo gestionados con el apoyo de la supervisión. En Fort Liberté, tras varios modificados y dificultades económicas por parte del contratista, se han producido paralizaciones puntuales que están afectando al cumplimiento de los resultados previstos. Otros proyectos, como Saint Louis du Nord y Petit Goâve, presentan avances lentos y requieren modificaciones contractuales previstas para 2026.

La estación de tratamiento de excretas de Limonade mantiene un avance del 60%, viéndose afectada por problemas logísticos y de desempeño de la supervisión, lo que ha llevado a posponer su finalización a 2026.

La imposibilidad de acceso a las ciudades de Cabaret y Arcahaie debido a la situación de inseguridad ha obligado a la rescisión anticipada de dos de las principales obras del Programa.

En paralelo, las actividades de ingeniería social han seguido acompañando las actuaciones de agua potable mediante campañas de sensibilización dirigidas a la población, con el fin de favorecer la apropiación social y la correcta ejecución de los trabajos.

En el ámbito de la gobernanza y el fortalecimiento institucional, las actuaciones destinadas a reforzar las capacidades operativas de la DINEPA mediante la dotación de infraestructuras y equipamientos también registran avances. Entre ellas, destacan las obras de dos edificios administrativos para que la DINEPA pueda trabajar en unos espacios comunes adecuados, actualmente en ejecución, aunque con un ritmo de avance más lento de lo previsto. Otras actividades con la misma finalidad han debido replantearse o permanecen en suspensión como consecuencia de la adaptación de la estrategia y de las limitaciones derivadas del contexto general del país.

Asimismo, se han registrado avances en la organización documental del Programa por parte de la DINEPA, como fase preparatoria para su justificación y cierre, si bien aún queda trabajo por completar.

En relación con la estrategia de sostenibilidad, el enfoque comercial del servicio de agua ha evolucionado hacia un modelo adaptado al contexto operativo, priorizando la gestión remota, el seguimiento reforzado y el uso de herramientas de videoconferencia, debido a las restricciones de movilidad terrestre y aérea.



Otros programas en ejecución

FED/2018/398-762
Agua y saneamiento (URBAYITI)

Este programa cuenta con una financiación total de 4 M€, de los que 1 M€ corresponde a una donación de España, a través del Fondo del Agua, y 3 M€ corresponden a fondos delegados por la UE. *URBAYITI* se fundamenta en el principio de coordinación entre donantes y la elección de España para realizar la gestión debido a que es uno de los principales donantes del sector de agua y saneamiento en el país, generando una estrecha relación con la DINEPA. El objetivo es fortalecer la resiliencia de las ciudades y las poblaciones urbanas mejorando el acceso a los servicios básicos y creando las condiciones para un suministro de agua y saneamiento compatible con el enfoque de desarrollo integrado en la zona. Las actividades del proyecto se concentran en las ciudades de Jérémie y Les Cayes y en menor medida en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Se espera que la intervención facilite el acceso al agua a 22.500 personas en Les Cayes y 2.640 en Jérémie, gracias a la rehabilitación del depósito de Savane, la rehabilitación y ampliación de las redes secundarias existentes, y la implementación del sistema de condominial en Les Cayes. La implementación de un sistema de agua potable en condominial representa una gran innovación, inspirada en el modelo brasileño de los años 80. Este sistema, adaptado a zonas urbanas densamente pobladas y económicamente desfavorecidas, trata a cada grupo de viviendas como una sola entidad, conectada a una red principal de agua potable, y promueve un enfoque social y comunitario. En materia de saneamiento, está prevista la construcción de siete bloques sanitarios en espacios públicos en Puerto Príncipe. Además, se fortalecerá la gestión del servicio de tratamiento de aguas residuales en Les Cayes. El proyecto también incluye acciones de ingeniería social y fortalecimiento en la gestión, uso y mantenimiento de los sistemas.



Honduras

Programas FCAS en ejecución
• **HND-018-B** *Proyecto de agua y saneamiento en el Valle de Comayagua. Fase complementaria.* • **HND-019-B** *Programa de optimización de los sistemas de agua potable y saneamiento de la ciudad de Choluteca.* • **HND-020-B** *Mejora de la gestión del recurso hídrico de las microcuencas productoras de agua y mejora de servicio de agua potable y saneamiento en zonas periurbanas y rurales del municipio de Siguatepeque.* • **HND-024-B** *Mejora al acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservación integral del recurso hídrico, en el corredor Lenca de Honduras.*
Otros programas en ejecución
• **HND-022-ALC** *Mejora en la prestación de servicios de agua y saneamiento en las zonas urbanas, rurales y periurbanas de los municipios de La Esperanza e Intibucá y mejora de la gestión del recurso hídrico.* • **HND-021-ALC** *Programa de mejora de gestión del recurso hídrico en Aguas de la Sierra de Montecillos y concienciación y educación ambiental ciudadana en los municipios de Comayagua, Lejamaní y Ajuterique.* • **HND-023-ALC** *Fortalecimiento de la sostenibilidad del servicio de agua potable en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Santa Rosa de Copán.*

FCAS en Honduras

El Fondo del Agua ha desarrollado una amplia labor en Honduras, actuando en el ámbito municipal con el propósito de mejorar los servicios de agua y saneamiento en entornos rurales, periurbanos y urbanos. Entre sus principales líneas de actuación, ha impulsado el fortalecimiento de las capacidades de los pequeños operadores, con especial atención a la Gestión Integrada del Recurso Hídrico en el contexto de las microcuencas.

Asimismo, se ha promovido un importante componente de coordinación entre distintos actores y niveles, incluyendo la cooperación intermunicipal, la participación de la sociedad civil y la colaboración de operadores españoles mediante diversas iniciativas de cooperación técnica.

Ver entrevista: AECID Honduras (@AECID_Honduras) en X

Programas FCAS en ejecución

HND-018-B
Proyecto de agua y saneamiento en el Valle de Comayagua. Fase complementaria

El programa, orientado a fortalecer los servicios de agua potable y saneamiento en el Valle de Comayagua, con un presupuesto de 2.128.910,81 €, concluyó en agosto de 2024 tras 49 meses de implementación.

Como parte de las actividades de cierre, en febrero de 2025 se desarrolló el taller de cierre del programa, espacio en el que se presentaron los resultados de la evaluación final, destacándose el cumplimiento de los objetivos y resultados previstos por la intervención.

HND-019-B
Programa de optimización de los sistemas de agua potable y saneamiento de la ciudad de Choluteca

Este programa cuenta con un presupuesto 2.178.117 € y un período de ejecución hasta marzo de 2027. Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población mediante el incremento de la cobertura y la mejora de los servicios de agua potable y saneamiento de la ciudad de Choluteca Durante el año 2025, entre los principales avances destacan el desarrollo de estudios y diseños para mejorar el sistema de captación de agua potable, incluyendo evaluaciones técnicas complementarias para identificar las alternativas más viables para garantizar un abastecimiento más seguro y sostenible para la población.

Asimismo, el programa avanzó en los procesos de contratación de la construcción de obras de saneamiento de la ciudad. A su vez, se dio seguimiento al proceso de obtención de la licencia ambiental para las obras de y saneamiento.

Otro aspecto relevante durante el año fue el fortalecimiento de las acciones relacionadas con la calidad del agua. En este marco, se promovió la conformación de una Mesa Técnica Intersectorial de Calidad de Agua integrada por diferentes instituciones vinculadas al sector agua y salud, con el objetivo de fortalecer el monitoreo y seguimiento de la calidad del agua suministrada a la población de Choluteca.

En el componente de fortalecimiento institucional, se desarrolló un diagnóstico del prestador Aguas de Choluteca, permitiendo identificar oportunidades de mejora en aspectos técnicos, operativos y financieros. Además, se impulsaron acciones orientadas a fortalecer la operación y mantenimiento de los sistemas, incluyendo procesos para la adquisición de equipos y asistencia técnica especializada.

De igual forma, el programa continuó avanzando en acciones vinculadas a la Gestión Integral del Recurso Hídrico, mediante la preparación de campañas de sensibilización orientadas a promover el uso responsable y la protección de las fuentes de agua.

HND-020-B
Mejora de la gestión del recurso hídrico de las microcuencas productoras de agua y mejora de servicio de agua potable y saneamiento en zonas periurbanas y rurales del municipio de Siguatepeque

Este programa cuenta con un presupuesto de 3.276.032,62 € y tiene como objetivo garantizar servicios de agua potable y saneamiento de calidad, así como la protección de las microcuencas del municipio. El programa tiene como fecha prevista de finalización noviembre de 2027 y ha continuado durante 2025 con la ejecución de acciones en los tres componentes.

En el componente de infraestructura, el programa avanzó en procesos técnicos relacionados con la preparación de documentos base para futuras obras de agua potable y saneamiento en los sectores Norte, Púran y Guaratoro, así como en actividades vinculadas a supervisión de obras, trámites ambientales y gestión de terrenos requeridos para pozos, tanques de almacenamiento y futura planta potabilizadora. Asimismo, se dio continuidad a la consultoría para la identificación y evaluación de nuevas fuentes de abastecimiento, incorporando análisis técnicos orientados a garantizar alternativas sostenibles y escalables para el suministro de agua en el municipio.

En el ámbito ambiental y de gestión del recurso hídrico, se registraron avances importantes mediante la finalización de consultorías para la elaboración de Planes de Ordenamiento y Manejo Integral de las microcuencas Calán, Guaratoro y Chamalacuara, instrumentos orientados a fortalecer la protección y manejo sostenible de las fuentes de agua que abastecen a la población. Además, estos procesos incluyeron actividades de socialización y coordinación con actores locales, Junta Directiva de Aguas de Siguatepeque y autoridades municipales, promoviendo un enfoque de seguridad hídrica y sostenibilidad de largo plazo.

HND-024-B
Mejora al acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservación integral del recurso hídrico, en el corredor Lenca de Honduras

Tiene como propósito contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades pertenecientes a la mancomunidad MANCURISJ. Cuenta con un presupuesto de 4.299.694,60 € y finalizará en 2028.

Entre los principales avances destacan la formulación del Plan Operativo General y del Plan Operativo Anual del primer año, documentos necesarios para orientar la ejecución futura de las intervenciones previstas en materia de agua potable, saneamiento y fortalecimiento institucional.

Como parte de este proceso, se desarrollaron análisis de viabilidad técnica de los proyectos planteados inicialmente en la formulación del programa, con el acompañamiento de instituciones del sector como el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA). Estas evaluaciones incluyeron distintas alternativas para sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento en varias comunidades priorizadas, así como visitas de campo para validar las condiciones técnicas de las intervenciones propuestas.

Asimismo, se avanzó en los procesos de contratación para diagnósticos incluyendo análisis de viabilidad ambiental, diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento en los municipios de la MANCURISJ, y la contratación de consultorías para estudios de factibilidad social, institucional, legal y económica.

Durante el período también se desarrolló la conformación parcial del Equipo de Gestión.

Programas FCAS aprobados en 2025

Por otro lado, en el año 2025 el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó nuevas contribuciones para Honduras orientadas a fortalecer los servicios de agua potable, saneamiento y gestión del recurso hídrico en distintas regiones del país.

Entre los nuevos programas destaca la aprobación de una contribución de 1 M€ para la Alcaldía Municipal de Trujillo, destinada al programa *Mejora del servicio de agua y saneamiento en las áreas urbana y periurbanas del municipio de Trujillo*. La iniciativa busca fortalecer el acceso y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades urbanas y periurbanas del municipio.

Asimismo, se aprobó una contribución de 2 M€ para la Asociación de Municipios del Lago de Yojoa y su Área de Influencia (AMUPROLAGO), orientada al desarrollo del programa *Manejo integral del recurso hídrico y el saneamiento, con enfoque de sostenibilidad ambiental, gobernanza, derechos y género* en las microcuencas de Varsovia, La Pita y Horconcitos, en la zona del Lago de Yojoa. Ver noticia: España financiará proyectos de Municipios del Lago de Yojoa (radioamerica.hn)

De igual forma, se aprobó una contribución de 720.000 € para el SANAA, destinada al programa *Fortalecimiento de la institucionalidad pública y de las entidades reguladoras y de asistencia técnica en materia de agua y saneamiento en Honduras*, con el objetivo de fortalecer capacidades institucionales y de asistencia técnica en el sector agua y saneamiento a nivel nacional.



Otros programas en ejecución

HND-022-ALC
Mejora en la prestación de servicios de agua y saneamiento en las zonas urbanas, rurales y periurbanas de los municipios de La Esperanza e Intibucá y mejora de la gestión del recurso hídrico

Este programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población mediante el fortalecimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, así como la protección del recurso hídrico. Su ejecución está a cargo de la ONG World Vision Honduras.

Entre los principales hitos destaca la aprobación del plan de trabajo el 29 de enero y la posterior aprobación del Plan Operativo General y del Plan Operativo Anual 1 en agosto de 2025. Durante el período se avanzó en la conformación del Equipo de Gestión.

En el componente de fortalecimiento institucional se avanzó en la preparación del diagnóstico del prestador Aguas de La Esperanza e Intibucá, incluyendo el desarrollo de un *taller FODA* (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) para analizar su situación actual.

Durante el año también se desarrollaron actividades de inducción y coordinación técnica para la elaboración de los documentos operativos del programa, así como un *taller de arranque* con participación de World Vision Honduras, los municipios involucrados, Tragsatec y el FCAS.

HND-021-ALC
Programa de mejora de gestión del recurso hídrico en Aguas de la Sierra de Montecillos y concienciación y educación ambiental ciudadana en los municipios de Comayagua, Lejamaní y Ajuterique

Este programa tiene como objetivo fortalecer la gestión técnica de Aguas de la Sierra de Montecillos (ASM) e impulsar procesos de sensibilización ambiental en el territorio y cuenta con una asignación de 210.000 € a la Municipalidad de Comayagua como complemento del programa *HND-018-B*, enmarcadas en un hermanamiento entre la EMASESA y ASM. Durante el año 2025, concluyó el proceso de cooperación técnica entre ambas empresas.

El proyecto estuvo orientado al fortalecimiento técnico, comercial, operativo y administrativo de ASM, prestador que brinda servicio a aproximadamente 43.000 habitantes de los municipios de Comayagua, Ajuterique y Lejamaní, en el Valle de Comayagua.

Durante la ejecución del programa se desarrollaron actividades de capacitación y asistencia técnica en áreas como reducción de pérdidas de agua, optimización del catastro, planificación de inversiones, fortalecimiento institucional y sensibilización comunitaria. Asimismo, se implementó un sistema de telemetría y monitoreo SCADA para fortalecer el control y operación de los sistemas de agua potable.

Como parte del cierre técnico del programa, en septiembre de 2025 se realizó una misión de evaluación final que incluyó visitas a infraestructuras, pruebas del sistema de telemetría, reuniones técnicas con personal de ASM y actividades de intercambio de experiencias con otros operadores del sector agua en Honduras.



HND-023-ALC
Fortalecimiento de la sostenibilidad del servicio de agua potable en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Santa Rosa de Copán

Durante 2025 se autorizó una ampliación de seis meses debido a que, durante la puesta en marcha de la presa La Hondura (programa *HND-017-B*, finalizado en 2023), se detectó una acumulación acelerada de sedimentos que hacía necesario profundizar en el análisis de los procesos de sedimentación y de la estabilidad de los taludes de la microcuenca. La realización de estos estudios complementarios permitirá definir medidas correctoras adecuadas y asegurar la sostenibilidad, seguridad y correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua a largo plazo.



México

Programas FCAS en ejecución
MEX-002-B *Programa de mejora del acceso de servicios de agua potable y saneamiento en localidades rurales en el municipio de Tekax, Yucatán.*

FCAS en México

Durante el año 2025, el FCAS ha continuado su colaboración con las instituciones mexicanas para promover el acceso sostenible al agua potable y al saneamiento en comunidades en situación de mayor vulnerabilidad, incorporando un enfoque basado en los derechos humanos y la participación comunitaria.

La actividad del Fondo se ha centrado principalmente en el desarrollo del programa de mejora del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales indígenas del municipio de Tekax, en el estado de Yucatán. Esta intervención que destaca por la incorporación de un proceso de consulta con las comunidades beneficiarias de la mano del Programa Indígena de la AECID y por su potencial para generar aprendizajes aplicables a futuras actuaciones en contextos indígenas.

Paralelamente, durante 2025 se ha avanzado en la pre-identificación de una posible segunda fase para este programa, que será presentada a lo largo del 2026, de cara a ampliar el alcance de estas actuaciones a otras comunidades indígenas vulnerables, extendiendo las lecciones aprendidas de este programa junto con el *Programa Indígena*.



Programas FCAS en ejecución

MEX-002-B
Programa de mejora del acceso de servicios de agua potable y saneamiento en localidades rurales en el municipio de Tekax, Yucatán

Este programa busca avanzar en la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento, dotando a la población de 10 comunidades rurales indígenas del municipio de Tekax de un acceso seguro a servicios de agua y saneamiento que contribuya a mejorar la salud de sus habitantes.

La intervención se desarrolla en estrecha coordinación con el *Programa Indígena* de la AECID, que aporta adicionalmente 80.000 € para reforzar el enfoque de derechos de los pueblos indígenas y su participación en el proyecto. Esta actuación, ejecutada por el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA), busca fortalecer la inclusión social, la participación efectiva y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito del agua y el saneamiento. Para ello, contempla la realización de un diagnóstico específico y el desarrollo de un proceso de consulta, cuyos resultados permitirán extraer recomendaciones y lecciones aprendidas aplicables a futuras intervenciones del FCAS con pueblos indígenas, tanto en México como en otros países de la región.

En paralelo, el programa contempla la construcción y rehabilitación de las infraestructuras necesarias para garantizar la disponibilidad y calidad del agua en las viviendas, asegurando el acceso a cantidades suficientes de agua apta para el consumo humano. Asimismo, en materia de saneamiento, se están instalando sistemas que permiten una evacuación y un tratamiento seguros de las aguas residuales domésticas, contribuyendo a la protección de la salud pública y del medio ambiente.

La sostenibilidad de las actuaciones se refuerza mediante el fortalecimiento de las capacidades de los comités comunitarios responsables de la gestión de los sistemas, que reciben formación y acompañamiento para garantizar una adecuada operación y mantenimiento de las infraestructuras a largo plazo.

Ver noticia: Consulta de la AECID a las comunidades indígenas de Tekax sobre las obras de agua potable y saneamiento - aecid.es



Nicaragua

Programas en ejecución
• **LA/2019/411-582** *Mejora del servicio de agua potable en el sector de Altamira- Managua, con enfoques de sostenibilidad y equidad.*
Programas aprobados en 2025
• **700004178** *Mejoramiento del acceso al agua y saneamiento rural y semi rural en la cuenca alta del río Coco.*

FCAS en Nicaragua

El FCAS en Nicaragua ejecuta proyectos desde el año 2013, teniendo como socio principal a Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), entidad estatal en Nicaragua encargada de administrar, operar y expandir los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel nacional, implementando programas y proyectos en el sector de agua y saneamiento. España ha sido uno de los principales donantes en Nicaragua en esta materia. AECID ha desarrollado un fuerte liderazgo en el sector en el país a través del apoyo al *Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH)* desde el FCAS y gestionando recursos financieros de la Unión Europea (LAIF-PISASH) por 50 M€.

Programas en ejecución

LA/2019/411-582
Mejora del servicio de agua potable en el sector de Altamira-Managua, con enfoques de sostenibilidad y equidad

Este programa tiene como propósito avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible y en correspondencia con los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de ENACAL. El importe total de este proyecto es de aproximadamente 18,76 M€, de los que la UE aporta 10 M€ delegados a AECID (incluidos los gastos de gestión del programa), y el BID el monto restante a través de un préstamo (otros 8,76 M€ aproximadamente).

El proyecto objeto del Convenio de Contribución es ejecutado por ENACAL y forma parte del Plan para la Reducción del Agua No Facturada en Managua. Se desarrolla en una de las cuatro delegaciones en las que está dividida la operación del sistema de agua potable en esta ciudad, conocida como Delegación de Altamira, con el objetivo de establecer un nuevo modelo de gestión sectorizado, descentralizado y eficiente que pueda extenderse a futuro a todas las otras delegaciones de Managua. La gestión del proyecto se realiza desde la Gerencia de Proyectos e Inversiones de ENACAL, en coordinación con la Delegación de Altamira. La primera fase del proyecto, hasta mediados del año 2022, estuvo dedicada a resolver la contratación de los dos grandes contratos de ingeniería encargados de realizar las mejoras constructivas sobre el sistema de agua potable de Altamira y de su modelización hidráulica. Con la aprobación del modelo hidráulico comenzó la fase de obras, prolongándose durante todo el 2024 y parte del 2025.

Ver noticia: Avanzan las obras en el mejoramiento del servicio de agua potable en el sector Altamira – Managua - aecid.es

Programas aprobados en 2025

700004178
Mejoramiento del acceso al agua y saneamiento rural y semi rural en la cuenca alta del río Coco

A finales de 2025, la Unión Europea aprobó una nueva cooperación delegada para España, gestionada a través de la AECID para el *Mejoramiento del acceso al agua y saneamiento rural y semi rural en la cuenca alta del Río Coco*. Esta contribución tiene una aportación de 8,9 M€ y forma parte de la fase II del Proyecto *Alianzas Estratégicas Locales para la Adaptación al Cambio Climático*.

El objetivo es contribuir a la adaptación de la población vulnerable del Corredor Seco de Nicaragua a los efectos del Cambio Climático, especialmente en cuanto al acceso al agua y la gestión integrada de recursos hídricos. Para ello, se trabajará para mejorar y ampliar la infraestructura de abastecimiento de agua, saneamiento y captación de agua, con base en la GIRH promoviendo la diversidad cultural, la equidad de género y la inclusión en la Cuenca Alta del Río Coco.

El área de la intervención se ubica en la parte alta de la cuenca del Río Coco una zona que alberga población indígena Chorotega y donde existen unas altas tasas de pobreza.



Panamá

Programas FCAS en ejecución
• **PAN-009-B** *Programa de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales e Indígenas de Panamá, con énfasis en Gestión Local.* • **PAN-010-B** *Elaboración participativa y difusión de la Guía Nacional para la selección de tecnologías de tratamiento de aguas residuales.*
Otros programas en ejecución
Programa de Saneamiento de los distritos de Arraiján y La Chorrera

FCAS en Panamá

Durante el año 2025, se han ejecutado en Panamá dos programas. El primero tiene como objetivo incrementar el acceso y la calidad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales e indígenas del país. El segundo tiene como objetivo contribuir a la implementación de la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento para la República de Panamá y es una iniciativa de fortalecimiento institucional.

Programas FCAS en ejecución

PAN-009-B
Programa de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales e Indígenas de Panamá, con énfasis en Gestión Local

El ámbito de intervención de este programa es la comarca Ngäbe-Buglé, situada al noroeste del país y que cuenta con una población mayoritariamente indígena y con altos niveles de pobreza, donde se encuentran las principales brechas de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento.

Las zonas específicas de actuación son zonas rurales dispersas, alejadas y de difícil acceso, especialmente en época de lluvias, lo que supone un reto adicional para el seguimiento de la ejecución y para la puesta en marcha los servicios. El importe total de la iniciativa es de 10,35 M€, de los cuales el 50% corresponde a una donación del FCAS y el otro 50% a financiación aportada por el Gobierno de Panamá. Se estima que, una vez concluidas todas las acciones, el programa beneficiará a 5.900 personas aproximadamente.

Durante el año 2025 se ha trabajado en la ejecución de los contratos de obra correspondientes al distrito de Kankintú, y finalizando las actuaciones en el distrito de Munä. De las intervenciones que se están realizando en Kankintú, continúan en ejecución las acciones en Becativí-Morodoni, Nutiví Occidente, Nutiví Centro y Gobrante. No obstante, las actuaciones relativas a infraestructura acumulan muchos retrasos y se está trabajando con las autoridades panameñas para que adopten las medidas necesarias para poder completar la totalidad de las obras antes de la finalización de la intervención. En el proyecto de Munä, que comprende una línea de aducción de 18 km aproximadamente y del que se beneficiarán 365 familias en 5 comunidades, se ha finalizado la construcción de una nueva captación, al haber sido afectada la captación anterior por un deslizamiento de tierras, y se ha culminado la instalación del bombeo fotovoltaico de Llano Majagua, que dará servicio a las comunidades situadas en áreas más elevadas.



Vista general del bombeo fotovoltaico de Llano Majagua

Asimismo, el programa continúa promoviendo el fortalecimiento institucional y el refuerzo a la sostenibilidad en la provisión de servicios de agua y saneamiento. En este sentido, se continúa trabajando con las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAARs), que son las en cargadas de la gestión de los servicios, en aspectos legales y administrativos, de gestión

y operativos. En Panamá, las JAARs se constituyen con personal de las comunidades, y son corresponsables junto al Estado panameño de la administración, operación, mantenimiento y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable rural, en virtud del Decreto Ejecutivo nº1839/2014. Además, se han llevado a cabo acciones de sensibilización comunitaria en diversas comunidades, en temas relacionados con el cuidado y la gestión del agua, así como el impulso de la participación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones. Por otra parte, se ha continuado trabajando en el levantamiento de información para el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) de las comunidades de la Comarca Ngäbe-Buglé, que se está realizando en el marco del programa, alcanzando en 2025 a un total de 311 comunidades.

El *SIASAR Global* es una iniciativa conjunta iniciada por los gobiernos de Honduras, Nicaragua y Panamá que posteriormente se ha extendido a otras regiones. El objetivo es contar con una herramienta de información básica, actualizada y contrastada sobre los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento rural existente en un país, la cual facilita la planificación y la priorización de intervenciones.



En la parte frontal de la imagen, baño previo de la vivienda. En la parte posterior de la imagen, Unidad Sanitaria construida en el marco del programa PAN-009-B

PAN-010-B
Elaboración participativa y difusión de la Guía Nacional para la selección de tecnologías de tratamiento de aguas residuales

El programa es una iniciativa de fortalecimiento institucional que tiene como objetivo contribuir a la implementación de la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento para la República de Panamá, a través de dos objetivos específicos:

- Favorecer la gestión integral del recurso hídrico, garantizando su protección y preservación.
- Contribuir a reforzar el sistema institucional de la República de Panamá para una adecuada gestión del sector agua que favorezca la gestión pública transparente y participativa del recurso.

Éste es un programa de carácter estratégico, de ámbito nacional y con aporte en especie por un importe total de 250.000 € (aportados al 50% entre el Gobierno de Panamá y el FCAS). La entidad ejecutora del mismo es el Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá y a lo largo del año 2025 se ha finalizado la elaboración de los capítulos de la Guía. La Guía ha tenido un estrecho acompañamiento por parte de un equipo técnico conformado por personal de diferentes instituciones panameñas (como el MINSA, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), el Programa de Saneamiento de Panamá, el Ministerio de Ambiente, la Contraloría, y otras instituciones con atribuciones sectoriales). Para este trabajo se ha contado también con la asistencia técnica del CEDEX. Los avances han sido validados en misiones conjuntas del equipo consultor y personal del CEDEX, y a través de reuniones del Comité Nacional Interinstitucional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (CIAPAS), creado como mecanismo de coordinación con otras entidades gubernamentales u organismos no gubernamentales que participen en la promoción, financiamiento o construcción de sistemas de suministro de agua potable y alcantarillado sanitario, en virtud del Decreto Ejecutivo nº 441/2008.

Ver noticia: Soluciones sostenibles para aguas residuales en Panamá I CEDEX

Otros programas en ejecución

Programa de Saneamiento de los distritos de Arraiján y La Chorrera

El programa constituye una de las principales operaciones de saneamiento impulsadas en Panamá en los últimos años. La intervención responde al rápido crecimiento urbano y demográfico experimentado por ambos distritos, situados en el entorno metropolitano de Ciudad de Panamá, donde históricamente el acceso a servicios de saneamiento ha sido insuficiente.

La operación cuenta con financiación de distintas instituciones financieras internacionales, entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Europeo de Inversiones. Por su parte, FEDES aporta financiación reembolsable destinada a la construcción de infraestructuras clave del sistema de tratamiento de aguas residuales.

Aunque esta operación no cuenta con financiación directa del FCAS, tanto la Oficina de la Cooperación Española en Panamá como la Oficina del Fondo del Agua han continuado prestando apoyo técnico y acompañamiento institucional al proyecto, incluyendo la incorporación del enfoque de género y la colaboración técnica especializada con el CEDEX.

Durante 2025 continuaron los avances en la ejecución de las infraestructuras previstas, especialmente en las instalaciones vinculadas al sistema de bombeo, tratamiento y desinfección de aguas residuales.



Paraguay

Programas FCAS aprobados en el 2025
PRY-015-B *Alternativas de captación y almacenamiento de agua para mejorar la disponibilidad y la gestión integrada del recurso hídrico en el Chaco paraguayo.*
Otros programas en ejecución
• *Programa de Agua Potable y Saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas* • **LA/2020/418-404** *Agua y saneamiento para el área metropolitana de Asunción, cuenca de Lambaré*

FCAS en Paraguay

El año 2025 ha estado marcado no solo por el avance de los programas en ejecución, sino también por el impulso de nuevas iniciativas estratégicas para el sector de agua y saneamiento en Paraguay. En este contexto, se han llevado a cabo trabajos de identificación que han dado lugar al programa *Alternativas de captación y almacenamiento de agua para mejorar la disponibilidad y la gestión integrada del recurso hídrico en el Chaco paraguayo*, una intervención orientada a fortalecer la seguridad hídrica y la resiliencia de las comunidades del Chaco paraguayo frente a los efectos de la sequía y la variabilidad climática.

La actuación del FCAS se desarrolla en estrecha coordinación con las instituciones paraguayas responsables del sector, especialmente con el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) y la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN), contribuyendo tanto a la ampliación de la cobertura de los servicios como al fortalecimiento institucional y la sostenibilidad de las intervenciones.

Durante 2025 han continuado los avances en la ejecución de los programas en curso y se ha seguido impulsando la operación de agua y saneamiento para el Área Metropolitana de Asunción – Cuenca Lambaré, una de las mayores inversiones del sector en el país, desarrollada en colaboración con el BID, la Unión Europea y la Cooperación Española.

Programas FCAS aprobados en el 2025

PRY-015-B
Alternativas de captación y almacenamiento de agua para mejorar la disponibilidad y la gestión integrada del recurso hídrico en el Chaco paraguayo

Mediante Resolución de 1 de diciembre de 2025 se aprobó una subvención destinada a mejorar la captación, almacenamiento, aprovechamiento y gestión del agua del Chaco Paraguay, enfocándose en la comunidad indígena Campo Largo, del Departamento de Presidente Hayes y la comunidad indígena Campo Alegre, del Departamento de Boquerón, ambas en la región occidental del país. La intervención busca fortalecer la resiliencia ante el cambio climático y la sequía extrema, mediante la implementación de sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia en los acuíferos localizados en los paleocauces. Además, el proyecto prevé la promoción de la cultura del agua mediante la capacitación a las comunidades locales en el manejo sostenible de los recursos hídricos y un monitoreo para evaluar el comportamiento, el crecimiento y la mejoría en calidad de agua subterránea en los paleocauces, así como la capacitación en manejo de las instalaciones a las comunidades.

Otros programas en ejecución

Programa de Agua Potable y Saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas

En Paraguay continuó desarrollándose el cofinanciado junto al BID y orientado a mejorar el acceso a servicios básicos en zonas rurales y comunidades indígenas.

Esta operación da continuidad al trabajo previamente impulsado por el FCAS incorporando las lecciones aprendidas y manteniendo el enfoque prioritario en poblaciones rurales y en situación de vulnerabilidad. El programa combina inversiones en infraestructura con fortalecimiento comunitario, sostenibilidad de los servicios y apoyo institucional.

La operación se articula, además, con financiación reembolsable de la Cooperación Española, a través de FEDES.

LA/2020/418-404
Agua y saneamiento para el área metropolitana de Asunción, cuenca de Lambaré

El programa constituye una de las principales operaciones de inversión en saneamiento urbano en Paraguay. Se trata de una operación combinada, que integra cooperación delegada de la Unión Europea y financiación reembolsable, movilizando más de 160 M€ para mejorar las infraestructuras de agua y saneamiento, contribuir a la recuperación ambiental de la cuenca y reforzar la sostenibilidad de los resultados.

La Unión Europea contribuye con una donación de 10,51 M€ a través del programa LACIF, a la que se suma una donación de 1,14 M€ de AECID. La operación se completa con financiación reembolsable procedente de FEDES por 54,43 M€, y del BID, por 95,26 M€.

La entidad ejecutora es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DGSA), mientras que la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) será la entidad receptora de las infraestructuras y la principal beneficiaria de los fondos de donación, entre los que se incluye también la mejora de la red de abastecimiento de agua potable.

Esta intervención, que forma parte de la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea, contribuirá a mejorar la calidad de vida de más de 300.000 personas en la Cuenca de Lambaré, garantizando el acceso de la población al saneamiento y promoviendo la participación comunitaria. Entre las principales actuaciones previstas destacan una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, un emisario subfluvial, 15 estaciones de bombeo y aproximadamente 800 km de redes de saneamiento.

Durante 2025, la actividad principal en materia de saneamiento ha sido el levantamiento de la línea de base para la identificación de los hogares en situación de vulnerabilidad, garantizando la incorporación de la perspectiva de género mediante la inclusión de variables como la privacidad de servicios en edades menstruantes o la presencia de mujeres en la jefatura de hogares monomarentales. Así, se identificaron un total de 793 hogares, de los cuales, a 673 se beneficiarán de conexiones intradomiciliarias y 120 serán beneficiados con soluciones individuales no convencionales.

Asimismo, se ha trabajado en el fortalecimiento de la entidad receptora de las obras, mediante la firma de los convenios marco y específico entre ESSAP y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). En este primer año de ejecución efectiva cabe destacar el proceso de apropiación del proyecto por parte de ESSAP.

En materia de agua potable, teniendo en cuenta que la red de agua potable de ESSAP en Lambaré no está sectorizada, siendo susceptible toda la red ante cualquier problema de presión o caudal, se ha seleccionado un área piloto para controlar las pérdidas físicas de agua mediante el reemplazo de tuberías y ramales domiciliarios en mal estado. Con estas actuaciones se prevé beneficiar a unas 30.000 personas.

A lo largo de este período también se ha logrado consensuar el diseño de un Plan de Comunicación y Visibilidad (PC&V) que resulte una herramienta cómoda, ágil y, sobre todo, útil para lograr el objetivo común de favorecer la información y el posicionamiento del proyecto como un todo integral y desde una perspectiva de cooperación al desarrollo.



República Dominicana

Programas FCAS en ejecución
DOM-017-B
Apoyo a la elaboración del Plan Nacional de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos en la República Dominicana. Fase 1.
Programas FCAS aprobados en el 2025
DOM-019-B
Red Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua en República Dominicana

FCAS en la República Dominicana

En 2025 finalizó el programa bilateral destinado a apoyar el *Plan Nacional de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos* en el país. Esta iniciativa ha contribuido al fortalecimiento institucional del sector hídrico, lo que ha permitido, en el marco de su ejecución, desarrollar numerosos encuentros, seminarios, capacitaciones y visitas técnicas, en consonancia con el enfoque participativo que ha caracterizado su implementación.

Este programa ha sido ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de República Dominicana (INDRHI), cuya página web incluye un espacio específico destinado a difundir sus avances y resultados.

Por otra parte, el Consejo de Ministros del Gobierno de España autorizó el 30 de abril de 2025 una contribución de 2 M€ a favor del INDRHI para la financiación del programa destinado a la *creación de una Red Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua en República Dominicana*. Esta iniciativa permitirá reforzar el cumplimiento de la normativa vigente y contribuir al logro de los objetivos establecidos en el Plan Hidrológico Nacional de la República Dominicana, así como en los planes de cuenca que puedan desarrollarse al mismo tiempo.

Programas FCAS en ejecución

DOM-017-B
Apoyo a la elaboración del Plan Nacional de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos en la República Dominicana. Fase 1

Entre julio y agosto de 2025, se llevaron a cabo socializaciones del borrador del Plan Hidrológico Nacional 2025-2045 (PHN) en diferentes regiones del país, garantizando la participación de actores clave en la gestión del agua en cada territorio. Estas jornadas permitieron a los asistentes expresar sus inquietudes y comentarios sobre la gestión del agua y el PHN. Como resultado de estos talleres, se concluyó que las propuestas planteadas estaban incluidas y desarrolladas en el Programa de Medidas del Plan, si bien se incorporaron algunos matices y recomendaciones surgidos durante el proceso. Con ello, el PHN quedó debidamente socializado y aprobado.

La presentación del Plan Hidrológico Nacional tuvo lugar el 17 de septiembre de 2025 ante las autoridades representativas de España y República Dominicana, acompañadas de los diferentes actores involucrados.

Ver noticia: República Dominica presenta su Plan Hidrológico Nacional, elaborado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) - aecid.es

Asimismo, como parte de los resultados del PHN, se elaboró el Atlas de los Recursos Hídricos en la República Dominicana, herramienta técnica impresa que recopila de manera rigurosa y actualizada la información sobre las fuentes y sistemas hídricos del país, y cuyo objetivo es fortalecer la gestión y planificación sostenible del agua.

En relación con las formaciones previstas, en mayo de 2025 se desarrolló un primer taller orientado a capacitar al personal del INDRHI y de otras instituciones en las aplicaciones informáticas de planificación hidrológica, el visor de infraestructuras hidráulicas y la de registro de usos. En junio se realizaron talleres centrados en la capacitación sobre reglamentos (legales), administración (registros, reglas de administración de recursos hídricos) y metodologías (análisis de inversiones en proyectos).

Programas FCAS aprobados en el 2025

DOM-019-B
Red Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua en República Dominicana

En diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de la República Dominicana, como entidad beneficiaria, aceptó los requisitos y condiciones fijados en la Resolución de Concesión de la Subvención de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global de la Secretaría de Estado de Cooperación, de fecha 17 de diciembre de 2025.

La iniciativa, con una dotación de 2 M€ y una duración prevista de 4 años, tiene programado su inicio en 2026. El programa contempla el diseño e implementación de una Red Nacional de Monitoreo de la Calidad de Agua orientada a generar información sistemática y confiable sobre el estado de las aguas superficiales y, de manera complementaria, de las aguas subterráneas.

En una primera fase se establecerá una red de monitoreo fisicoquímico que permitirá evaluar parámetros clave, fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia y respaldar la planificación y gestión sostenible de los recursos hídricos a nivel nacional. De este modo, la iniciativa



dará continuidad a los proyectos desarrollados previamente junto al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Asimismo, se prevé el establecimiento de un centro de operaciones capaz de procesar todos estos datos y convertirlos en una herramienta para la toma de decisiones, como puede ser, en el marco de la implementación del Plan Hidrológico Nacional. Por otro lado, en esta etapa del programa se establecerán acciones de intercambio con especialistas del área provenientes de las confederaciones hidrográficas de otros países.



Regional

LAIF Regional

Promover la adaptación al cambio climático y la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el sector de agua y saneamiento en América Latina

El programa *LAIF Regional*, financiado por la Unión Europea y gestionado por el FCAS, ha desempeñado un papel estratégico como complemento a los programas del FCAS, permitiendo abordar desafíos comunes a nivel regional relacionados con la adaptación al cambio climático, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, la sostenibilidad de los servicios y el fortalecimiento institucional del sector.

A lo largo de su ejecución, el programa ha financiado estudios técnicos, análisis sectoriales, fortalecimiento de entidades públicas y operadores, procesos de capacitación especializada y apoyo a la revisión de políticas públicas y marcos normativos vinculados al agua y al saneamiento. Asimismo, ha contribuido al desarrollo de herramientas, metodologías y plataformas de conocimiento innovadoras orientadas a mejorar la gestión del sector y promover el intercambio de experiencias entre países.

Durante 2025 se llevaron a cabo las actividades vinculadas al cierre definitivo del programa, incluyendo la justificación técnica y financiera ante la Unión Europea, la sistematización de resultados y productos desarrollados durante la ejecución y la elaboración del informe final de cierre.



Asimismo, en 2025 se realizó la evaluación externa del programa, cuyo objetivo ha sido analizar el impacto, la eficacia y la contribución de la iniciativa al fortalecimiento del sector del agua y el saneamiento en la región. Este proceso permitirá extraer aprendizajes y buenas prácticas para futuras actuaciones de cooperación regional vinculadas a adaptación climática, gobernanza del agua y resiliencia de los servicios. Durante 2025 continuó además el trabajo de análisis, sistematización y difusión de los aprendizajes generados, con el objetivo de elaborar publicaciones y recomendaciones que sirvan de referencia para futuras intervenciones del FCAS en materia de inclusión, equidad cultural y acceso a servicios de agua y saneamiento en entornos rurales y comunidades indígenas.

El legado del programa *LAIF Regional* refuerza el posicionamiento del FCAS como instrumento de referencia en la articulación de cooperación regional, generación de conocimiento y movilización de alianzas internacionales en torno a la Agenda del Agua y los desafíos asociados al cambio climático.



Cooperaciones técnicas

Cooperaciones técnicas finalizadas en 2025

- **RG-T3668**
  Desarrollo de estrategias para asegurar servicios de agua, saneamiento e higiene en asentamientos informales. Regional.
- **RG-T3915**
  Fortalecimiento de capacidades de pequeños operadores de servicios de agua y saneamiento en la región. Regional.

Cooperaciones técnicas que continúan en ejecución en 2025

- **RG-T3857**
  La desalación como alternativa de recurso hídrico en la región de América Latina y el Caribe. Regional.
- **RG-T4428**
  Apoyo al desarrollo de esquemas de colaboración conjunta para el sector de agua y saneamiento en la Isla de la Española. Regional: Haití y República Dominicana.
- **GU-T1348**
  Apoyo a la sostenibilidad de los servicios APS construidos a través del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano – Fase I – Guatemala.
- **PR-T1360**
  Apoyo al sector de agua y saneamiento en Paraguay hacia una provisión sostenible de los servicios y la planificación sectorial. Paraguay.

Operaciones en preparación durante 2025

- *Refuerzo a pequeños operadores y empresas de agua de agua en aspectos clave del servicio. Regional.*
- *Promover la innovación en Honduras en los ámbitos de la Seguridad hídrica y el Saneamiento. Honduras.*
- *Promover la innovación en República Dominicana en los ámbitos de la Seguridad hídrica y el Saneamiento. República Dominicana.*
- *Apoyo a la planificación de servicios de agua, saneamiento e higiene en asentamientos informales. Regional.*

Cooperaciones técnicas

En el marco de la alianza entre la Cooperación Española y el BID, el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) ha permitido impulsar no solo programas de inversión, sino también operaciones complementarias orientadas a reforzar la sostenibilidad de las intervenciones, generar conocimiento técnico y acompañar nuevas prioridades del sector.

Además de los programas gestionados a través del BID (los denominados bi-multilaterales a lo largo de esta memoria), se han puesto en marcha otras operaciones financiadas con intereses generados o con reinversiones de fondos remanentes de algunos programas. Entre ellas, destacan diagnósticos temáticos, evaluaciones finales y evaluaciones ex post, cooperaciones técnicas de apoyo a los países y acciones de comunicación y gestión del conocimiento desarrolladas de manera coordinada entre el BID y el FCAS. Estas iniciativas han contribuido a consolidar aprendizajes, fortalecer capacidades institucionales y generar herramientas útiles para futuras intervenciones.

Entre las operaciones impulsadas a través del FECASALC, continúa en ejecución la operación «VE-G1002 – Apoyo al mejoramiento del servicio de agua en centros de salud prioritarios en Venezuela», aprobada en 2024 por un monto de 1,9 M$. Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir a la salud de la población, mejorando las infraestructuras de agua y saneamiento en hospitales piloto, interviniendo en centros localizados en el estado de Zulia, en la frontera con Colombia.

Por su parte, las cooperaciones técnicas financiadas con cargo al FECASALC han seguido desempeñando un papel relevante como instrumento de apoyo a los programas y de impulso a líneas estratégicas del Fondo, como la sostenibilidad de los servicios, el fortalecimiento de pequeños operadores, el acceso a agua, saneamiento e higiene en asentamientos informales, la gestión integrada de los recursos hídricos, la desalación, la planificación sectorial y la atención a poblaciones vulnerables.

Durante 2025, finalizaron dos cooperaciones técnicas regionales, cuatro continuaron en ejecución y se prepararon otras cuatro nuevas operaciones, cuya aprobación e inicio se prevé a lo largo de 2026.

Asimismo, este enfoque se ha visto reforzado con la nueva aportación de 6 M€ de la Cooperación Española al FECASALC, orientada al ámbito de la Amazonía y a fortalecer la vinculación entre agua, transición ecológica justa y adaptación al cambio climático.

A continuación, se resumen las cooperaciones técnicas vinculadas al FECASALC, diferenciando entre aquellas finalizadas en 2025, las que continúan en ejecución y las nuevas operaciones preparadas durante el ejercicio.

Ver noticia: Aecid y BID refuerzan su vínculo en favor de la acción climática en América Latina y Caribe - aecid.es



Cooperaciones técnicas finalizadas en 2025

RG-T3668
Desarrollo de estrategias para asegurar servicios de agua, saneamiento e higiene en asentamientos informales. Regional

La operación, de 1 M$, ha apoyado a los países de la región en la definición de estrategias para garantizar servicios esenciales de agua, saneamiento e higiene en zonas urbanas informales con alta vulnerabilidad sanitaria. Para ello, se han elaborado diagnósticos, planes de acción y pilotos innovadores que tienen en cuenta las condiciones urbanísticas, las alternativas de prestación de servicios, los marcos legales y normativos y las experiencias existentes.

Entre sus principales resultados destacan un diagnóstico regional sobre la prestación de servicios en asentamientos informales, diagnósticos específicos en varios países y una Caja de Herramientas compuesta por seis guías para orientar intervenciones en estos contextos. Además, se han impulsado hackáthones, proyectos piloto y productos de comunicación sobre experiencias de acceso a agua y saneamiento en asentamientos informales.

RG-T3915
Fortalecimiento de capacidades de pequeños operadores de servicios de agua y saneamiento en la región. Regional

Esta actuación, cuya inversión ha sido de 0,5 M$, se ha centrado en promover la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento mediante el apoyo a pequeños operadores. En este marco, se han desarrollado herramientas, materiales de formación y acciones de asistencia técnica orientadas a mejorar la gestión de los servicios en pequeñas y medianas ciudades.

Entre los principales avances figuran la elaboración de diagnósticos y planes de mejora para operadores en varios países, el desarrollo de herramientas para catastros y modelación hidráulica, la creación de una herramienta de gestión comercial y la preparación de materiales de capacitación. Asimismo, se ha avanzado en una metodología de refuerzo de pequeños operadores, con especial énfasis en el conocimiento del sistema, la mejora de la operación, la gestión comercial y la relación con las personas usuarias.



Cooperaciones técnicas que continúan en ejecución en 2025

RG-T3857
La desalación como alternativa de recurso hídrico en la región de América Latina y el Caribe. Regional

La iniciativa, de 0,3 M$, busca identificar oportunidades y claves para el desarrollo de alternativas de desalación en América Latina y el Caribe, en un contexto marcado por el estrés hídrico y el cambio climático. Esta línea refuerza la gestión integrada de los recursos hídricos y aborda un ámbito en el que la experiencia española puede aportar un valor añadido relevante.

Durante 2025 se ha finalizado un diagnóstico regional sobre el sector de la desalación, analizando experiencias existentes, condiciones necesarias para su implantación y oportunidades de desarrollo. También se han elaborado estudios de prefactibilidad en Chile y se ha preparado un módulo de formación sobre desalación, impartido en modalidad virtual para personal técnico, empresas de agua, ministerios sectoriales, municipalidades y funcionarios públicos.

RG-T4428
Apoyo al desarrollo de esquemas de colaboración conjunta para el sector de agua y saneamiento en la Isla de la Española. Regional: Haití y República Dominicana

El objetivo de esta cooperación, cuyo monto asciende a 0,15 M$, es impulsar líneas de colaboración entre Haití y República Dominicana para contribuir a la provisión universal y sostenible de servicios de agua potable y saneamiento en la Isla de la Española, con especial atención a la gestión de los recursos hídricos compartidos.

En 2025 se han logrado avances en los análisis técnicos iniciales de las cuencas fluviales transfronterizas, con el desarrollo de diagnósticos a nivel de cuenca y la consolidación de la información hidrológica disponible. No obstante, la situación en Haití ha limitado la realización de talleres binacionales presenciales, por lo que el trabajo se ha centrado en mantener activa la línea técnica y preparar las condiciones para retomar la coordinación conjunta cuando sea viable.

GU-T1348
Apoyo a la sostenibilidad de los servicios APS construidos a través del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano – Fase I – Guatemala

Esta operación de 0,5 M$ está orientada a definir e implementar una estrategia de sostenibilidad para las infraestructuras urbanas y rurales de agua potable y saneamiento construidas en el marco del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano – Fase I en Guatemala.

La actuación busca asegurar que las municipalidades, el Instituto de Fomento Municipal (INFOM), la Unidad Ejecutora de Programas Rurales (UNEPAR) y las comunidades rurales organizadas puedan brindar servicios eficientes y autosostenibles a la población. Durante 2025 se inició la fase de implementación, con una estrecha colaboración institucional con el INFOM. Se avanzó en diagnósticos, planes de mejora, documentos técnicos de operación y mantenimiento, así como en formaciones, capacitaciones y campañas de sensibilización en temas técnicos, sociales, de género e integración comunitaria.



PR-T1360
Apoyo al sector de agua y saneamiento en Paraguay hacia una provisión sostenible de los servicios y la planificación sectorial. Paraguay

En Paraguay, esta cooperación apoya la definición de estrategias para garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento, a través de la planificación de inversiones, el refuerzo a los prestadores y el fortalecimiento de las instituciones del sector. El monto de esta operación asciende a 0,46 M$.

Durante 2025 se priorizaron las actividades orientadas a apoyar la operación de las infraestructuras construidas en el marco del Programa de Saneamiento Integrado de Asunción. Entre los principales avances se encuentran la evaluación del estado y funcionamiento de los sistemas, la recolección de datos de calidad de agua de los cuerpos receptores, el análisis de la conectividad en redes de alcantarillado y la elaboración de una guía para el manejo de los aspectos sociales y ambientales en la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Operaciones en preparación durante 2025

Refuerzo a pequeños operadores y empresas de agua de agua en aspectos clave del servicio. Regional

Esta nueva operación dará continuidad al trabajo desarrollado en el fortalecimiento de pequeños operadores y empresas de agua, con el objetivo de promover una mayor sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en pequeñas y medianas ciudades.

Para ello, se prevé trabajar en el desarrollo de materiales de formación y capacitación, la creación de herramientas adaptadas a pequeños operadores y el apoyo a diagnósticos y planes de mejora para la gestión de los servicios. La operación parte de los insumos generados por la RG-T3915, en la que se definieron metodologías y herramientas para reforzar a pequeños operadores. El abstracto fue enviado por el BID a la AECID en diciembre de 2025 y se espera su aprobación durante el primer semestre de 2026.

Promover la innovación en Honduras en los ámbitos de la Seguridad hídrica y el Saneamiento. Honduras

La operación prevista en Honduras busca impulsar el uso de enfoques innovadores en los ámbitos del saneamiento y la seguridad hídrica, contribuyendo a mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios para la población.

En concreto, se prevé apoyar el *Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras* y la operación en preparación para la mejora de la infraestructura de agua potable del Distrito Central. Asimismo, permitirá capacitar a instituciones y actores del país para que puedan incorporar estos enfoques innovadores en otros proyectos del sector. Se espera que la operación pueda ser aprobada a lo largo de 2026.

Promover la innovación en República Dominicana en los ámbitos de la Seguridad hídrica y el Saneamiento. República Dominicana

En República Dominicana, la operación se orientará a impulsar enfoques innovadores en materia de saneamiento y seguridad hídrica, con el fin de contribuir a mejores servicios para la población e incorporar un foco específico en poblaciones vulnerables.

La iniciativa prevé apoyar el *Programa de Resiliencia y Sostenibilidad en el Abastecimiento de Agua para Santo Domingo* y el *Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reúso para la zona de Punta Cana-Bávaro*. Además, contempla el fortalecimiento de capacidades institucionales para que estos enfoques puedan ser aplicados en otros proyectos. Se espera que pueda ser aprobada durante el ejercicio 2026.

Apoyo a la planificación de servicios de agua, saneamiento e higiene en asentamientos informales. Regional

Esta operación regional dará continuidad a los insumos generados por la *RG-T3668 Desarrollo de estrategias para asegurar servicios de agua, saneamiento e higiene en asentamientos informales (Regional)*, que abordó la problemática del acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene en asentamientos urbanos informales.

Su objetivo es apoyar a los países en el desarrollo de marcos regulatorios y de planificación que permitan integrar la provisión de estos servicios en asentamientos informales. Con ello, se busca favorecer la preparación y el desarrollo de intervenciones urbanas que incorporen esta problemática de manera más estructurada. Se espera que la documentación técnica sea remitida a la AECID en 2026 para su aprobación durante el ejercicio.

6. Cómo trabajamos



Enfoque de derechos humanos al agua y al saneamiento

El compromiso del FCAS con la promoción y la realización efectiva de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento (DHAS) ha continuado siendo, a lo largo de 2025, una de las principales señas de identidad de su actuación y un elemento transversal presente en el conjunto de sus intervenciones. Este compromiso se ha traducido no solo en el respaldo y la participación activa del Fondo en distintos foros de debate, intercambio y reflexión estratégica del sector, sino también en el impulso de iniciativas orientadas a consolidar el enfoque de derechos como referencia fundamental para la planificación, ejecución y evaluación de las políticas y programas de agua y saneamiento.



Entre las principales actuaciones desarrolladas durante el año destacan, por un lado, la promoción y defensa de los DHAS en los espacios nacionales e internacionales en los que el FCAS participa, contribuyendo al fortalecimiento del diálogo sectorial y a la generación de consensos en torno a la necesidad de garantizar un acceso universal, equitativo, seguro y sostenible al agua y al saneamiento.

En este sentido, a lo largo del año 2025 se ha participado en diversos encuentros internacionales, tales como la XXVI edición de la CODIA o la reunión de Ministros del sector organizado por el Gobierno de España, *Sanitation for All* (SWA) y UNICEF en Madrid. La AECID y el FCAS participaron activamente en este encuentro, contribuyendo a la moderación y relatoría de algunas sesiones. Durante el evento se firmó el *Compromiso de Acción de Madrid* Pacto de líderes de alto nivel sobre seguridad hídrica y resiliencia, que tiene como objetivo acelerar el progreso hacia el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento resilientes al clima, así como fortalecer la gestión sostenible del agua a todos los niveles, sirviendo como base para los derechos humanos, la prosperidad y la estabilidad.

Asimismo, el FCAS organizó una sesión sobre Gobernanza Democrática del Agua durante la Semana Mundial del Agua de Estocolmo en la que participó el relator de Naciones Unidas, Pedro Arrojo, y el director ejecutivo en funciones de la SWA, Muyatwa Sitali.

Del mismo modo, se participó también en el Webinar Implementando los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, organizado por Human Right 2 Water.

Ver noticia: Herramientas prácticas en agua y saneamiento para llevar los derechos humanos al territorio.



Por otro lado, se ha continuado avanzando en el diseño, desarrollo y difusión de herramientas metodológicas, instrumentos técnicos y materiales de orientación destinados a facilitar la incorporación práctica de este enfoque en distintos niveles de intervención y entre los diferentes actores del sector.

Asimismo, el enfoque DHAS ha seguido integrándose de manera progresiva en las nuevas intervenciones financiadas por el Fondo desde las etapas iniciales del ciclo de programación, incorporándose en los procesos de identificación, formulación y diseño de los programas. Ello ha permitido reforzar aspectos esenciales como la participación de las comunidades, la equidad en el acceso a los servicios, la atención prioritaria a poblaciones en situación de vulnerabilidad, la sostenibilidad de las actuaciones y el fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias.

Todas estas líneas de trabajo se entienden como elementos complementarios y mutuamente reforzados, que contribuyen de manera conjunta a consolidar una visión integral del agua y el saneamiento como derechos humanos fundamentales, así como a fortalecer la capacidad del sector para traducir dichos principios en actuaciones concretas con impacto real sobre las condiciones de vida de la población beneficiaria.

Ver noticia: 15 años de los derechos humanos al agua y al saneamiento: un compromiso que transforma vidas.

Enfoque feminista y de género

En 2025, el FCAS continuó reforzando la incorporación del enfoque feminista y de género como eje transversal de sus intervenciones, promoviendo una cooperación en agua y saneamiento más inclusiva, participativa y orientada a la reducción de desigualdades.

Durante el año, el Fondo participó activamente en distintos espacios de intercambio y reflexión sobre igualdad de género y agua, además de contribuir al proceso de elaboración de la Estrategia de Cooperación Feminista de la Cooperación Española que fue aprobada en el mes de diciembre, aportando experiencias y aprendizajes vinculados al papel de las mujeres en la gestión comunitaria del agua, los cuidados y la sostenibilidad de los territorios.

Asimismo, se impulsaron iniciativas de comunicación y gestión del conocimiento dirigidas a visibilizar el liderazgo de las mujeres en el sector del agua y el saneamiento. En este marco, destacaron las iniciativas De gotas invisibles a olas imparables: mujeres que transforman el agua y Guardianas Trifinio: mujeres, agua, territorio y comunidad, centradas en reconocer y difundir experiencias de mujeres que desempeñan un papel clave en la gestión del agua, la protección del territorio y el fortalecimiento comunitario.

Estas acciones han contribuido a consolidar el enfoque de género como un elemento estratégico del trabajo del FCAS, fortaleciendo la generación de conocimiento, la sensibilización y el intercambio de experiencias para avanzar hacia servicios de agua y saneamiento más equitativos y sostenibles.



Enfoque de diversidad cultural



Durante 2025 se ha dado continuidad a la incorporación del enfoque de diversidad cultural reforzando el reconocimiento de los pueblos indígenas y comunidades locales como actores clave en la gestión sostenible del agua y el saneamiento. Este enfoque no se limita a garantizar que las intervenciones generen beneficios directos para estas poblaciones, sino que promueve su participación efectiva, el respeto a sus formas propias de organización y la incorporación de sus conocimientos tradicionales, prácticas culturales y saberes ancestrales en el diseño de soluciones adaptadas al territorio.

En este marco, el trabajo con pueblos indígenas se ha consolidado como una línea de colaboración más amplia, orientada a generar aprendizajes y criterios comunes para fortalecer la incorporación del enfoque de diversidad cultural en los programas de agua, saneamiento e higiene impulsados por el Fondo del Agua en América Latina y el Caribe.

Esta línea de trabajo se ha abordado desde una doble vía. Por un lado, el Fondo ha buscado reforzar las sinergias con el *Programa Indígena* de la AECID, como en el programa desarrollado en México en diez localidades rurales del municipio de Tekax, en el estado de Yucatán. En este marco, durante 2025 se ha acompañado un proceso participativo de consulta con las comunidades indígenas beneficiarias. Este proceso ha permitido asegurar el acceso a la información, la participación comunitaria y la validación de las decisiones vinculadas a las obras de agua potable y saneamiento, incorporando las aportaciones de las comunidades de acuerdo con su cosmovisión, sus formas propias de organización y sus prioridades. La colaboración con el *Programa Indígena* ha contribuido, así, a mejorar la pertinencia cultural de la intervención y a favorecer una mayor apropiación comunitaria en el diseño, ejecución y seguimiento de las actuaciones.

Por otro lado, a partir de la consultoría desarrollada durante 2024 por el Stockholm International Water Institute (SIWI), orientada a identificar buenas prácticas y recomendaciones para la incorporación del enfoque de pueblos indígenas en proyectos de agua, saneamiento e higiene en América Latina y el Caribe, durante 2025 se avanzó en la sistematización de los resultados y en la elaboración de productos de conocimiento. Este trabajo permitió capitalizar aprendizajes, desafíos y criterios operativos derivados de la experiencia del Fondo con comunidades indígenas, generando insumos para fortalecer la pertinencia cultural, la sostenibilidad y la inclusión de las actuaciones en contextos rurales e indígenas. Como resultado de este proceso, se prevé publicar un documento con orientaciones para trabajar en agua y saneamiento con pueblos indígenas en 2026.

Durante 2025 ha sido especialmente relevante el trabajo desarrollado en México a través del programa de *Mejora del acceso a servicios de agua potable y saneamiento en diez localidades rurales del municipio de Tekax, en el estado de Yucatán*. Esta intervención ha permitido avanzar en la mejora de las infraestructuras de agua y saneamiento en comunidades indígenas, incorporando además componentes de fortalecimiento institucional, capacitación de comités comunitarios, gestión integrada de los recursos hídricos y sensibilización sobre la cultura del agua, con el objetivo de favorecer la sostenibilidad de los servicios y su apropiación por parte de la población beneficiaria.

Asimismo, un ejemplo significativo de incorporación de saberes tradicionales al diseño de soluciones hídricas es el programa *Alternativas de captación y almacenamiento de agua para mejorar la disponibilidad y la gestión integrada del recurso hídrico en el Chaco paraguayo*. Esta iniciativa, identificada durante 2025, recupera y pone en valor prácticas tradicionales vinculadas a la recarga artificial de acuíferos presentes en los paleocauces, una técnica que permite mejorar la calidad del agua subterránea y reducir las elevadas pérdidas derivadas de la evaporación del agua superficial, fenómeno especialmente acusado en contextos climáticos extremos como los del Chaco paraguayo.



En una región caracterizada por condiciones ambientales y sociales especialmente adversas, muchas comunidades continúan careciendo de sistemas adecuados de distribución, recolección y almacenamiento de agua. En este contexto, el acceso a agua subterránea dulce, localizada de manera dispersa en el acuífero en forma de bolsones asociados a paleocauces, ha constituido históricamente una de las principales alternativas para paliar la escasez hídrica y garantizar las necesidades básicas de la población. Sin embargo, la creciente presión sobre este recurso, unida a la limitada capacidad de recarga natural de los acuíferos, supone un riesgo significativo para la sostenibilidad futura de estas reservas de agua.

Frente a esta situación, el programa apuesta por recuperar y fortalecer técnicas tradicionales de manejo hídrico desarrolladas históricamente por las comunidades indígenas del Chaco. La práctica de la recarga artificial, aplicada desde hace décadas de forma empírica en el Chaco Central, tiene su origen precisamente en los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas de la región, quienes construían en terrenos bajos y arenosos un pozo central rodeado por un anillo de pozos secundarios, favoreciendo así la infiltración y conservación del agua subterránea.

La incorporación de estas prácticas tradicionales al diseño de soluciones contemporáneas evidencia la importancia de integrar el conocimiento local y ancestral en las estrategias de adaptación y gestión sostenible de los recursos naturales, reconociendo el papel fundamental de las comunidades indígenas como actores clave en la preservación y transmisión de saberes vinculados al territorio y al agua.

En noviembre de 2025, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), la AECID organizó el encuentro denominado “El papel de las alianzas para el desarrollo sostenible en el apoyo a los pueblos indígenas como defensores del medio ambiente”. Un evento que giró en torno al papel clave de los pueblos indígenas en la protección de los ecosistemas y la mitigación del cambio climático y su conocimiento tradicional y su relación ancestral con la naturaleza. Asimismo, se abordó cómo la promoción de alianzas inclusivas y equitativas entre pueblos indígenas, gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado fortalecen la acción climática

Ver noticia: Los pueblos indígenas reivindican su papel como defensores ancestrales del medioambiente en la COP30 - aecid.es





Gobernanza y fortalecimiento institucional

Promoción de la gobernanza

Acciones de acompañamiento a los países socios

El fortalecimiento institucional y la promoción de una buena gobernanza del agua constituyen una línea de trabajo central del FCAS. Desde el inicio, los programas del Fondo aunque estuvieran orientados a la mejora del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, incorporaban necesariamente una componente de fortalecimiento de las instituciones y una visión de gobernanza. Progresivamente, estas componentes vinculadas a la planificación, la gestión territorial y el acompañamiento a las instituciones responsables del sector han ido ganando peso, de cara a garantizar la sostenibilidad de los servicios y la maduración del sector en su conjunto.

En 2025 destaca la participación del FCAS en la semana ministerial organizada por SWA y MITECO en Madrid, orientada a impulsar la integración de políticas de acceso al agua y saneamiento y de gestión integrada de los recursos, rompiendo así la tendencia a trabajar en silos. Asimismo, se ha venido trabajando de manera cada vez más intensa en el marco de Naciones Unidas, en el seno de UN-Water.

Durante 2025, el Fondo del Agua continuó acompañando a los países socios en estos procesos, tanto a través de los programas en ejecución como mediante espacios regionales de diálogo técnico y político. Entre ellos destaca la participación en la Conferencia de Direcciones y Autoridades Iberoamericanas del Agua (CODIA), uno de los principales foros iberoamericanos para el intercambio de experiencias y la promoción de la gobernanza del agua y la gestión integrada de los recursos hídricos.

Participación en la Conferencia de Direcciones y Autoridades Iberoamericanas del Agua (CODIA)

La XXVI CODIA, celebrada en Chile entre los días 6 y 8 de octubre de 2025, abordó cuestiones clave para la región, como las fuentes de financiación para la GIRH, el papel de la tecnología y la digitalización en la gobernanza, los impactos de la sequía y la gestión del agua en contextos de escasez, así como la protección de montañas y glaciares como cabeceras de cuenca esenciales para reforzar la seguridad hídrica en Iberoamérica.

En este marco, el FCAS participó en la presentación de la Guía Técnica de Planificación Hidrológica en el marco de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, dirigida al ámbito iberoamericano. La sesión permitió compartir el proceso participativo de elaboración de la Guía, presentar sus principales características y recoger aportaciones de los países e instituciones participantes para orientar sus próximos pasos de difusión y capacitación.

Apoyo para el desarrollo del sector del saneamiento y tratamiento de aguas residuales

El desarrollo del sector del saneamiento y del tratamiento de aguas residuales requiere avanzar no solo en la construcción de infraestructuras, sino también en la planificación, la regulación, la organización del servicio y la sostenibilidad de los sistemas. Para ello, resulta fundamental reforzar las capacidades técnicas e institucionales de los países socios, así como promover modelos de gestión que aseguren una operación adecuada, un mantenimiento suficiente y una mayor protección de los cuerpos de agua receptores.

En este ámbito, el Fondo del Agua ha continuado impulsando actuaciones orientadas a mejorar la planificación sectorial del saneamiento, fortalecer a las instituciones responsables y acompañar procesos de desarrollo normativo y técnico. Este trabajo resulta especialmente relevante en un contexto en el que numerosos países de la región deben ampliar coberturas, reducir vertidos, mejorar la calidad de los servicios y adaptar sus sistemas a los efectos del cambio climático.

Durante este periodo, además de las actuaciones en países concretos, a nivel regional se ha seguido apoyando la actividad de la CODIA centrada en saneamiento y depuración. En concreto se ha continuado a través del Encargo con el CEDEX con la redacción de las Recomendaciones sobre planificación sectorial del saneamiento y tratamiento de aguas residuales. En concreto se ha llevado a cabo una reestructuración del documento derivada de la revisión realizada por parte de expertos en instituciones especializadas y se ha avanzado en la redacción de las partes principales del documento, estando previsto finalizar este trabajo a lo largo de 2026.

Por otro lado, se ha dado apoyo a los grupos de trabajo de normativa de la plataforma normativa de la CODIA, también a través del apoyo del CEDEX. Durante el año 2025 los grupos de trabajo han centrado su actividad en el análisis técnico, el intercambio de experiencias y la identificación de buenas prácticas en materia de gestión del agua, destacando especialmente los trabajos de los grupos de Reúso (GT2) y Cánones de Vertido (GT3).

El Grupo de Trabajo de Reúso ha desarrollado su actividad en la organización de sesiones, enfocadas en el intercambio de experiencias y el avance en marcos conceptuales y normativos sobre reutilización del agua.

El Grupo de Trabajo de Cánones de Vertido ha celebrado sesiones en este periodo, centradas en el análisis comparado de instrumentos económicos aplicados a la gestión de vertidos y del agua. En conjunto, el grupo está avanzando en la mejora del conocimiento y diseño de instrumentos económicos que favorezcan una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

Fortalecimiento de operadores

La sostenibilidad de los servicios de agua, saneamiento y depuración depende en gran medida de la capacidad de los operadores para gestionarlos de forma segura, eficiente y sostenible. Por ello, el FCAS mantiene una línea de trabajo orientada al fortalecimiento de operadores, tanto públicos como comunitarios, con especial atención a los pequeños prestadores y a aquellos que trabajan en zonas rurales o de mayor vulnerabilidad.

Durante 2025 se impulsaron diversas actividades de intercambio técnico y generación de alianzas, entre ellas los Diálogos sobre Hermanamientos entre Operadores de Agua y la Jornada española para la promoción de la cooperación técnica y alianzas en el sector. Estos espacios permitieron reflexionar sobre los retos de los operadores, las oportunidades de cooperación entre entidades del sector y la importancia de reforzar las capacidades técnicas, operativas y de gestión para mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios.

Con las experiencias extraídas de estas jornadas así como el trabajo de investigación realizado se ha trabajado en la elaboración de un diagnóstico sobre la cooperación técnica en España, logrando identificar las potencialidades en el ámbito de la cooperación técnica con entidades españolas en el sector de la operación de los servicios de agua y saneamiento así como las principales barreras y desafíos a los que se enfrentan los expertos que trabajan en estas empresas para participar en actividades de cooperación internacional.

El objetivo final de estas actividades es el de contribuir a movilizar e implicar a las empresas de agua españolas en actividades de cooperación técnica y aprovechar de esta manera el gran potencial de capacitación y fortalecimiento institucional existente en España.

Ver noticia: Sevilla acoge los Diálogos sobre hermanamientos entre Operadores de Agua y la Jornada española para la promoción de la cooperación técnica y alianzas en el sector - aecid.es

Ver noticia: Los Diálogos sobre Hermanamientos entre Operadores de Agua reflexionan sobre la importancia de los pequeños operadores y los retos y oportunidades del sector - aecid.es

Desarrollo de capacidades

El Fondo del Agua concibe el desarrollo de capacidades como una herramienta fundamental para asegurar la sostenibilidad de las intervenciones. Más allá de la construcción de infraestructuras, los programas del FCAS incorporan acciones de formación, asistencia técnica, sensibilización y acompañamiento dirigidas a fortalecer a los distintos actores del sector: instituciones nacionales, gobiernos locales, operadores, juntas de agua, organizaciones comunitarias y población usuaria.

Durante 2025, esta línea de trabajo se ha mantenido tanto dentro de los programas en ejecución como a través de espacios regionales de intercambio de conocimiento. En el ámbito local y comunitario, las actuaciones del Fondo han continuado promoviendo la formación en ciclo del agua, operación y mantenimiento de sistemas, gestión de servicios, uso eficiente del agua, higiene, protección de fuentes y participación comunitaria. Estas acciones resultan esenciales para mejorar la apropiación de los sistemas por parte de la población y reforzar la sostenibilidad técnica, social y ambiental de los servicios.

A nivel institucional, el FCAS ha seguido acompañando a los países socios en el fortalecimiento de sus capacidades de planificación, regulación y gestión sectorial. Este acompañamiento incluye el apoyo a la elaboración de instrumentos normativos y de política pública, el refuerzo de capacidades técnicas en materia de agua y saneamiento, y la promoción de enfoques vinculados a los derechos humanos, la igualdad de género, la pertinencia cultural y la gestión integrada de los recursos hídricos.

En el ámbito regional, el desarrollo de capacidades se ha visto reforzado por la participación del FCAS en espacios como la CODIA y por el impulso a herramientas de conocimiento compartido. En este sentido, la presentación en 2025 de la Guía Técnica de Planificación Hidrológica en el marco de la GIRH abre una nueva etapa orientada a su difusión y aplicación práctica por parte de los países iberoamericanos. Tras su presentación, en una sesión técnica en la CODIA, el FCAS y la Secretaría Técnica Permanente de la CODIA asumieron el compromiso de promover acciones de capacitación, inicialmente mediante webinarios y un curso presencial, para facilitar el uso de la Guía y apoyar a las instituciones en sus procesos de planificación hidrológica.



Asimismo, el fortalecimiento de capacidades se ha impulsado a través de alianzas técnicas y espacios de intercambio entre operadores, como los Diálogos sobre Hermanamientos entre Operadores de Agua. Estas iniciativas permiten compartir experiencias, metodologías y soluciones prácticas entre entidades del sector, con especial atención a los pequeños operadores y a los retos de sostenibilidad que enfrentan en contextos rurales, periurbanos o de mayor vulnerabilidad.

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, medio ambiente y cambio climático

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) constituye uno de los principales ejes de trabajo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Este enfoque permite abordar el agua no solo como un servicio básico, sino como un recurso esencial para el desarrollo humano, la sostenibilidad ambiental, la seguridad hídrica y la adaptación al cambio climático.

A través de sus programas y acciones de asistencia técnica, el FCAS ha promovido la planificación hidrológica, la protección de fuentes, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la incorporación de criterios ambientales y climáticos en la gestión del agua. En 2025, esta línea de trabajo tuvo dos hitos especialmente relevantes: la presentación de la Guía Técnica de Planificación Hidrológica con enfoque de GIRH para el ámbito iberoamericano y la presentación oficial del Plan Nacional de Recursos Hídricos de la República Dominicana.

Guía Técnica de Planificación Hidrológica

El día 6 de octubre de 2025, en la XXV CODIA celebrada en Chile, se presentó la Guía Técnica de Planificación Hidrológica, en el marco de la GIRH, dirigida al ámbito iberoamericano. Este momento representó la culminación de varios años de trabajo, llevado a cabo con la participación de los países integrantes de la CODIA, tanto aportando casos prácticos demostrativos de la experiencia de los países, como con la participación de las personas expertas de las instituciones implicadas en la gestión del agua en distintos grupos de trabajo conformados para tratar temas específicos clave en la gestión de los recursos hídricos, como participación pública, financiación, fenómenos extremos y cambio climático y aguas transfronterizas.

La participación del Fondo en la elaboración y coordinación de esta Guía ha conllevado, necesariamente, a la inclusión del enfoque de Derechos Humanos. La suma de su desarrollo en el marco de la GIRH más ese enfoque de derechos ha definido el contenido de la misma, tanto en cuanto a temas que trata como a las metodologías desarrolladas, esto es fundamentalmente: priorización de usos de los recursos hídricos y criterios de garantía, maximizando el bienestar económico y social resultante de manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales; reparto de responsabilidades y gobernanza participativa, inclusiva y transparente y resolución de conflictos; y fases de la planificación y proceso cíclico e inclusivo, vinculados a una realización progresiva.

Esta Guía, eminentemente técnica, se ha desarrollado de manera que permite la versatilidad en su uso: cada capítulo y apartado es entendible por sí mismo con enlaces a otros apartados de la guía, a herramientas, a otras guías y a casos prácticos, lo que permite su consulta para abordar temas concretos en un plan hidrológico, así como para plantear desde el inicio la elaboración completa de un plan; se ha cuidado la redacción y explicación de las metodologías propuestas, haciéndolas sencillas y prácticas, facilitando, así, su comprensión y aplicación por técnicos con distintos niveles de experiencia, así mismo se han desarrollado, para cada tarea, dos niveles de complejidad a elegir según la situación de cada país; y es una herramienta que permite su utilización para otras necesidades que puedan plantearse, como la ordenación de los distintos instrumentos de planificación en el país o la indicación de metodologías aplicables al desarrollar los términos de referencia en procesos de licitación. Adicionalmente, esta Guía se ha concebido como una herramienta dinámica, actualizable, que se presenta tanto en formato web como en pdf y que permite su traducción automática a otros idiomas.

Su contenido responde a las necesidades actuales, muchas acuciantes, de los países para avanzar en la GIRH, destacando la inclusión de los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos, la gestión de eventos extremos (sequías e inundaciones), la tecnificación en la gestión del agua, la financiación del programa de actuaciones del plan y su evaluación ambiental.





La iniciativa para elaborar esta Guía fue planteada por AECID, a través del FCAS, en el Seminario de Alto Nivel sobre Planificación Hidrológica y Gestión Integrada de Recursos Hídricos celebrado el 19 de marzo de 2018 en el marco de la III Reunión InterCODIA que tuvo lugar en Brasilia el 18 y 19 de marzo, donde se presentó una propuesta inicial de índice y de hoja de ruta





para la elaboración de la Guía. Dicha propuesta fue objeto de debate en el Seminario, en el que participaron representantes de los distintos países, así como de instituciones como UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, CAF y CEPAL.

Los objetivos estratégicos con los que se planteó la elaboración de la Guía se encuentran directamente relacionados con los acuerdos alcanzados en el marco de la CODIA, resumidos en la necesidad de avanzar en los países en la implantación de la GIRH para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos aprovechando la experiencia acumulada en la región, lo que está totalmente alineado con el cumplimiento del ODS 6, Meta 6.5.

Es en este marco de trabajo, desde el cual el Fondo del Agua y la Secretaría Técnica Permanente de la CODIA (STP-CODIA) impulsaron la elaboración de esta Guía. Las tareas para culminar finalmente con una Guía de Planificación Hidrológica con visión GIRH se iniciaron en el año 2018 y desde entonces se han llevado a cabo distintos trabajos que servirán de base para la

elaboración de la citada guía, tales como: la caracterización del marco legal e institucional de la región desde la perspectiva de la GIRH y la planificación hidrológica, la recopilación de casos prácticos de los países, la definición de objetivos y criterios de planificación, etc.

Tras esta presentación en la CODIA, el FCAS y la STP-CODIA adquirieron el compromiso de su difusión y, conscientes de la necesidad de capacitación para los países de la CODIA en todos los aspectos relacionados con la gestión de recursos y la planificación hidrológica, se decidió apoyar a los países, utilizando como herramienta la Guía desarrollada, para lo cual se plantearon inicialmente webinarios para 2026 y un curso presencial para el próximo año.

Plan Nacional de Recursos Hídricos de la República Dominicana (PHN)

En septiembre de 2025, el Plan Nacional de Recursos Hídricos de la República Dominicana (PHN) se presentó oficialmente, con el lema, “Agua para el desarrollo de hoy y la vida de mañana”.

Han sido varios años de trabajo muy intenso durante los cuales el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) ha demostrado su importante determinación por avanzar en la gestión integrada de los recursos hídricos, de forma ordenada, eficiente y participativa.

Los objetivos del PHN fueron definidos a partir de lo establecido en la Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Promulgada el 25 de enero de 2012, emana del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y plantea un nuevo modelo de desarrollo que se articula alrededor de cuatro estrategias de acción. En el Cuarto Eje figura entre sus objetivos el manejo sostenible del medio ambiente que tiene entre sus objetivos específicos “Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible para garantizar la seguridad hídrica” con criterios alineados con lo que es actualmente la gestión integrada de los recursos hídricos

El Plan Hidrológico Nacional de la República Dominicana, que abarca todo el territorio nacional, nace de la necesidad solucionar los problemas de la gestión del agua en el país, entre los que destacan los desequilibrios hídricos existentes, para lo cual parte de estudios rigurosos y de una visión moderna de la gestión del agua, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos.

Se ha realizado un análisis pormenorizado por región hidrográfica, de su problemática, especialmente en cuanto a las situaciones de estrés hídrico y déficit de recursos, pero al mismo tiempo sin olvidar la calidad del medio hídrico y su conservación. Trata también de la coordinación de la planificación de la gestión del agua con otras planificaciones sectoriales para garantizar el reparto equitativo de los recursos hídricos y el desarrollo económico del país. Este Plan define las medidas de interés nacional que permitirán resolver los problemas del agua, estableciendo sus costos y las fuentes de financiación, así como el programa de implementación de las mismas, en los próximos veinte años divididos en dos horizontes.

Para el desarrollo de este Plan, han sido muy importante los procesos de participación y socialización. Primero se requirió la participación de las instituciones, entre septiembre de 2024 y junio de 2025, mediante encuentros, presentaciones, cuestionarios y jornadas. Posteriormente, cuando se terminó la redacción del borrador del Plan, el 18 de julio de 2025, se efectuó la socialización del Plan con los distintos actores e instituciones localizados en los diferentes territorios y regiones hidrográficas.

Ver noticia: Gran participación en el taller sobre la Guía de Planificación Hidrológica con Enfoque de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) - aecid.es

Gestión del conocimiento

En 2025, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento reforzó la gestión del conocimiento como una línea estratégica y transversal para mejorar la calidad, coherencia, sostenibilidad e impacto de sus intervenciones. Durante el año se avanzó de manera significativa en la elaboración del Marco de Conocimiento FCAS 2025-2028 y en la priorización de su matriz de acción, sentando las bases para una gestión más integrada, sistemática y orientada al aprendizaje institucional.

Este proceso ha permitido ordenar las prioridades de trabajo en materia de conocimiento, identificar ámbitos clave de sistematización y fortalecer el uso de la información como herramienta para la toma de decisiones.

En paralelo, durante 2025 el FCAS participó en distintos procesos de reflexión, actualización y elaboración de estrategias sectoriales de la Cooperación Española, entre ellas las de Cultura y Desarrollo Sostenible, Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global, Derecho a la Alimentación y Cooperación Feminista. Esta participación permitió aportar la experiencia y el conocimiento acumulados por el Fondo en materia de agua y saneamiento, contribuyendo a incorporar aprendizajes, enfoques y evidencias derivados de su trayectoria de trabajo en América Latina y el Caribe. De este modo, se reforzó la conexión entre la experiencia operativa de los programas y los procesos más amplios de planificación y definición estratégica de la Cooperación Española.

La gestión del conocimiento se consolidó, además, como un eje articulador entre áreas técnicas, enfoques transversales y alianzas estratégicas del Fondo. En 2025 se fortaleció la colaboración, el trabajo conjunto y el asesoramiento con el Programa Indígena de la AECID, favoreciendo la incorporación de aprendizajes vinculados a la pertinencia cultural, la participación de los pueblos indígenas y el enfoque de derechos en las intervenciones de agua y saneamiento.

Asimismo, se reforzó la colaboración con el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, para el impulso del Espacio de Inteligencia Colectiva de Agua en el marco de INTERCOONECTA. Esta línea de trabajo permitió avanzar en la identificación de espacios de intercambio, formación y capitalización de experiencias orientados a fortalecer capacidades técnicas e institucionales en el sector.

A lo largo del año se llevó a cabo un proceso de sistematización de los productos generados en el marco del programa *Promover la adaptación al cambio climático y la inversión en la gestión integrada de los recursos hídricos en el sector del agua y el saneamiento en América Latina en el marco del FCAS*. Este esfuerzo permitió organizar y poner a disposición de la ciudadanía más de 90 documentos elaborados por el programa, clasificados por países, regiones y temáticas. Entre ellos se encuentran planes estratégicos, diagnósticos, notas técnicas, materiales de capacitación, análisis de cuencas, herramientas y diseños que constituyen una valiosa fuente de conocimiento y contribuyen significativamente al fortalecimiento y desarrollo del sector del agua y el saneamiento en la región.

Finalmente, la gestión del conocimiento prestó apoyo técnico transversal a distintas líneas de trabajo del FCAS, mediante la revisión de documentos, elaboración de notas y análisis técnicos, preparación de presentaciones, soporte organizativo y recopilación, tratamiento y sistematización de datos. Todo ello ha contribuido a reforzar una cultura institucional basada en el conocimiento compartido, la cooperación técnica y el aprendizaje continuo.

De cara a los próximos años, el FCAS continuará impulsando la gestión del conocimiento como un ámbito estratégico de trabajo, con especial atención a la sistematización y capitalización de experiencias, el intercambio regional de aprendizajes y el desarrollo de misiones a terreno orientadas a identificar, documentar y difundir buenas prácticas y lecciones aprendidas en el sector de agua y saneamiento.

Comunicación

La visibilidad del trabajo del FCAS constituye un elemento esencial tanto para las personas beneficiarias de los programas como para la ciudadanía española, en cumplimiento del compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la difusión de resultados.

El objetivo principal de la estrategia de comunicación es evidenciar y documentar los cambios tangibles generados por las iniciativas del Fondo. Para ello, se articula sobre dos pilares complementarios:

- **Indicadores de avance**: la recopilación sistemática de datos permite mostrar resultados verificables y cuantificables.
- **Testimonios comunitarios**: las experiencias directas de las personas beneficiarias aportan contexto humano y social a los logros técnicos.

Presencia digital en el portal de AECID

El FCAS cuenta con un espacio web propio dentro del portal de AECID, donde se publican noticias, avances de proyectos, actividades y eventos relacionados con el Fondo: https://www.aecid.es/inicio-fcas En el año 2025 se ha renovado, junto al resto de la web de AECID, para facilitar la búsqueda de información para la ciudadanía.

Durante 2025, se difundieron más de 30 noticias, consolidando este espacio como el principal canal de información pública sobre el programa.

Espacio específico del Programa LAIF Regional

Dentro del portal de AECID se habilitó un espacio dedicado al programa "Promover la adaptación al cambio climático y la inversión en la gestión integrada de los recursos hídricos en América Latina", financiado mediante Cooperación Delegada de la Unión Europea.

Este programa permitió ejecutar 36 proyectos en 17 países de América Latina. En 2025, coincidiendo con su cierre, se elaboraron infografías individuales para cada proyecto, incluyendo:

- Descripción de la intervención
- Número de personas beneficiarias
- Documentos y productos generados

Todo el material está disponible en: https://www.aecid.es/laif-regional



Intervenciones en medios de comunicación

El FCAS impulsó y participó en diversas apariciones en medios, reforzando su presencia pública y la difusión de sus resultados.

Radio y podcasts

- Plataforma Española de Cooperación en Agua, Saneamiento e Higiene Participación en el programa Somos Cooperación de Radio Nacional.



- Entrevista a la directora del FCAS En el programa *Mundo Solidario*, explicando el funcionamiento y alcance del Fondo.



Prensa especializada

España lanza su ofensiva global por el derecho al agua. Reportaje en papel en la revista *iAgua*.



- Encuentro de Operadores (junio 2025) Cubierto por diversos medios digitales y en papel, entre ellos.



- Acuerdo con iAgua Publicación continua de contenidos sobre cooperación española en agua y saneamiento

Reconocimientos internacionales

Uno de los programas del FCAS fue destacado como buena práctica en una publicación de *ONU-Hábitat*.



Producción audiovisual

Durante 2025 se generaron diversos contenidos en vídeo para reforzar la comunicación pública del Fondo. Algunos de ellos fueron estos:




- Videoentrevista con Pedro Arrojo, Relator de Naciones Unidas para Agua y Saneamiento (marzo 2025).



- Videoentrevista por el Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo), con una joven emprendedora colombiana apoyada por el FCAS.



- Videotutorial de la Guía de Planificación Hidrológica en el Ámbito Iberoamericano (junio).



- Todos ellos se pueden encontrar en la lista de Agua y Saneamiento del canal de Youtube de AECID.

Órganos de gestión

El Fondo cuenta con dos órganos de gestión principales propios: el Consejo Asesor y el Comité Ejecutivo. Estos órganos están regulados por el Real Decreto 1460/2009, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, aprobado el 29 de septiembre de 2009. El Real Decreto 1424/2012 introdujo modificaciones en la estructura del Consejo Asesor.

Consejo Asesor

Está compuesto por expertos de diversos ámbitos del sector del agua y saneamiento, tales como organizaciones no gubernamentales, empresas especializadas y universidades, además de la Secretaría Técnica de la CODIA. En estos momentos cuenta con 28 miembros. Juega un papel crucial en el asesoramiento del FCAS, mejorando el enfoque de trabajo, aumentando el impacto en la consecución de los ODS, y fortaleciendo alianzas con otros socios. Su función principal es asesorar al Comité Ejecutivo.

Grupo de Trabajo del Consejo Asesor

Está constituido en el seno del Consejo Asesor y está compuesto por 7 vocales que representan a cada grupo de actores del Consejo, y fue creado con objeto de permitir una gestión más ágil y especializada, facilitar la toma de decisiones en base a un conocimiento profundo y especializado, y mejorar la calidad de las recomendaciones y dictámenes emitidos. Su existencia asegura que las decisiones pueden aportarse con la participación de representantes de los actores relevantes, lo que contribuye a la transparencia y eficacia del Consejo Asesor.

A lo largo de 2025, el Grupo de Trabajo se reunió en 4 ocasiones y analizó las propuestas de programas propuestos a cargo del presupuesto del año. Durante su estudio, las personas integrantes del Grupo de Trabajo formularon numerosas observaciones y aportaciones que contribuyeron a enriquecer y mejorar la formulación de las actuaciones.

Las propuestas analizadas fueron las siguientes:

Honduras	• Fortalecimiento de la institucionalidad pública y de las entidades reguladoras y de asistencia técnica en materia de agua y saneamiento en Honduras. • Mejora de los servicios de agua y saneamiento en las áreas urbanas y periurbanas del municipio de Trujillo, departamento de Colón, Honduras. • Manejo integral del recurso hídrico y el saneamiento, con enfoque de sostenibilidad ambiental, gobernanza, derechos y género, en las microcuencas de Varsovia, La Pita y Horconcitos, en el entorno del lago de Yojoa, Honduras.
Colombia	• Construcción de una planta de tratamiento, optimización del sistema de acueducto y fortalecimiento de las capacidades de la empresa prestadora del casco urbano del municipio de El Tarra, Norte de Santander —fase I—. • Optimización del sistema de acueducto del municipio de López de Micay, Cauca. Esta propuesta no obtuvo un dictamen positivo. • Optimización del sistema de acueducto y construcción de veinte soluciones individuales de saneamiento en el casco urbano del municipio de Samaniego, Nariño. La propuesta obtuvo inicialmente un dictamen positivo, aunque fue retirada con posterioridad. • Programa FISYO para el Fortalecimiento Institucional, Social y Operacional de la gestión comunitaria de la prestación de los servicios públicos de acueducto en el territorio rural y en las áreas más desfavorecidas de Bogotá D.C.
Guatemala	Mejora de los servicios de saneamiento del entorno del lago Petén Petén Itzá, Fase II. La propuesta había sido analizada en 2024, pero quedó pendiente de aprobación debido a la falta de disponibilidad presupuestaria.
República Dominicana	Red Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua en República Dominicana. Programa aprobado 2024.
Paraguay	Alternativas de captación y almacenamiento de agua para mejorar la disponibilidad y la gestión integrada del recurso hídrico en el Chaco paraguayo.
El Salvador	Fortalecimiento del marco institucional del recurso hídrico en El Salvador incorporando los enfoques de cuenca, de género y de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

Además, se presentó la propuesta de contribución al FECASALC.

Comité Ejecutivo

Es el órgano de decisión del Fondo responsable de aprobar las cuentas anuales y decidir sobre los nuevos programas. Está compuesto por autoridades de varios ministerios, incluyendo la persona titular de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, quien preside el comité.

En 2025, el Comité Ejecutivo se reunió en 5 ocasiones. En estas reuniones se sometieron a su consideración las propuestas previamente aprobadas al Grupo de Trabajo del Consejo Asesor.

Durante 2025 se elevaron para su aprobación por Consejo de Ministros del Gobierno de España las siguientes propuestas:

República Dominicana	Red Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua en República Dominicana.
Colombia	Construcción de planta de tratamiento, optimización del sistema de acueducto y fortalecimiento de capacidades de la empresa prestadora del casco urbano del municipio de El Tarra, Norte de Santander-Colombia. Fase I.
Paraguay	Alternativas de captación y almacenamiento de agua para mejorar la disponibilidad y gestión integrada del recurso hídrico en el Chaco paraguayo.
Honduras	Fortalecimiento de la institucionalidad pública y de las entidades reguladoras y de asistencia técnica en materia de agua y Saneamiento en Honduras.
Honduras	Manejo integral del recurso hídrico y el saneamiento, con enfoque de sostenibilidad ambiental, gobernanza, derechos y de género, en las microcuencas de Varsovia, la Pita y Horconcitos. Lago Yojoa, Honduras.
Honduras	Mejora del servicio de agua y saneamiento de Trujillo, Honduras.
Colombia	Programa FISYO para el Fortalecimiento Institucional, Social y Operacional de la gestión comunitaria de la prestación de los servicios públicos de acueducto en el territorio rural y áreas más desfavorecidas e Bogotá Distrito Capital.
Regional	Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe establecido en el BID.
Guatemala	Mejora de los servicios de saneamiento del entorno del lago Petén Petén Itzá, Fase II.

Miembros del Comité Ejecutivo

Presidencia	• La persona titular de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.
Vicepresidencias	• **Primera**: la persona titular de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). • **Segunda**: la persona titular de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Vocales	• **1.º**: la persona titular de la Dirección de Cooperación Sectorial, Europea y Multilateral. • **2.º**: la persona titular de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. • **3.º**: la persona titular de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. • **4.º**: la persona titular de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. • **5.º**: una persona, con rango mínimo de Subdirección General, en representación del Instituto de Crédito Oficial, designada por la persona titular de la Presidencia del Instituto de Crédito Oficial. • **6.º**: la persona titular de Subdirección de Transición Ecológica, Agua y Lucha contra el Hambre y Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de AECID, que además desempeñará las funciones de secretaría del órgano. • **7.º**: la persona titular de la Secretaría General Iberoamericana, que asistirá a las reuniones del Comité Ejecutivo, con voz, pero sin voto.

www.aecid.es

Memoria 2025

FCAS Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

aecid

cooperación
española
